



строительство объекта «Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля».

Срок реализации: 2017-2019 гг.

Заключение госэкспертизы:


- на результат инженерных изысканий №63-1-1-0343-15
- на проектную документацию № 63-1-1-2-0006-16;
- о достоверности определения сметной стоимости Nº 63-1-5251-16.

Заявка на получение субсидий: заявка в Минстрой от 21.04.2016 г.

Стадия реализации: 07.07.2017 г. заключен муниципальный контракт с ПСК "Волга" г. Сызрань. Ведется работа по демонтажу (готовность 40%) и сносу зеленых насаждений (готовность 90%).

стоимость реализации

354,6 млн.

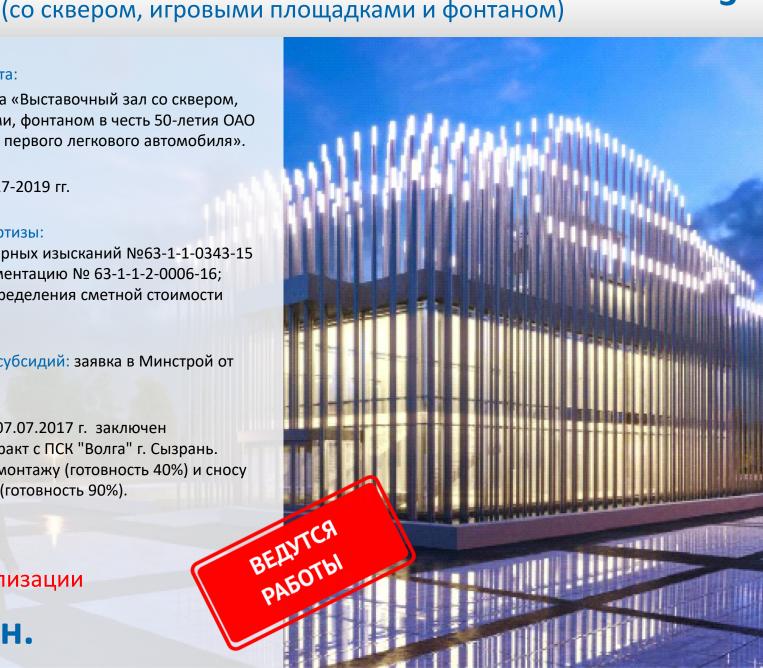


реконструкция набережной Автозаводского района г.о. Тольятти.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Заключение госэкспертизы: до декабря 2018 г.

Заявка на получение субсидий: заявка в Минстрой от 25.11.2015г. № 10083/5 в гос. программу Самарской области "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 гг." и федеральную программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.

Стадия реализации: выполнено тех. обследование объекта. Разработана архитектурная концепция. Тех. задание направлено в Минстрой. Проводится работа по оформлению земельного участка в муниципальную собственность.

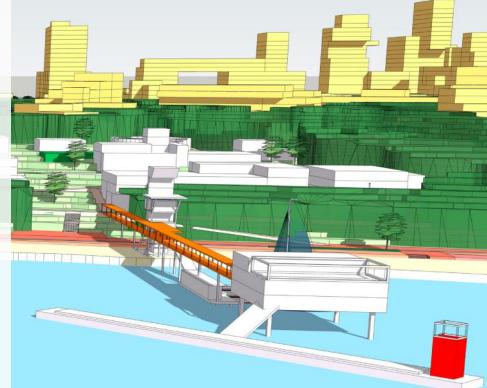

стоимость реализации

строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома №78 по ул. 70 лет Октября.

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Заключение госэкспертизы: до 01.10.2017 г.

Заявка на получение субсидий: до 15.10.2017 г.

Стадия реализации: 21.11.2016 г. заключен контракт на привязку повторно применяемой проектной документации с ООО «Экопланпроект» г. Саранск.

стоимость реализации

397,4 млн.



Заявка на получение субсидий: до 01.03.2018 г.



проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат».

Срок реализации: 2017-2018 гг.

Заключение госэкспертизы: до 01.10.2017 г.

Заявка на получение субсидий: до 15.10.2017 г.

Стадия реализации: 15.11.2016 г. заключен контракт с АО Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» на разработку проектной документации.

стоимость реализации



ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС с универсальным игровым залом

Наименование объекта:

проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина, для МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз».

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Заключение госэкспертизы: до 20.12.2017 г.

Заявка на получение субсидий: до 01.02.2018 г.

Стадия реализации: заключен муниципальный контракт с ООО «Куйбышевский промстройпроект» г. Самара на привязку повторно применяемой проектной документации для строительства объекта.

стоимость реализации



реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а).


Срок реализации: 2019-2020 гг.

Заключение госэкспертизы: до 25.12.2017 г.

Заявка на получение субсидий: до 20.01.2018 г.

Стадия реализации: 10.07.2017 г. заключен муниципальный контракт на разработку ПСД с ООО

«Теплый дом».



стоимость реализации

638,3 млн.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПО УЛ. ОФИЦЕРСКОЙ

Наименование объекта:

реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова.

Срок реализации: 2018 г.

Заключение госэкспертизы:


- проектная документация (Тэтап) от 11.03.2014 г. № 63-1-4-0110-14.

Заявка на получение субсидий: подана заявка на субсидирование из вышестоящего бюджета.

Стадия реализации: ведутся работы по корректировке ПСД (I этап). Повторное проведение конкурса — октябрь 2017 г.. Продолжается работа по разработке ПСД (II этап) за счет внебюджетных средств.

стоимость реализации

83,4 млн. (І этап)

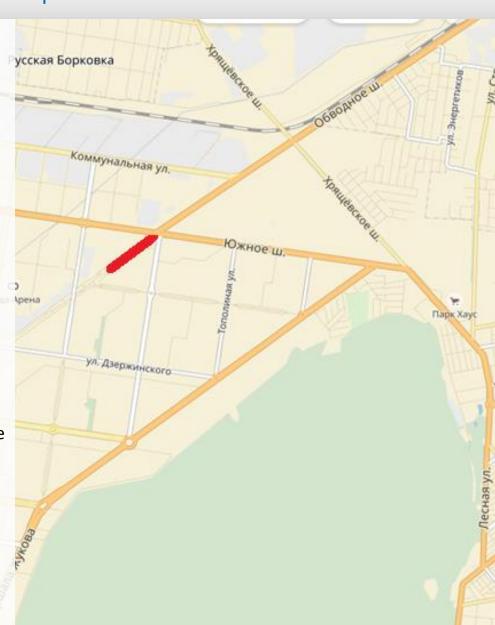

реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения.

Срок реализации: 2020 г.

Заключение госэкспертизы:


- проектная документация от 29.05.2013 г. № 63-1-5-0261-13.

Заявка на получение субсидий: подана заявка на субсидирование из вышестоящего бюджета.

Стадия реализации: сторонним инвестором ведутся работы по формированию проекта планировки территории и проекта межевания территории до 08.09.2017 г.

стоимость реализации

40,5 млн.

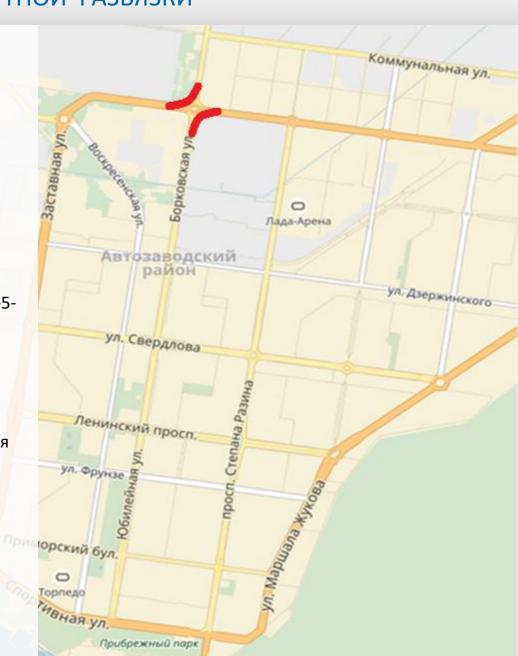

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ

Наименование объекта:

строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной в г.о. Тольятти.

Срок реализации: 2019 г.


Заключение госэкспертизы: имеется, 2013 г. - проектная документация 09.10.2014 г., 20.11.2015г.

Заявка на получение субсидий: подана заявка на субсидирование из вышестоящего бюджета.

Стадия реализации: проводится работа по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории.

стоимость реализации

41,2 млн.

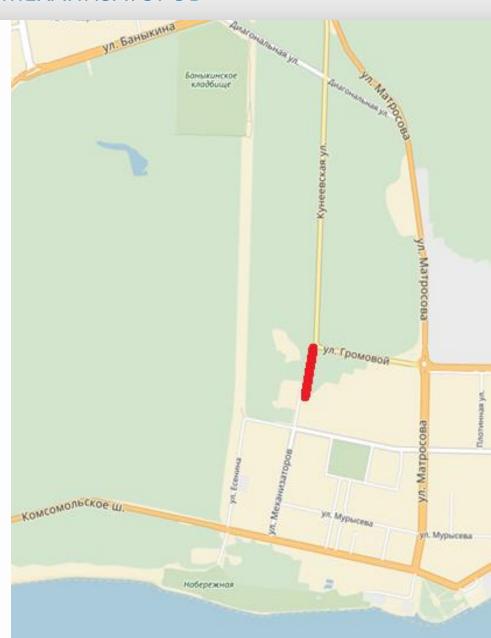

строительство улично-дорожной сети за Московским проспектом в г.о. Тольятти.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Заключение госэкспертизы:

- проектная документация № 63-1-1-3-0146-16 от 22.07.2016 г., № 63-1-5730-16 от 20.12.2016 г.

Заявка на получение субсидий: подана заявка на субсидирование из вышестоящего бюджета.

Стадия реализации: ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок для строительства.

Автозаводский раион ул. Свердлова Приморское Ленинский просп. Приморский бул. Прибрежный парк

стоимость реализации

проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. Тольятти.

Срок реализации: сентябрь 2016 г. - июль 2018 г.

Заключение госэкспертизы: №63-1-4-0405-15 от 21.12.2015 г.

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: 21.09.2016 г. заключен контракт с ООО ПСК «ВОЛГА». На 01.09.2017 г. готовность объекта составляет 30%.

стоимость реализации

672,2 млн.



проектирование и строительство поликлиники на 1000 посещений в смену в 19 квартале г.о. Тольятти.

Срок реализации: сентябрь 2016 г. - июль 2018 г.

Заключение госэкспертизы: №63-1-4-0406-15 от 21.12.2015 г.

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: 21.09.2016 г. заключен контракт с ООО «Белстрой». На 01.09.2017 г. готовность объекта составляет 30%.



стоимость реализации

869,7 млн.

центр спортивной гимнастики «Немов-центр».

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Заключение госэкспертизы:


Заявка на получение субсидий: заказчик и отв.исполнитель Минстрой СО и ГКУ СО «УКС».

Стадия реализации: идет формирование земельного участка для последующего проектирования.



1 491,5 млн.*

*Стоимость реализации данного объекта будет известна после разработки ПСД.

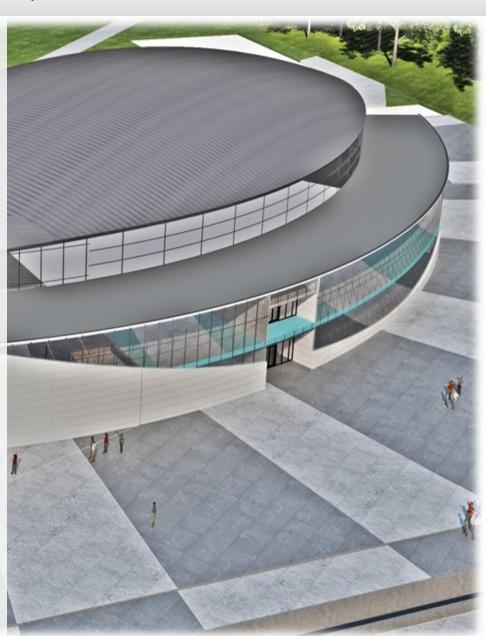

реконструкция стадиона «Труд».

Срок реализации: 2017 г.


Заключение госэкспертизы:

- сметная документация № 63-1-4061-14 от 28.11.2014 г.

Заявка на получение субсидий: 2015 и 2016 гг.

Стадия реализации: 12.08.2017 г. состоялось

торжественное открытие объекта.



77,2 млн.



проектирование и строительство физкультурноспортивного комплекса в г.о. Тольятти (площадка «Певческое поле»).

Срок реализации: март 2018 г.

Заключение госэкспертизы:

- сметная документация №63-1-5373-16 от 29.04.2016 г.
- по проектно-сметной документации получены положительные заключения экспертиз от 11.01.2016 г. и от 12.12.2016 г.

Заявка на получение субсидий: не требуется (за счёт средств ООО «Газпром инвестгазификация»).

Стадия реализации: проводятся работы по переподключению абонентов и выносу инженерных коммуникаций (до 23.09.2017 г.).

стоимость реализации

659,8 млн.



проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти.

Срок реализации: 2016-2018 гг.

Заключение госэкспертизы:

- сметная документация первая половина августа 2017г. ,
- проектная документация № 63-1-1-3-0178-16 от 26.09.2016 г.

Заявка на получение субсидий: заказчик и отв. Исполнитель Минстрой СО и ГКУ СО «УКС».

Стадия реализации: 06.06.2017 г. ГКУ Самарской области "УКС" повторно направило сметную документацию для прохождения государственной экспертизы.

стоимость реализации

325,9 млн.



реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодное на участке км 18+330-км 26+130 в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

Срок реализации: 2018-2019 гг.

Заключение госэкспертизы:

- сметная документация № 63-1-3247-13 от 27.12.2013 г.;
- проектная документация № 63-1-4-3-0687-12 от 24.12.2012 г., № 63-1-2-0676-13 от 27.12.2013 г.

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: ожидание подтверждения выделения средств из вышестоящих бюджетов.

стоимость реализации

2 398,8 млн.



реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета (г.о. Тольятти, ул. Белорусская, д.14В).

Срок реализации: 2020 г.

Заключение госэкспертизы:

- проектная документация №63-1-4-0238-13 от 12.08.2013 г.,
- результаты инженерных изысканий № 63-1-1-0261-12 от 25.05.2012 г. ,
- сметная документация ноябрь 2017 года.

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: проводится актуализация проектно-сметной документации.

стоимость реализации

158,6 млн.



реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ПАО «АВТОВАЗ».

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Заключение госэкспертизы:

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: ПАО «АВТОВАЗ» предложено самостоятельно разработать ПСД.

стоимость реализации

282,3 млн.



строительство мостового перехода через реку Волгу с обходом г.о. Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» (1 этап).

Срок реализации: 2019-2022 гг.

Заключение госэкспертизы: октябрь 2017 г.


Заявка на получение субсидий:

Предполагаемое место судобого хода

Стадия реализации: проектная документация находится на проверке в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

стоимость реализации

35 000 млн.

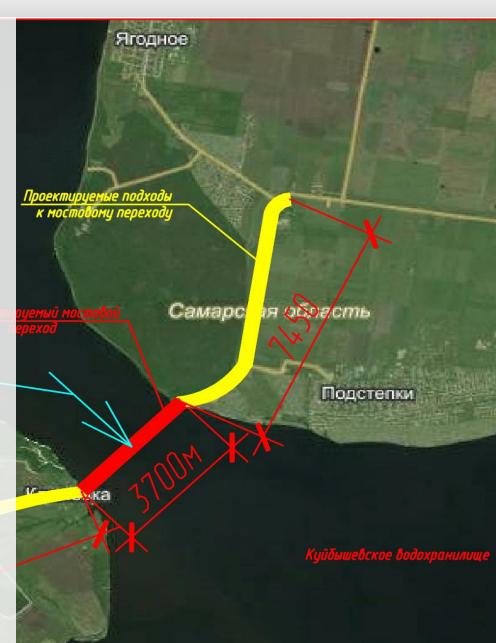

ПРИОБРЕТЕНИЕ НИЗКОПОЛЬНЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Наименование объекта:

Приобретение низкопольных троллейбусов, произведенных на территории государств участников Единого экономического пространства

Срок реализации: до 01.11.2017 г..

Заключение госэкспертизы: не требуется.

Заявка на получение субсидий: 14.11.2016 г.

Стадия реализации: 25.07.2017 г. заключен муниципальный контракт с ПАО «ТРАНСФИН-М». Срок поставки низкопольных троллейбусов в

количестве 40 единиц до 01.11.2017 г. .

стоимость реализации

377,4 млн.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЦ "РУСИЧ"

Наименование объекта:

Реконструкция ДЦ «Русич»

Срок реализации:

Заключение госэкспертизы:.

- проектная документация № 63-1-5665-16 от 24.10.2016 г.

Заявка на получение субсидий: направлена заявка в Минстрой № 1979/1 от 15.03.2017 г.

Стадия реализации: проходит процедура размещения аукционной документации.

стоимость реализации

42,9 млн



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА № 210 «ЛАДУШКИ»

Наименование объекта:

Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Авто-заводского района, расположенного

южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43

Срок реализации: до 01.12.2018 г.

Заключение госэкспертизы:

- проектная документация №63-1-4-0042-14 от 27.01.2014 г.,
- сметная документация №63-1-3425-14 от 28.02.2014 г.

Заявка на получение субсидий:

Стадия реализации: заключен контракт с ООО «Спецремстрой». На 01.09.2017 г. готовность объекта составляет 47 %.

стоимость реализации

