

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:



Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти



Развитие автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами



Повышение безопасности дорожного движения




Развитие городского пассажирского транспорта



Содержание улично-дорожной сети

Подпрограмма «Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти

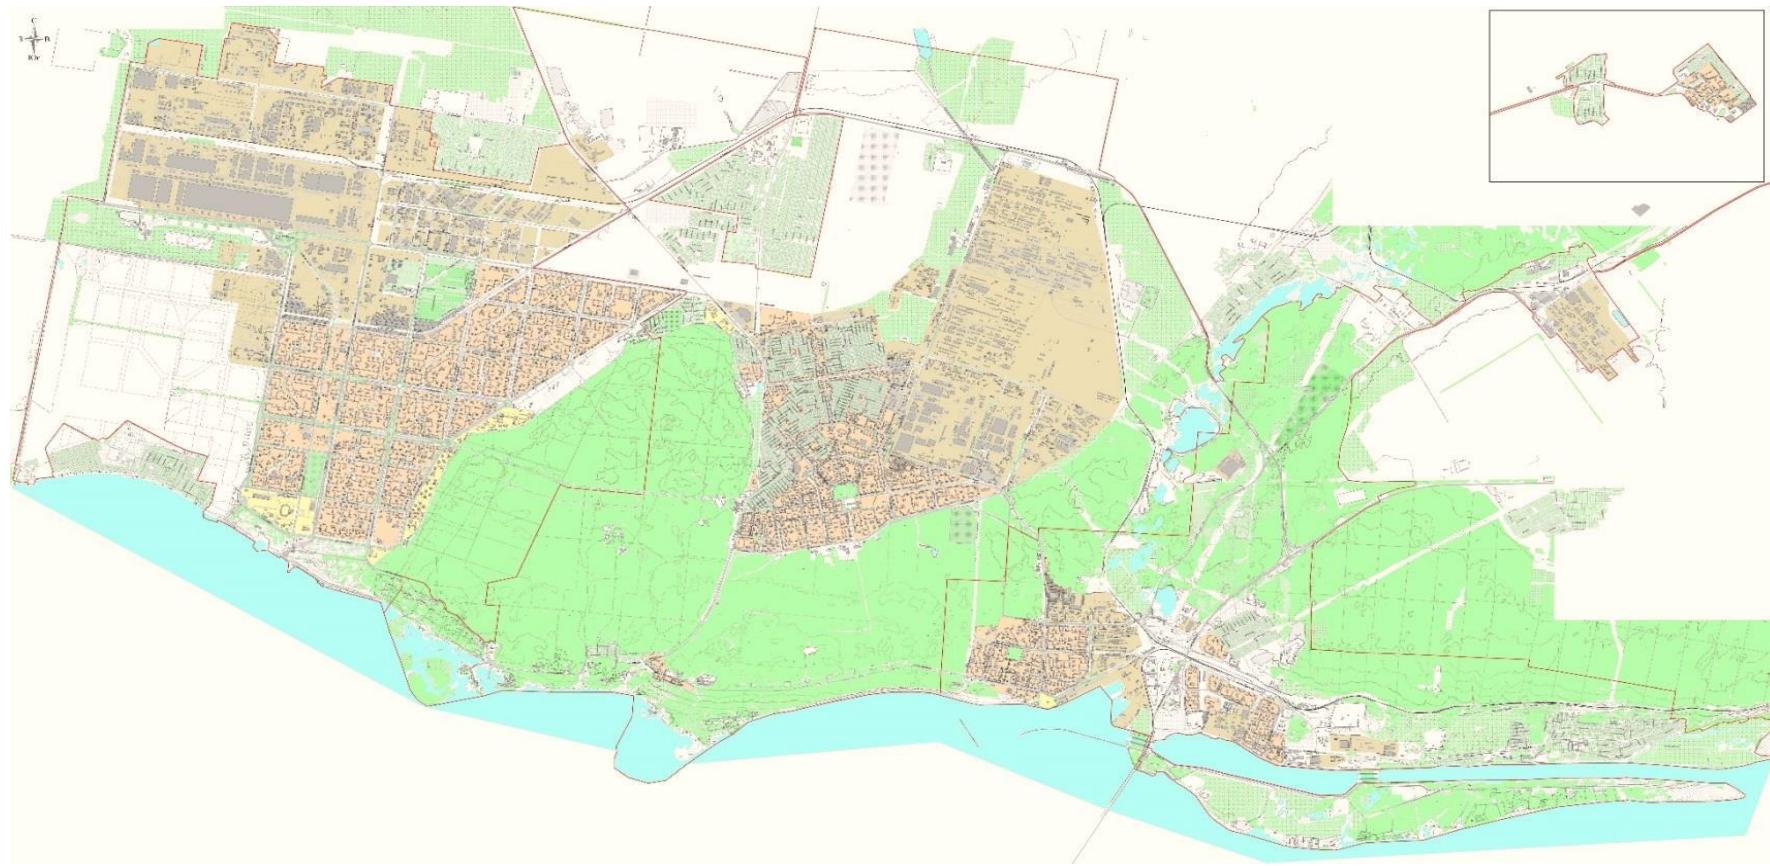

Сведения об улично-дорожной сети:

- протяженность, км - **740,4**;
- площадь, м² – **6 156 000**;
- кол-во улиц, шт. - **514**;
- дорог на гарантии, шт. – **130**;
- в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии на текущий момент, % - **44**;
- по результатам ремонта дорог планируемое состояние к концу 2017 г., % - **51**.

План мероприятий, связанных с празднованием 50 летия производства первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти


Мероприятие	Срок исполнения	Источники финансирования, тыс. руб.			
		средства федерального бюджета	средства бюджета Самарской области	средства бюджета г.о. Тольятти	всего
Администрация городского округа Тольятти					
Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова	2018	83 747,25	3 526,20	881,55	88 155,0
Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной	2019	41 927,30	1 765,36	441,34	44 134,0
Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в г.о. Тольятти	2019	313 050,65	13 181,08	3 295,27	329 527,0
	2020	432 428,60	18 207,52	4 551,88	455 188,0
*Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения	2020	48 782,50	2 054,00	513,50	51 350,0
Итого по ДДХИТ:					968 354,0
Ответственными исполнителями являются: Министерство транспорта РФ и Министерство транспорта и автомобильных дорог СО.					
*Примечание: объект «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставная до ул. Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО "АВТОВАЗ"» исключен из Плана мероприятий, т.к. на участке автомобильной дороги по Южному шоссе от ул. Цеховая до ул. Заставная проведен ремонт дорожного покрытия в 2016 году. Изменены сроки выполнения работ по остальным мероприятиям и стоимость выполнения работ.					

Строительство и реконструкция дорог


Дорожная карта строительства и реконструкции дорог

№ п/п	Объект	Проект	Положительное заключение экспертизы	Проект планировки территории	Проект межевания территории	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Разрешение на строительство
1	Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной						
2	Строительство улично- дорожной сети западнее Московского проспекта						
3	Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской						
4	Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова						


Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов

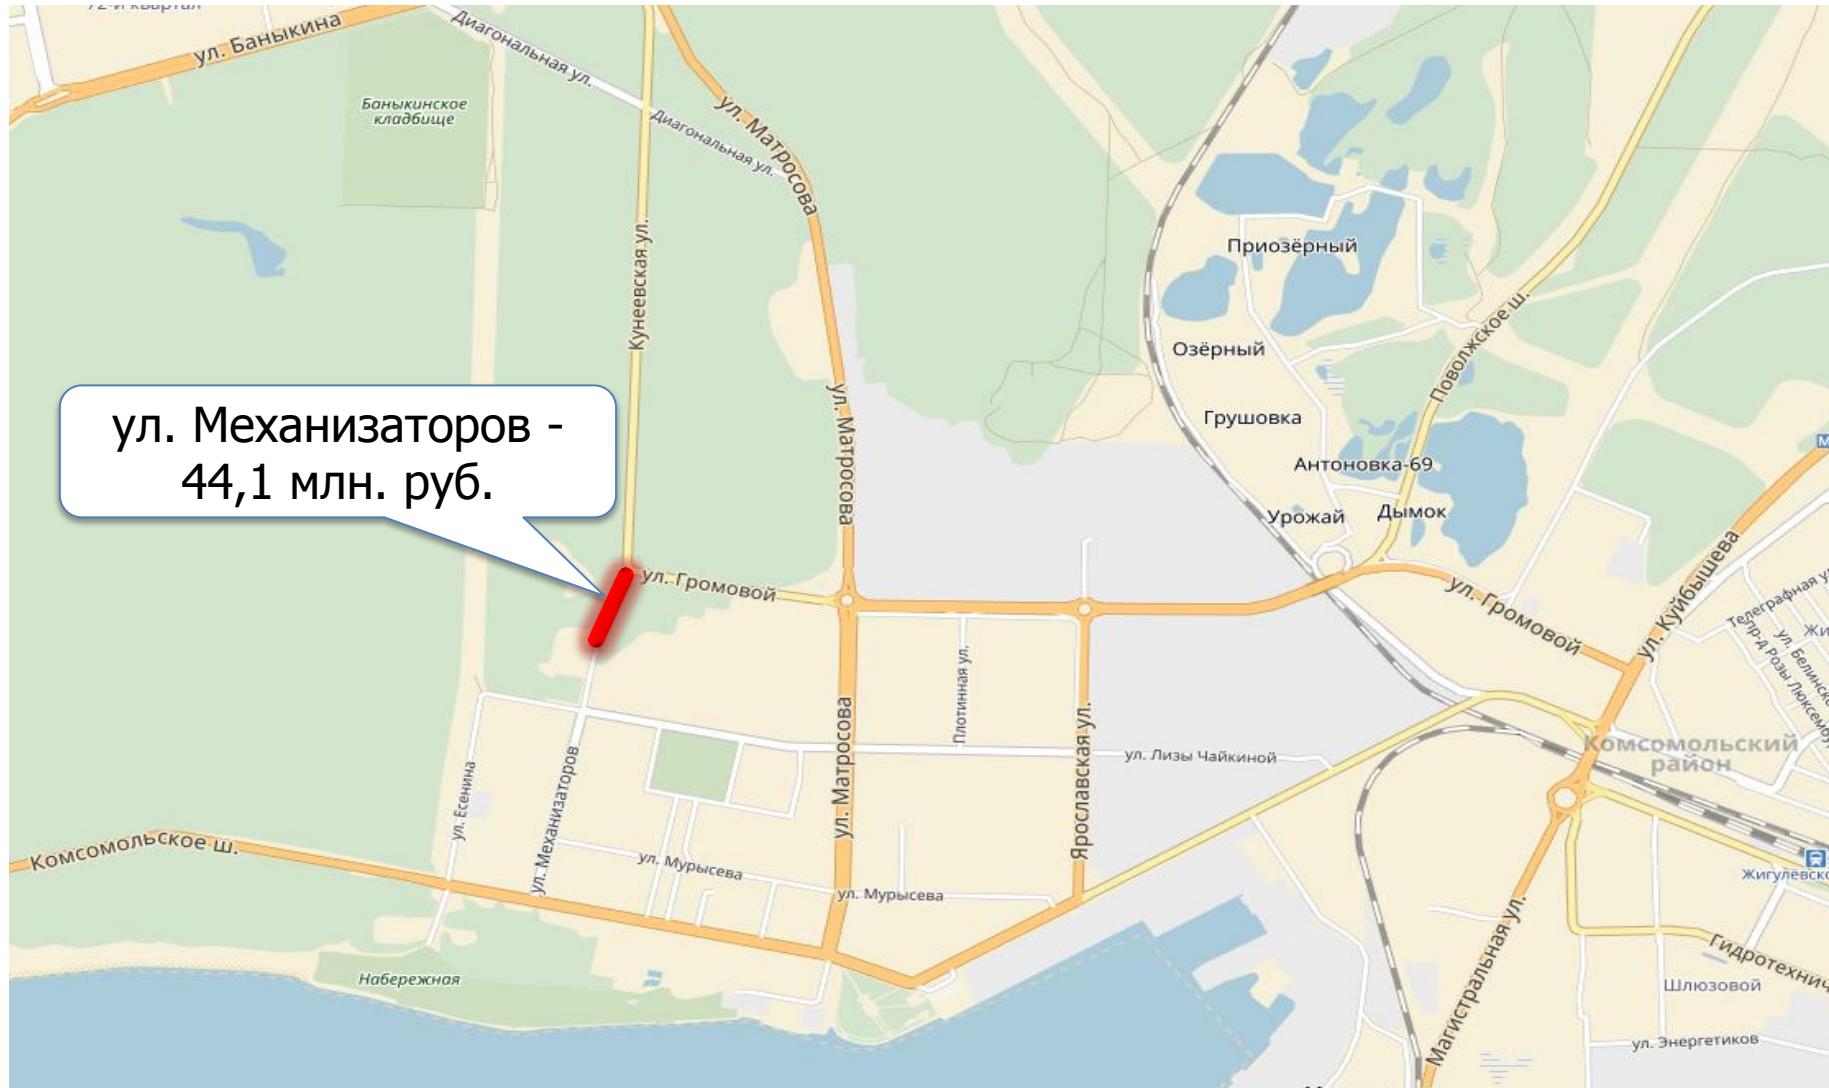

Строительство автомобильных дорог западнее Московского проспекта

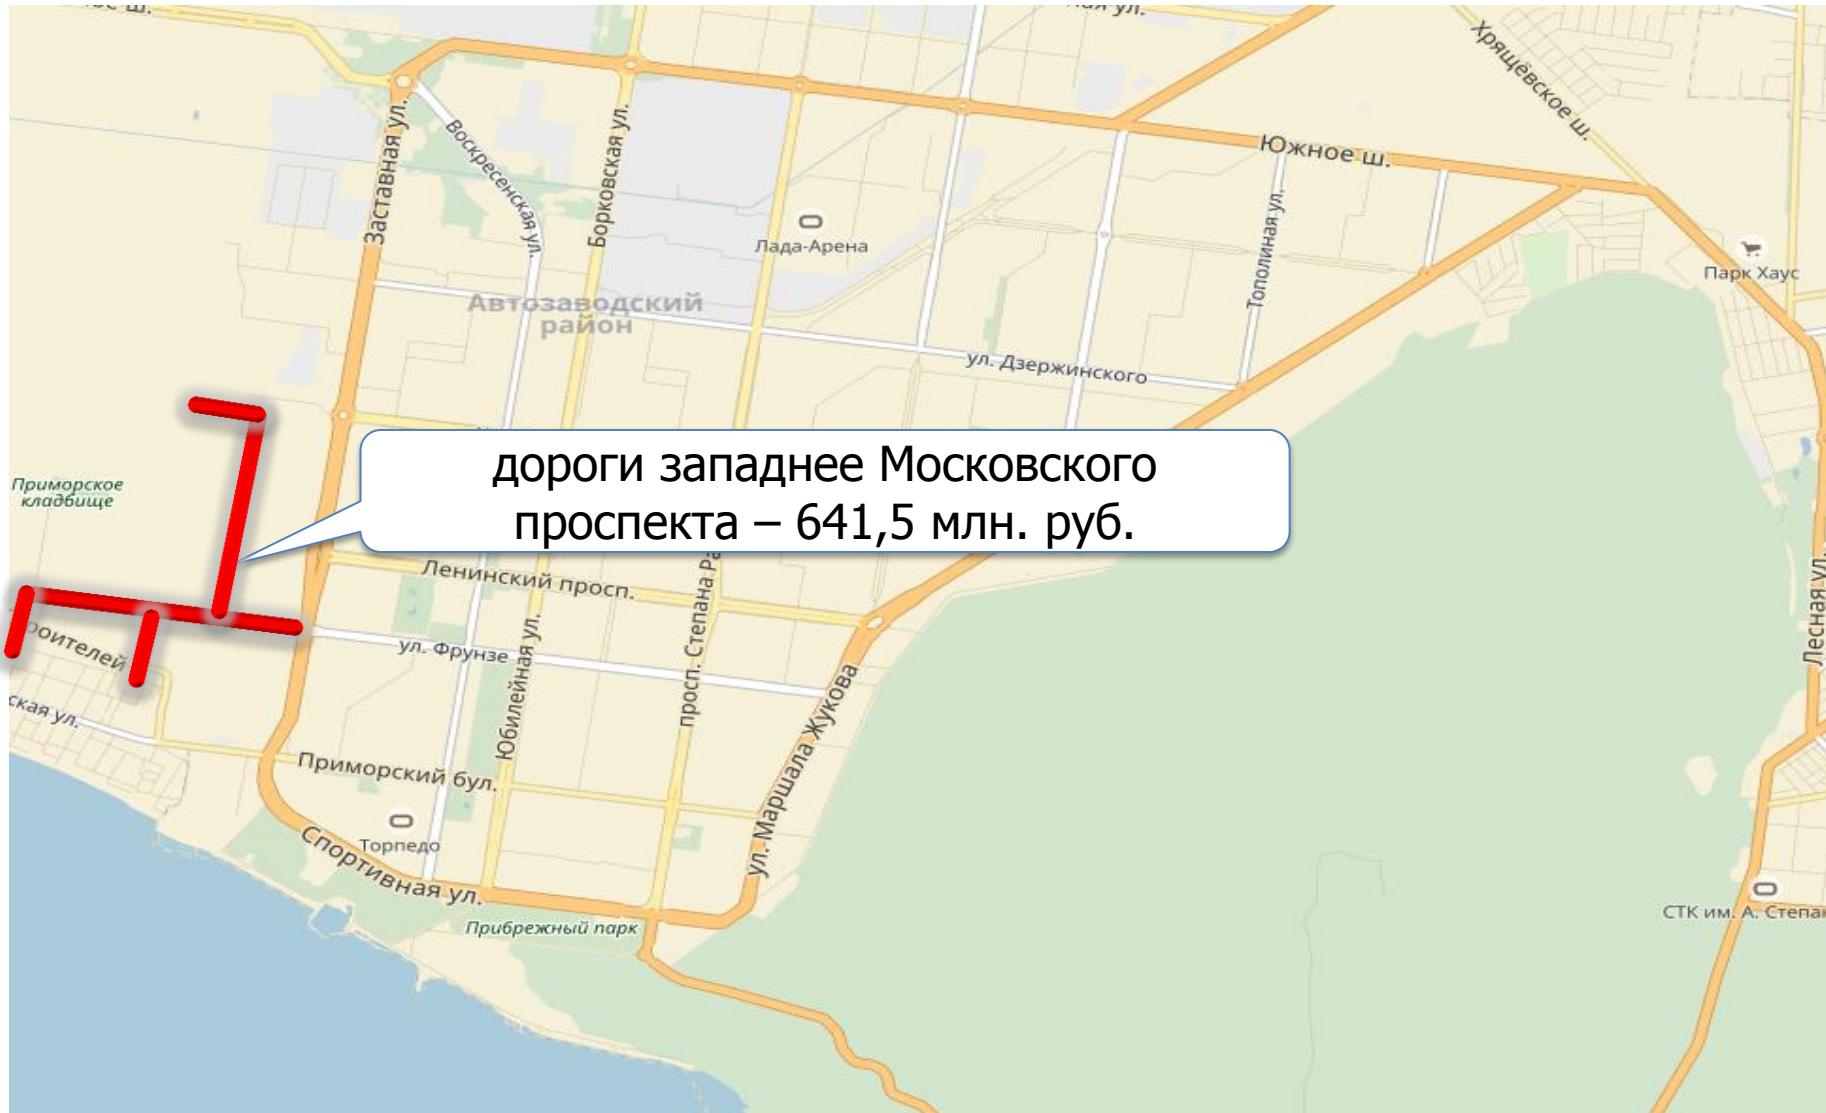

Строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская

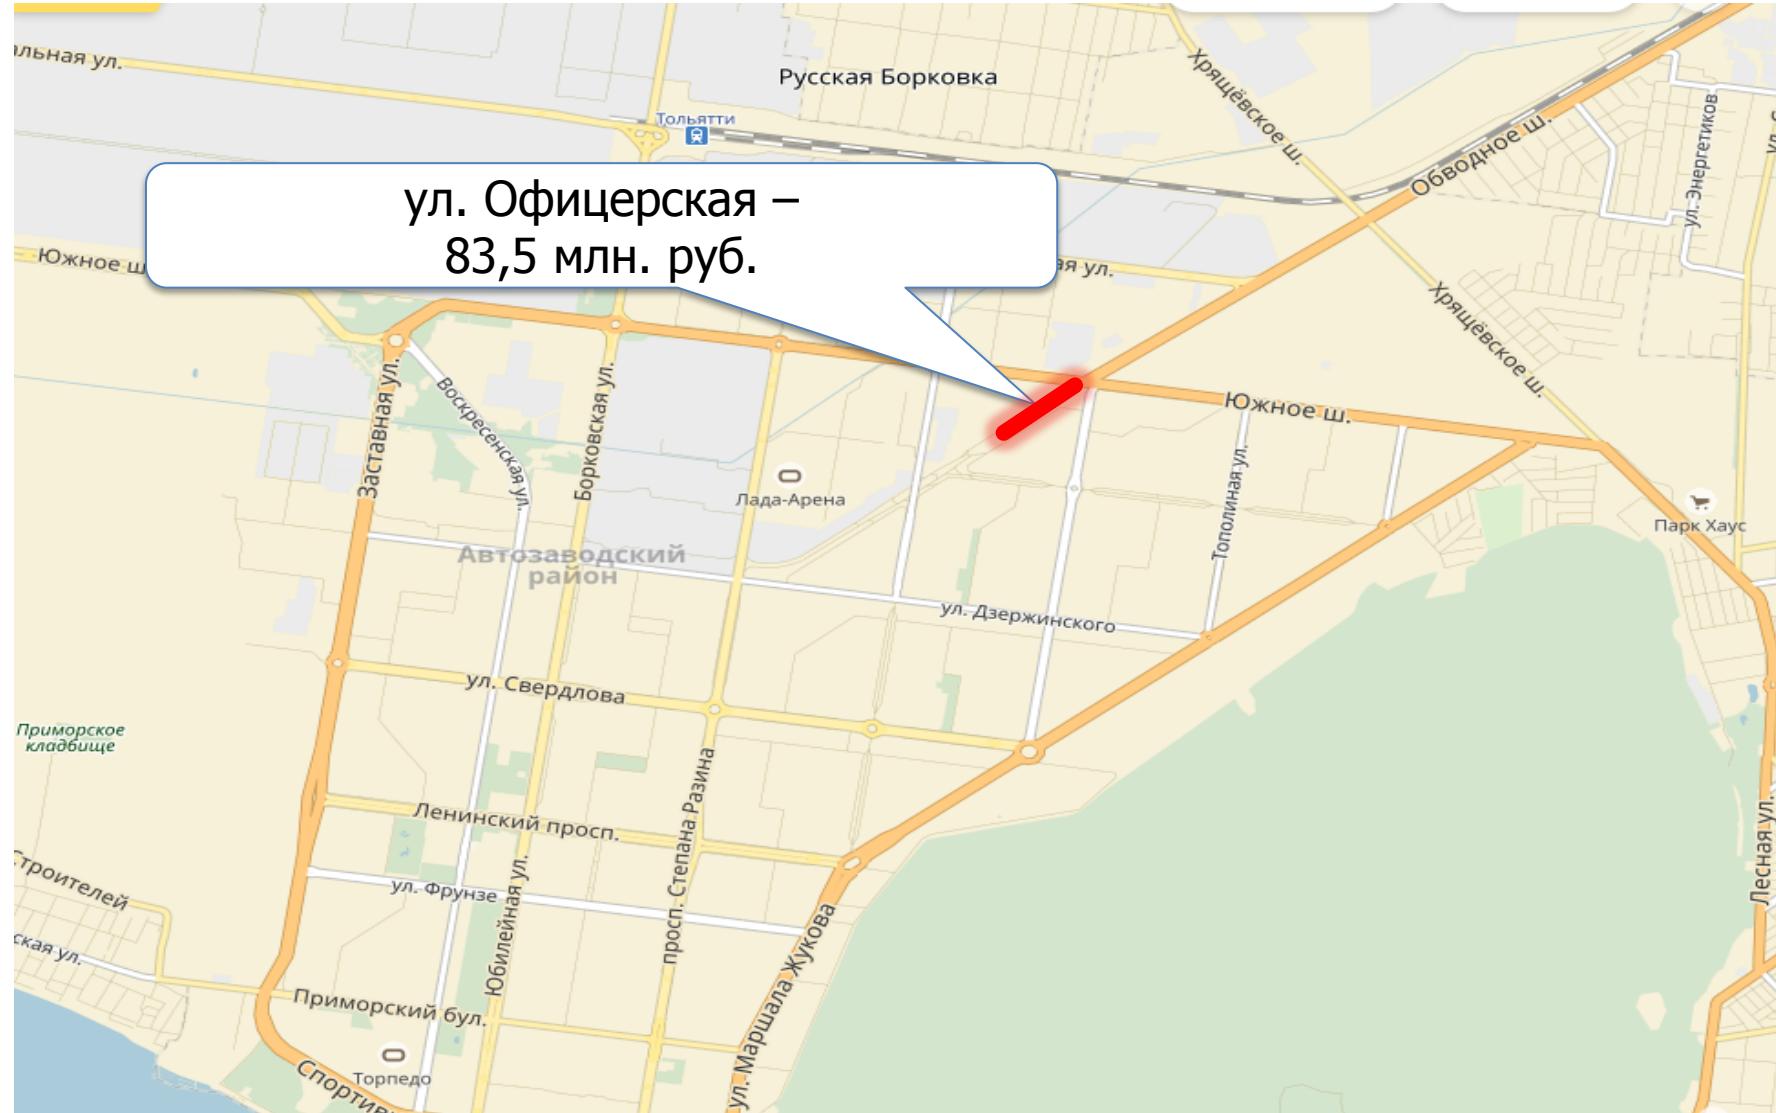

Устройство дополнительных правоповоротных полос движения


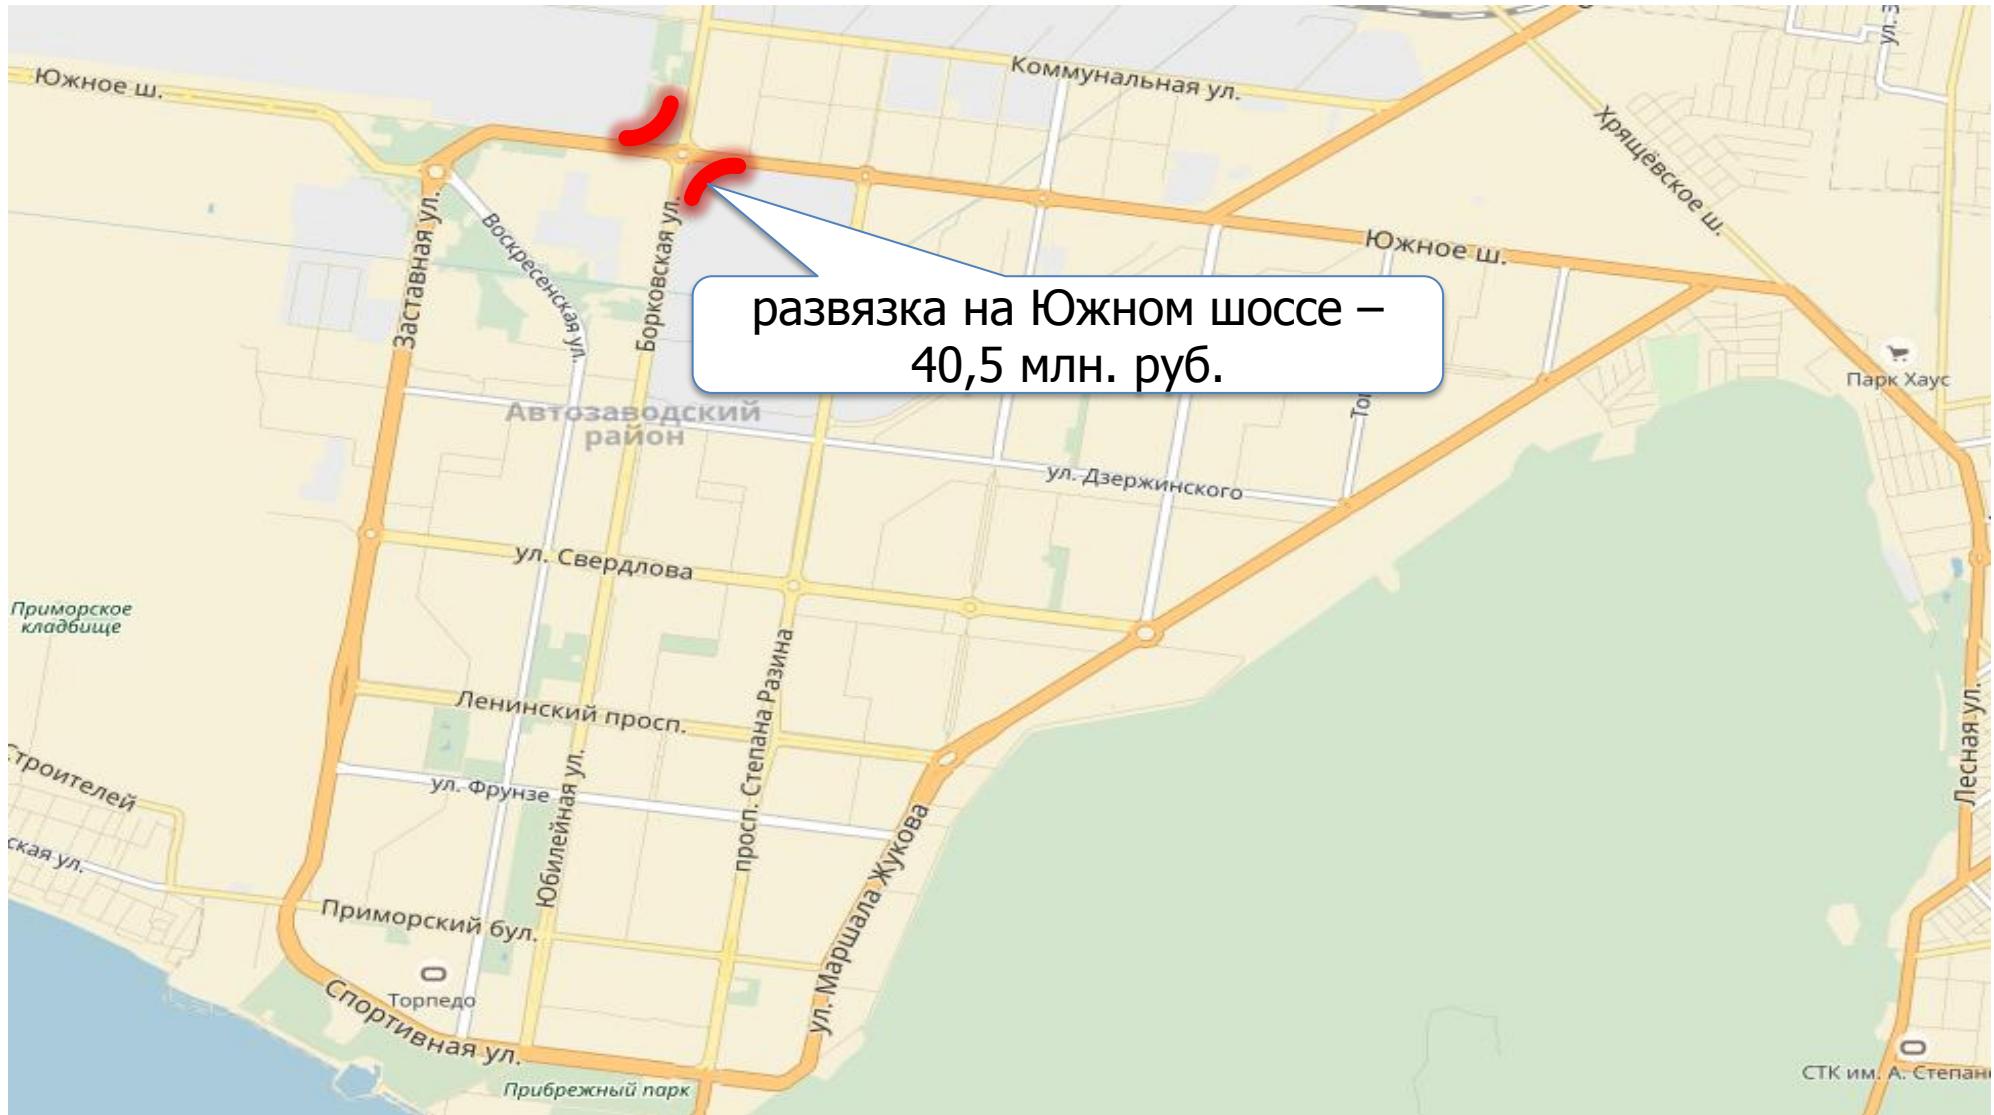


Схема ремонта автодорог в Автозаводском районе

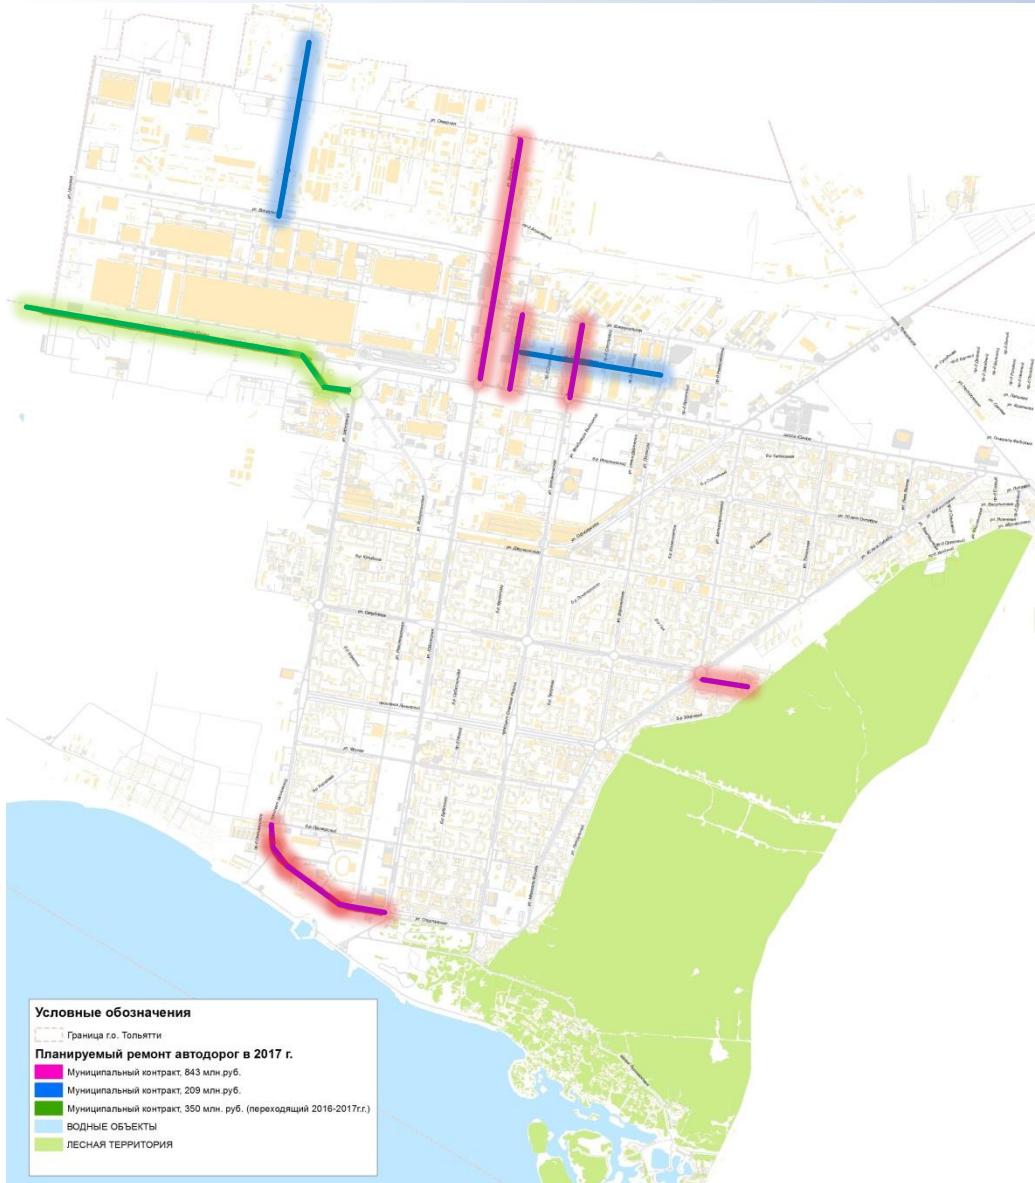

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ, тыс. руб.	Протяженность, км	Площадь, тыс.м ²
МК 0842200002115000092_259977 от 04 июля 2016 г.				
1	Южное шоссе	137 897,51	4	126,12
	Итого:	137 897,51	4	126,12
МК 0842200002117000001_259977 от 04 апреля 2017 г.				
2	Фабричный проезд	26 012,83	0,9	16,79
3	ул. Борковская	110 253,63	2,74	66
4	ул. Ботаническая	27 887,09	0,82	13,43
5	Автодорога от ул. 40 лет Победы	8 414,30	0,55	3,91
6	ул. Спортивная	91 089,45	1,95	53,09
	Итого:	263 657,30	6,96	153,22
МК 0842200002117000095_259977 от 10 июля 2017 г.				
7	ул. Окраинная	15 042,19	1,8	14,88
8	ул. Транспортная	16 082,45	1,45	15,7
	Итого:	31 124,64	3,25	30,58
	Всего:	432 679,45	14,21	61,16

Ремонт автомобильной дороги по Южному шоссе (от ул. Заставная до Южного шоссе)


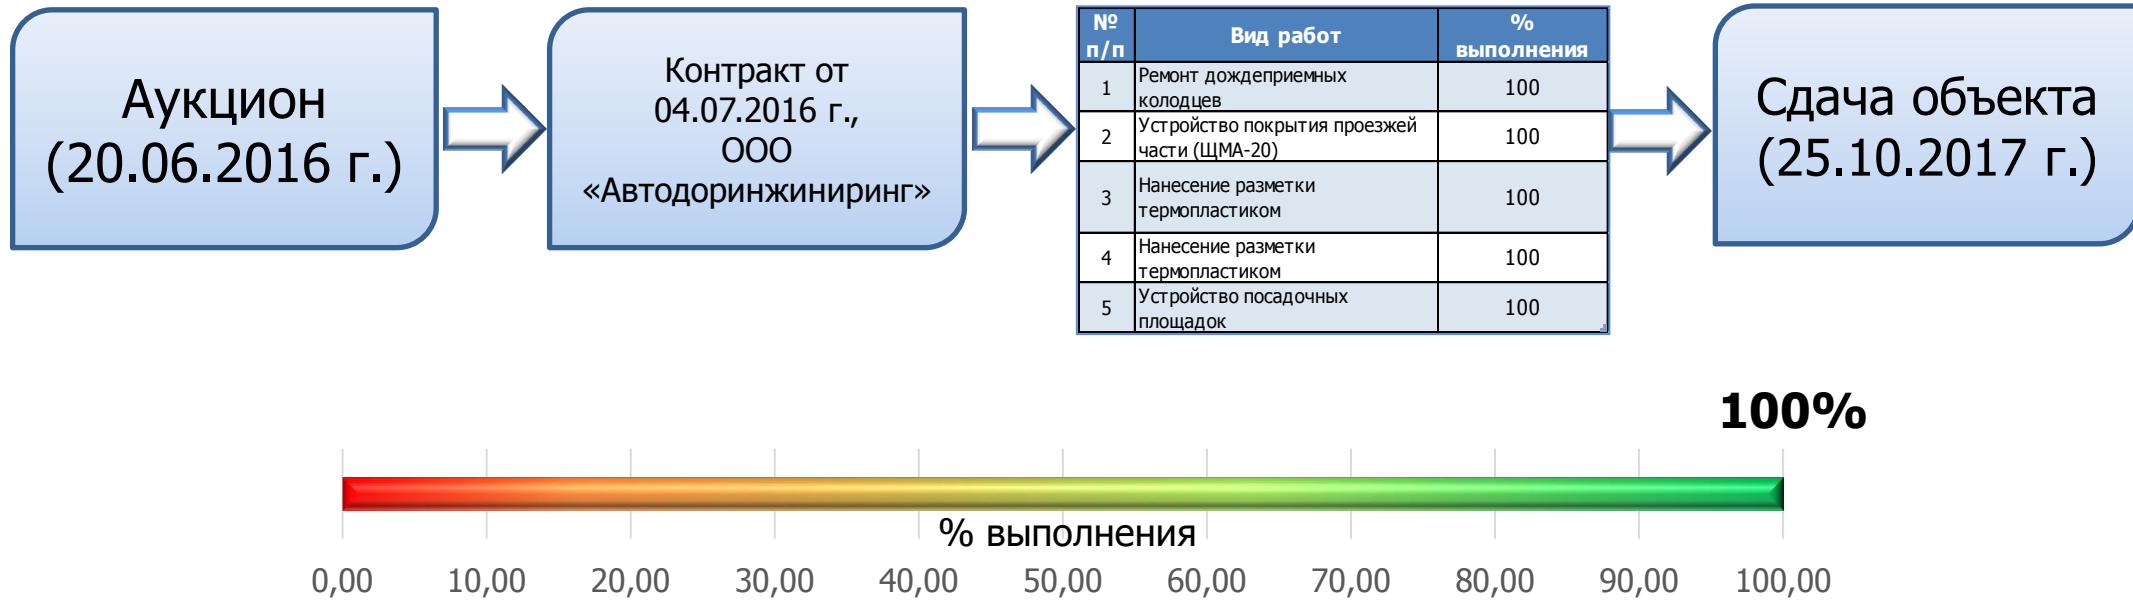


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

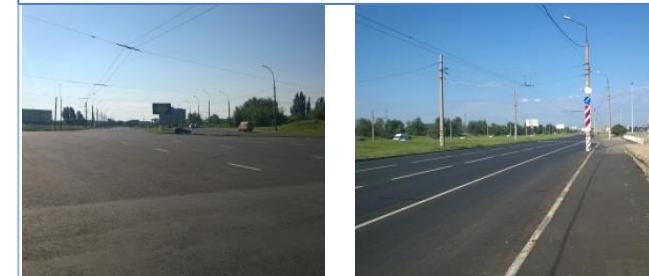



Ремонт автомобильной дороги по Фабричному проезду (от ул. Коммунальная до Южного шоссе)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100
7	Нанесение разметки	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

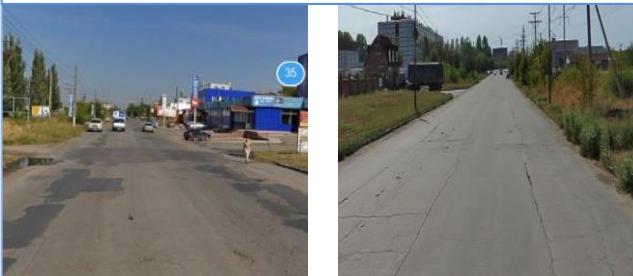

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);


- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;

- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

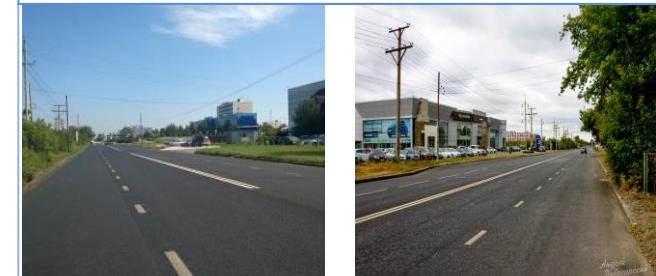



Ремонт автомобильной дороги по ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100
7	Нанесение разметки	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

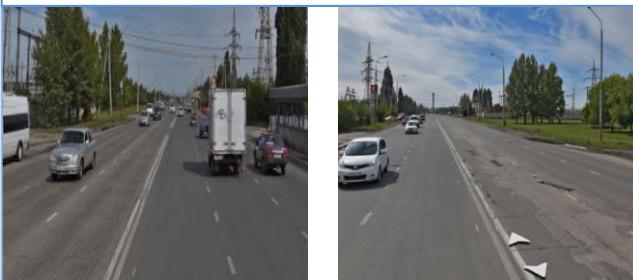

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);

- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;

- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Ботаническая (от Южного шоссе до ул. Коммунальная)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»


№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.



Фото объекта
«До»

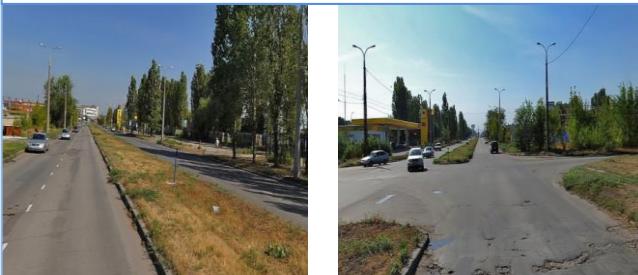

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);


- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;

- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

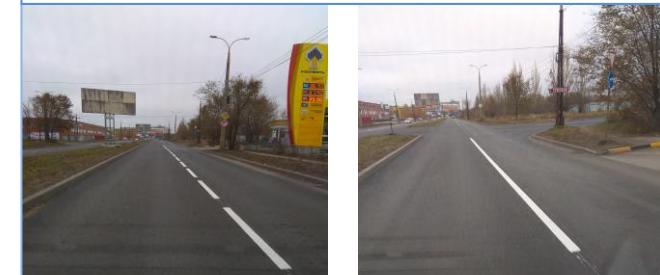



Ремонт автомобильной дороги от ул. 40 лет Победы до б-ра Здоровья

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	69

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);


- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;

- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

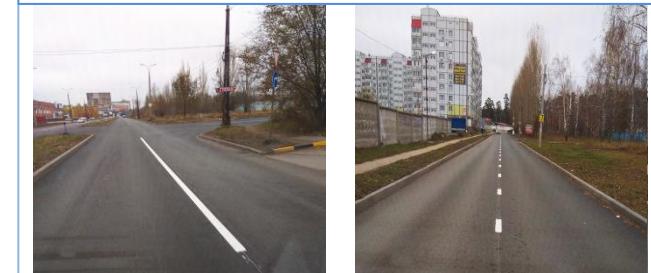



Ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	95
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);

- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;

- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Окрайнная (от ул. Вокзальная до здания по ул. Окрайнная, д.14)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Транспортная (от Фабричного проезда до ул. Полякова)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Замена люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластик "Universum"	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

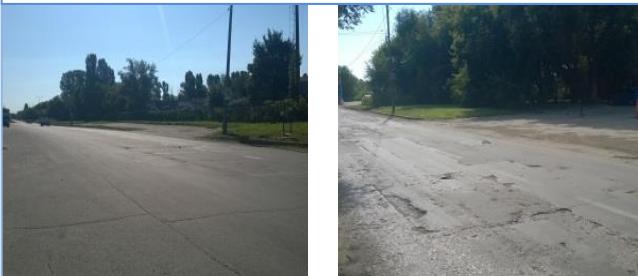

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);

- от районной администрации:

Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;


- от общественного совета:

Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Схема ремонта автодорог в Центральном районе

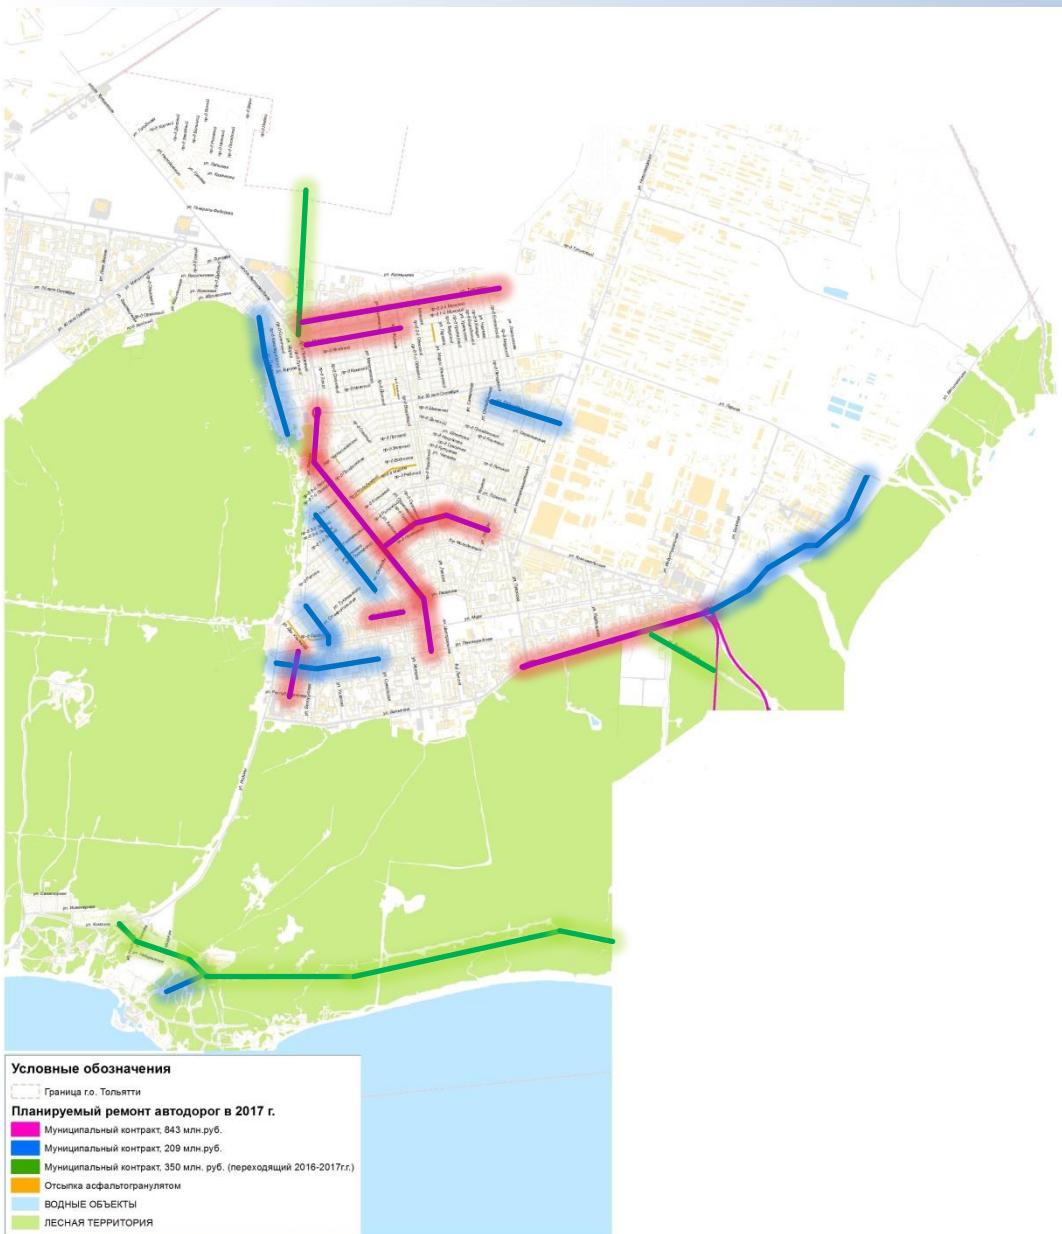

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог и отсыпке асфальтогранулятом

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ, тыс. руб.	Протяженность, км	Площадь, тыс.м ²
МК 0842200002115000092_259977 от 04 июля 2016 г.				
1	ул. Диагональная	14 465,26	0,85	7,45
2	ул. Александра Кудашева	33 494,44	1,53	16,76
3	Комсомольское шоссе	79 103,94	6,06	45,43
	Итого:	127 063,64	8,43	69,64
МК 0842200002117000001_259977 от 04 апреля 2017 г.				
4	ул. Лесная (кольцевая транспортная развязка по б-ру 50 лет Октября)	20 559,94	0,5	10,75
5	ул. Баныкина	93 996,51	2,094	55,94
6	ул. К. Маркса	118 044,51	2,515	39,83
7	ул. Мичурина	25 733,80	1,04	14,31
8	ул. Л. Толстого	75 458,67	2,239	39,16
9	ул. Комсомольская	35 136,70	1,28	17,85
10	ул. Гидростроевская	11 190,80	0,5	5,44
11	ул. Строителей	7 186,37	0,3	3,68
	Итого:	387 307,30	10,47	288,88
МК 0842200002117000095_259977 от 10 июля 2017 г.				
12	ул. Васильевская	20 301,61	2,4	17,8
13	Автодорога от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба"	3 201,80	0,4	2,8
14	ул. Радищева	5 447,92	0,68	4,77
15	ул. Ленинградская	11 190,49	1,15	9,85
16	ул. Садовая	7 905,24	1,1	6,87
17	ул. Тимирязева	7 301,21	1,2	7
18	ул. Ушакова	3 257,20	0,49	2,84
	Итого:	58 605,47	7,42	51,93
	Всего:	572 976,41	26,32	410,45
Отсыпка асфальтогранулятом				
1	Автодорога по проезду Молодежный	622,6	0,756	3,024
2	ул. Калинина (от ул. Шлютова до пр. Чернышевского)	57,17	0,07	0,28
3	Автодорога по проезду Свободы	177,22	0,215	0,86
4	Автодорога по ул. Д. Ульянова	296,46	0,36	1,44
5	Автодорога ул. М. Ульяновой (от ул. Мичурина до 7-го Онежского пер.)	151,91	0,188	0,752
6	Автодорога по проезду Ключевой	102,58	0,13	0,5
	Итого:	1 407,94	1,719	6,856

Ремонт автомобильной дороги по ул. Диагональная (от ул. Баныкина до ул. Кунеевская)




Фото объекта
«До»




Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХит:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Кудашева



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Ремонт посадочных площадок	100
2	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
3	Устройство обочин из АГР	100
4	Нанесение разметки термопластиком	100



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт автомобильной дороги по Комсомольскому шоссе

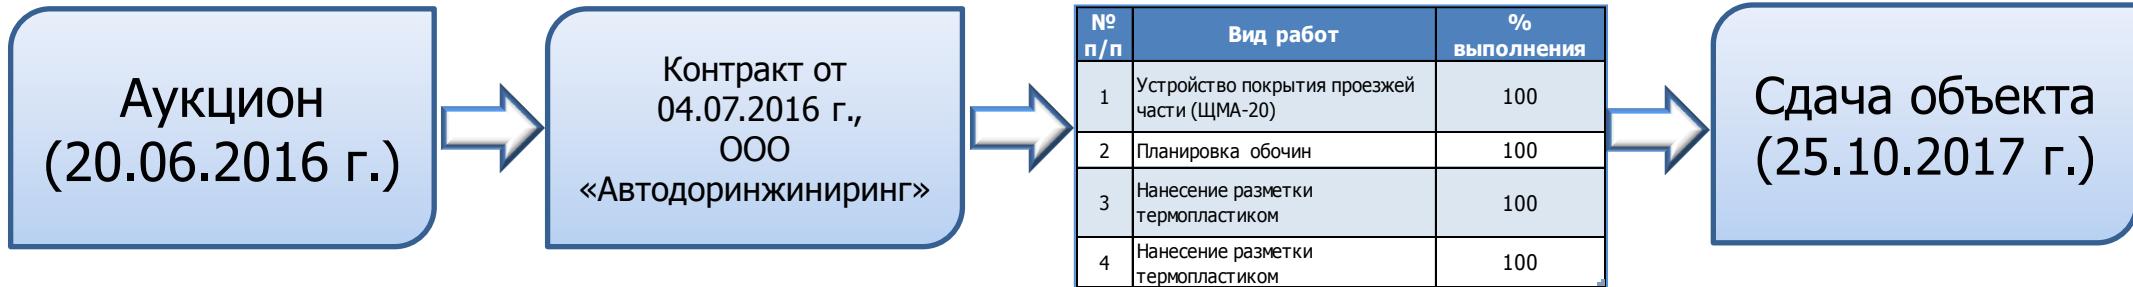


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная (от ул. К. Маркса до б-ра 50 лет Октября, включая КТР по б-ру 50 лет Октября - ул. Лесная)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:**
Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

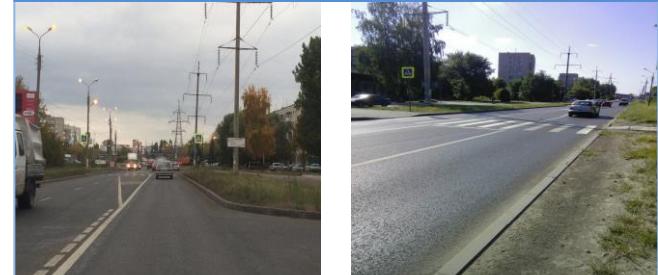



Ремонт автомобильной дороги по ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольской)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

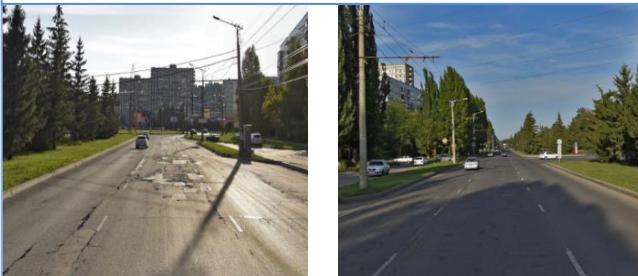

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса (от ул. Лесной до ул. Ленинградской)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100
7	Нанесение разметки	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

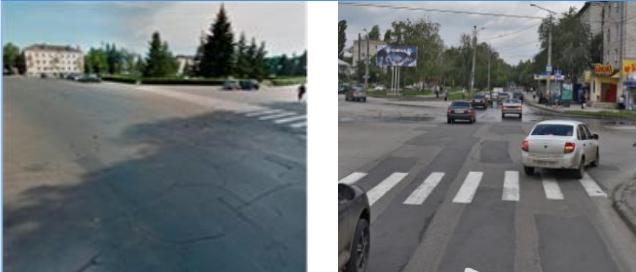

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100
7	Нанесение разметки	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

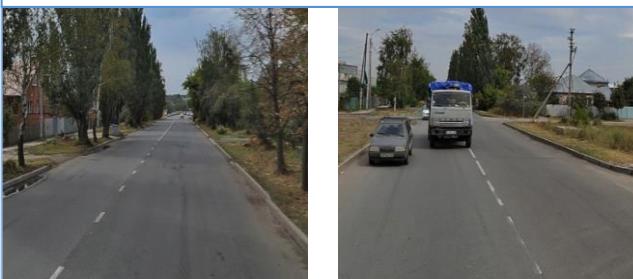

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);


- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

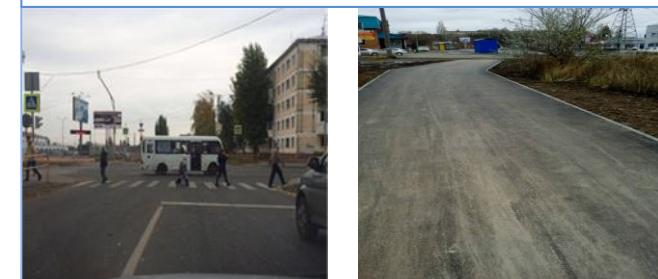



Ремонт автомобильной дороги по ул. Л. Толстого (от ул. Александра Кудашева до ул. Ломоносова)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»


№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	98
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	99
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	99
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.



Фото объекта
«До»

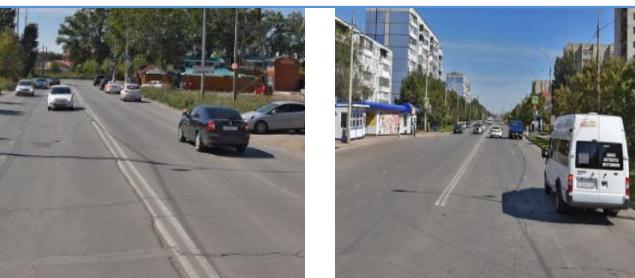

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);


- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

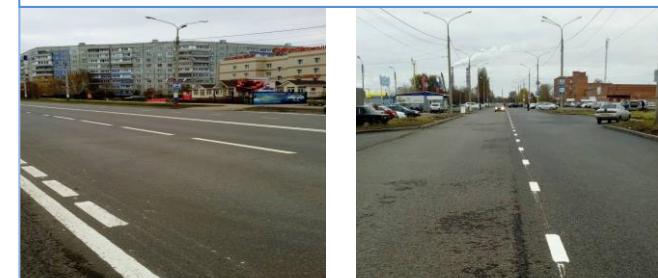



Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

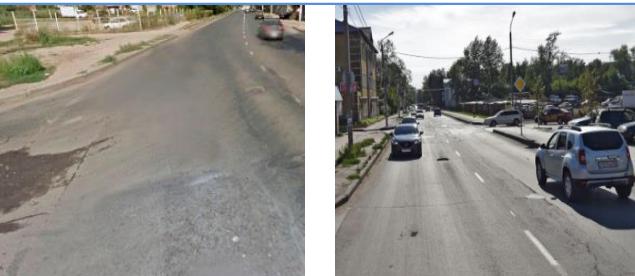

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республикаской)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»


№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Нанесение разметки	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.



Фото объекта
«До»

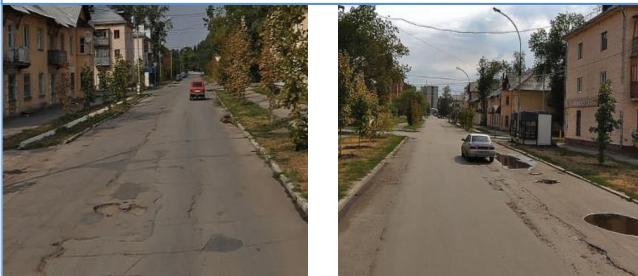

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);


- от районной администрации:

Гончаров А.В., т. 54-33-42;

- от общественного совета:

Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

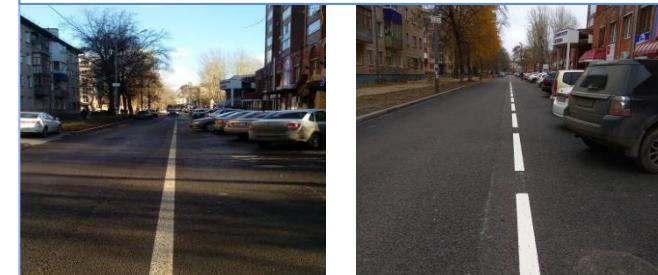



Ремонт автомобильной дороги по ул. Васильевская (от ул. Ларина до КТР ул. Баныкина - ул. Матросова - ул. Комсомольская)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги от Комсомольского шоссе до Яхт-клуба "Дружба"

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Радищева (от ул. Новозаводская до ул. Октябрьская)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластик "Universum"	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%




Фото объекта
«До»

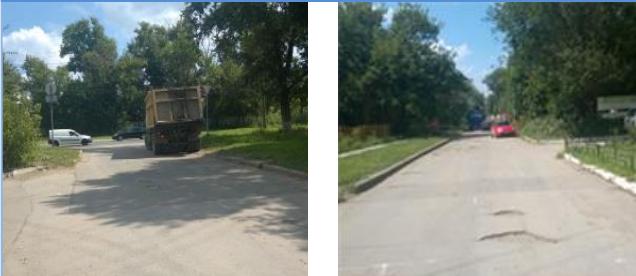

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

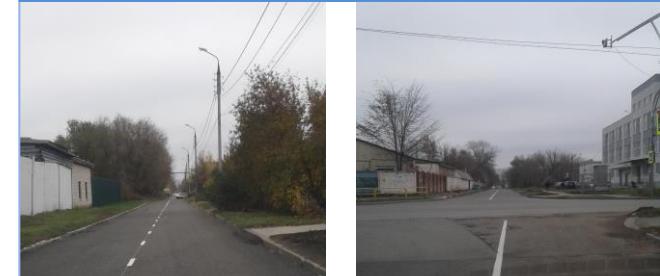



Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинградская (от ул. Родины до ул. Советская)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Устройство выравнивающего слоя из ЩМА-20 (ИДН)	100
6	Нанесение временной разметки	100
7	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%




Фото объекта
«До»

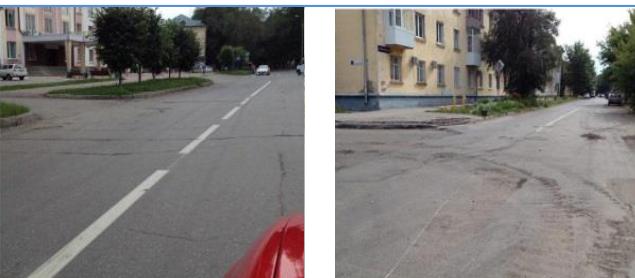

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

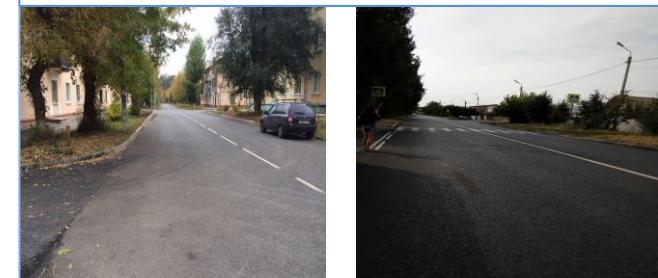



Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (от ул. Чапаева до ул. Пушкина)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

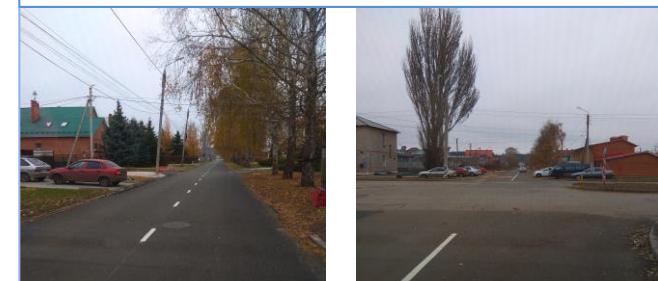



Ремонт автомобильной дороги по ул. Тимирязева (от дома № 45 до дома № 119)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки	100
6	Нанесение разметки термопластиком	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХит:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Ушакова (от ул. Комсомольская до ул. Мира)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

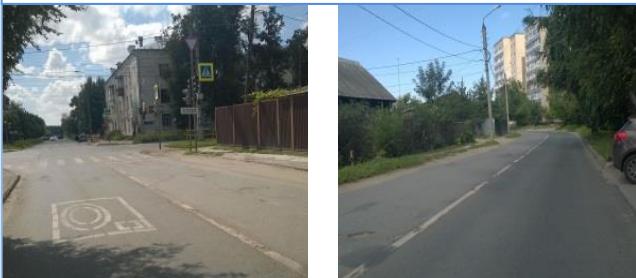


Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Схема ремонта автодорог в Комсомольском районе

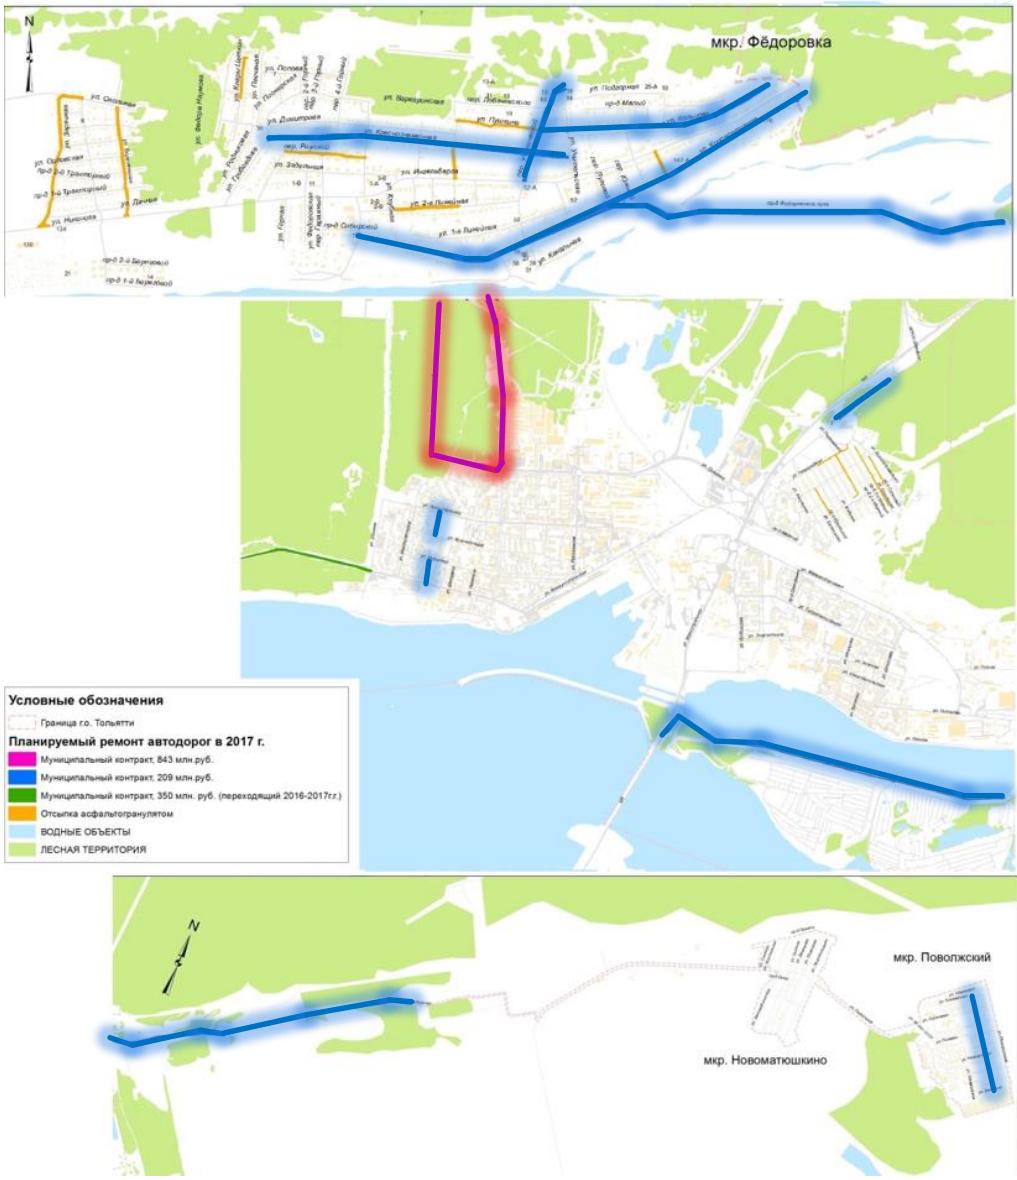

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог и отсыпке асфальтогранулятом

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ, тыс. руб.	Протяженность, км	Площадь, тыс.м ²
МК 0842200002117000001_259977 от 04 апреля 2017 г.				
1	ул. Громовой	19 943,81	0,73	9
2	ул. Матросова (кольцевая транспортная развязка на пересечении ул. Баныкина - ул. Комсомольская)	103 378,16	2,746	57,1
3	ул. Куниевская	68 567,99	2,5	35,82
Итого:		191 889,96	5,98	101,92
МК 0842200002117000095_259977 от 10 июля 2017 г.				
4	ул. Бурлацкая	22 660,54	3,5	24,5
5	проезд Федоровские луга	18 803,10	2,6	15
6	ул. Раздольная	27 486,33	3,9	26,5
7	ул. Кооперативная	16 221,42	2,27	14,33
8	ул. Академика Вавилова	9 702,33	1,16	8,535
9	ул. Космодемьянской	1 807,81	0,24	1,6
10	ул. Параллельная	6 401,36	1	7
11	ул. Кольцова	5 811,65	1	5
12	ул. Краснознаменная	8 019,60	1,25	6,88
13	пер. Ученический	3 126,68	0,41	2,46
Итого:		120 040,82	17,33	111,81
Всего:		311 930,78	29,28	213,73
Отсыпка асфальтогранулятом				
1	Автодорога по ул. Пархоменко	522,59	0,652	2,608
2	Автодорога по ул. Заречная	498,36	0,576	2,22
3	Автодорога по ул. Брестская	573,76	0,662	2,648
4	Автодорога по ул. Телеграфная (от ООТ "Туберкулезный диспансер" до ул. Фадеева)	420,35	0,485	1,94
5	Автодорога по пр. Иркутский (от ул. Менделеева до ул. Высоковольтная)	274,27	0,315	1,26
6	Автодорога по пр. Осиновый	404,54	0,463	1,845
7	Автодорога по ул. 2-я Линейная (от д.16 до д.27)	233,77	0,246	0,984
8	Автодорога по ул. Окольная от д.2 до д.5	103,38	0,11	0,44
9	Автодорога по ул. Воронежская	333,33	0,357	1,428
10	Автодорога по переулку Рижский	527,76	0,56	2,24
11	Автодорога по ул. Клары Цеткин (от д.12 до д.26)	143,77	0,154	0,616
12	Автодорога по проезду от ул. Ингельберга между домами 82, 84 до ул. Кооперативной	107,84	0,113	0,452
13	Автодорога по проезду от ул. Ингельберга между домами 45,47 до ул. Краснознаменной	205,28	0,145	0,87
14	Автодорога по ул. Пушкина	232,86	0,3	1,11
Итого:		4 581,85	4,838	20,661



Ремонт автомобильной дороги по ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	89
7	Нанесение разметки	80


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

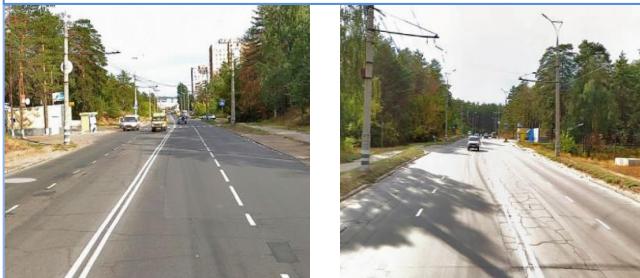

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХИТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (от ул. Громовой до ул. Комсомольской, включая кольцевую-транспортную развязку на пересечении ул. Баныкина - ул. Комсомольская - ул. Базовая - ул. Матросова)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	98
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	95
6	Устройство покрытия тротуаров и посадочных площадок	100


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

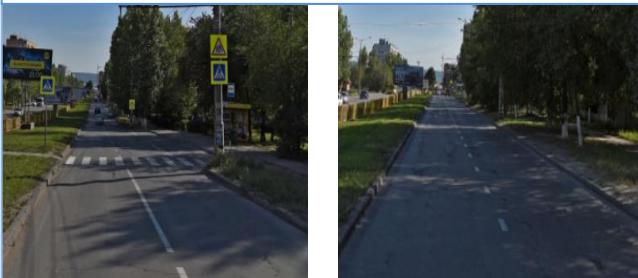

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХИТ:

Грабовский К.Л., т. 54-44-33 (4987);


- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»

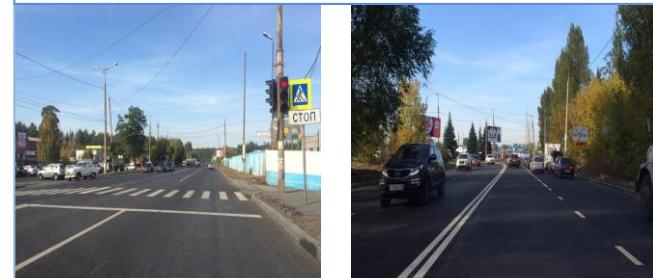



Ремонт автомобильной дороги по ул. Кунеевская (от ул. Баныкина до ул. Громовой)

Аукцион
(21.03.2017 г.)

Контракт от
04.04.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»


№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Замена бортового камня	100
6	Нанесение разметки	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.



Фото объекта
«До»

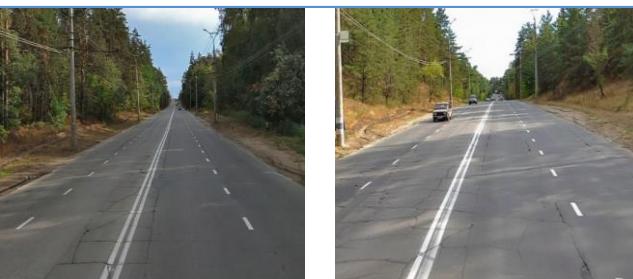

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Бурлацкая (от М-5 до нижнего шлюза)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по проезду Федоровские луга (от ул. Кооперативная до границы г.о. Тольятти)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная (от ТОАЗа до ЭПО "Поволжский")

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная (от дома № 1 до дома № 203 по ул. Кооперативная)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	0
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги ул. Академика Вавилова (от ул. Кожевенная до ул. Весенняя)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	0
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХИТ:**
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Космодемьянской (от ул. Коммунистическая до ул. Лизы Чайкиной)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Параллельная (от ул. Бориса Коваленко до Обводного шоссе)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);


- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»

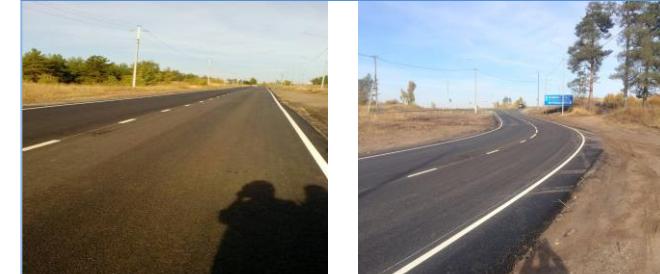



Ремонт автомобильной дороги по ул. Кольцова (от переулка Ученический до дома №81 по ул. Кольцова)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	0


Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»

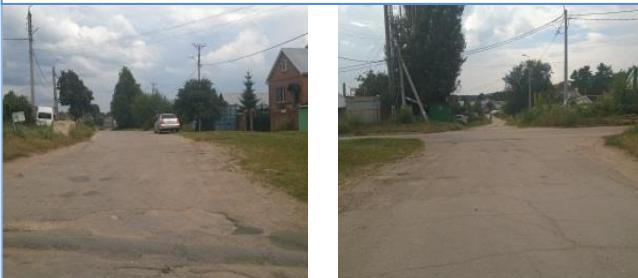

Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснознаменная (от ул. Учительской до ул. Грибоедова)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж и монтаж люков	100
2	Срезка поверхностного слоя	100
3	Устройство выравнивающего слоя из к/з	100
4	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Нанесение временной разметки краской	100
6	Нанесение разметки термопластиком "Universum"	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»





Ремонт автомобильной дороги по пер. Ученический (от ул. Ингельберга до дома №15 по ул. Учительской)

Аукцион
(26.06.2017 г.)

Контракт от
10.07.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Срезка поверхностного слоя	100
2	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з асфальтобетона	100
3	Восстановление покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
4	Нанесение временной разметки краской	100
5	Нанесение разметки термопластиком	0

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)*

* согласно поручения министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Пивкина И.И. срок окончания работ 30.10.2017 г.

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:

Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;

- от ДДХиТ:

Пиккельгаут О.В., т. 54-44-33 (4222);

- от районной администрации:

Анисимов А.Н., т. 54-44-00;

- от общественного совета:

Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автомобильных дорог асфальтогранулятом

№ п/п	Наименование	Протяженность дороги (км)	Объем работ, тыс. м ²	Стоимость с НДС, руб.
Центральный район:				
1	Автодорога по проезду Молодежный	0,756	3,024	622 602,43
2	ул. Калинина (от ул. Шлютова до пр. Чернышевского)	0,070	0,280	57 168,97
3	Автодорога по проезду Свободы	0,215	0,860	177 219,19
4	Автодорога по ул. Д. Ульянова	0,360	1,440	296 464,75
5	Автодорога ул. М. Ульяновой (от ул. Мичурина до 7-го Онежского пер.)	0,188	0,752	151 905,61
6	Автодорога по проезду Ключевой	0,130	0,500	102 578,76
Итого по Центральному району:		1,719	6,856	1 407 939,70
Комсомольский район:				
1	Автодорога по ул. Пархоменко	0,652	2,608	522 588,54
2	Автодорога по ул. Заречная	0,576	2,220	498 359,35
3	Автодорога по ул. Брестская	0,662	2,648	573 760,63
4	Автодорога по ул. Телеграфная (от ООТ "Туберкулезный диспансер" до ул. Фадеева)	0,485	1,940	420 351,16
5	Автодорога по пр. Иркутский (от ул. Менделеева до ул. Высоковольтная)	0,315	1,260	274 268,40
6	Автодорога по пр. Осиновый	0,463	1,845	404 535,27
7	Автодорога по ул. 2-я Линейная (от д. №16 до д. №27)	0,246	0,984	233 766,61
8	Автодорога по ул. Окольная от д. №2 до д. №5	0,110	0,440	103 379,06
9	Автодорога по ул. Воронежская	0,357	1,428	333 330,92
10	Автодорога по переулку Рижский	0,560	2,240	527 758,08
11	Автодорога по ул. Клары Цеткин (от д. №12 до д. №26)	0,154	0,616	143 769,01
12	Автодорога по проезду от ул. Ингельберга между домами №№82, 84 до ул. Кооперативной	0,113	0,452	107 837,75
13	Автодорога по проезду от ул. Ингельберга между домами №№45, 47 до ул. Краснознаменной	0,145	0,87	205 282,29
14	Автодорога по ул. Пушкина	0,300	1,110	232 861,05
Итого по Комсомольскому району:		4,838	20,661	4 581 848,10
Всего:		6,557	27,517	5 989 787,80

Отсыпка автодороги по проезду Молодежный


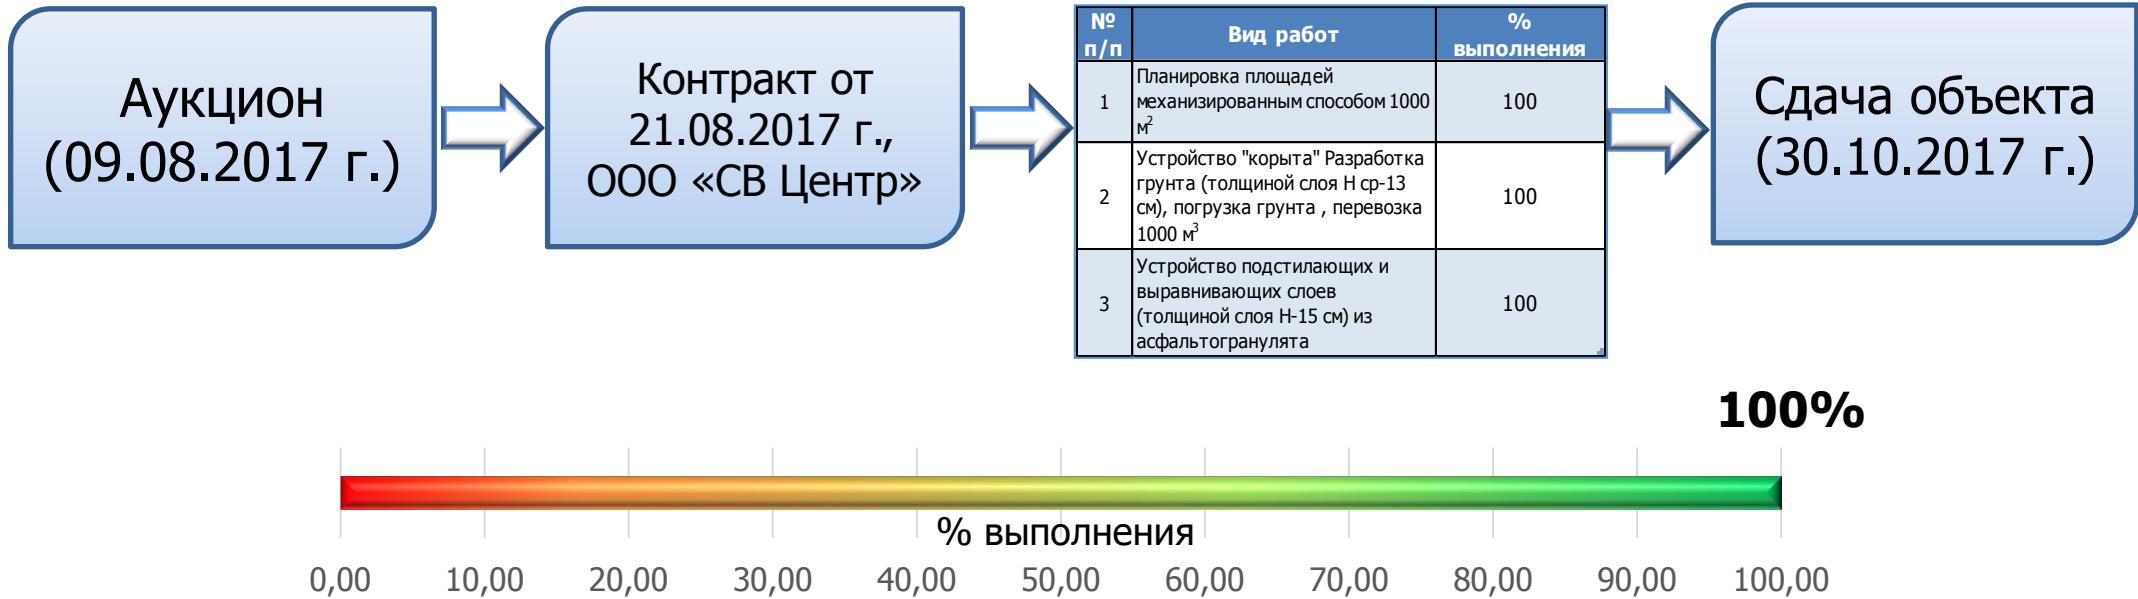


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

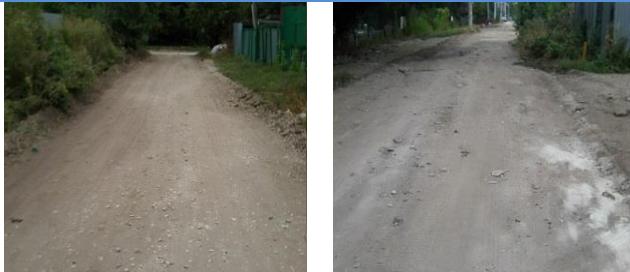

Отсыпка автодороги по ул. Калинина (от ул. Шлютова до пр. Чернышевского)

Аукцион
(09.08.2017 г.)

Контракт от
21.08.2017 г.,
ООО «СВ Центр»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Планировка площадей механизированным способом 1000 м ²	100
2	Устройство "корыта" Разработка грунта (толщиной слоя Н > 13 см), погрузка грунта, перевозка 1000 м ³	100
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (толщиной слоя Н-15 см) из асфальтогранулята	100

Сдача объекта
(30.10.2017 г.)

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по проезду Свободы

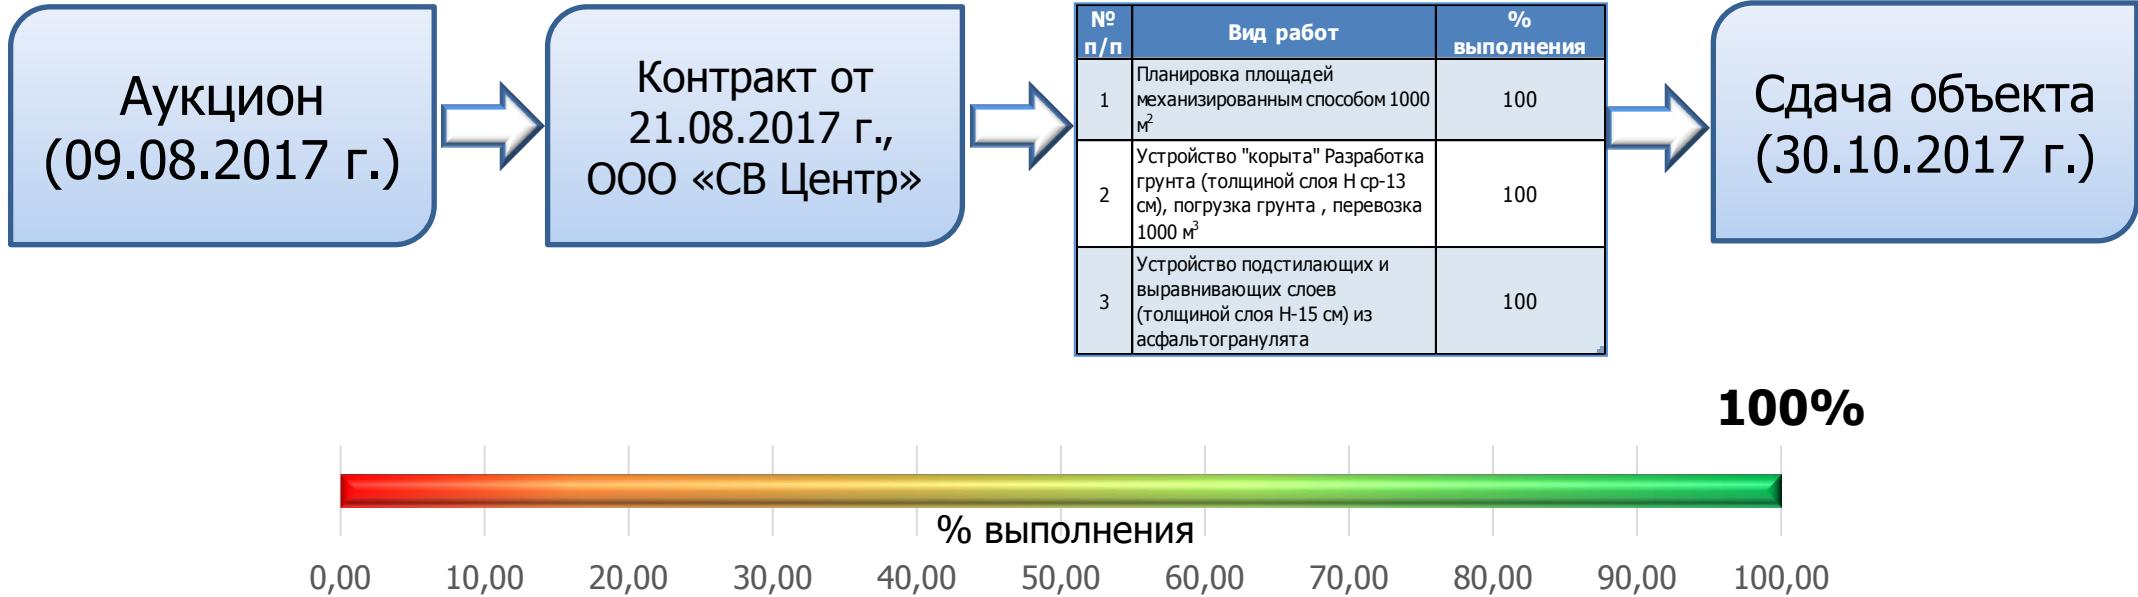


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Д. Ульянова

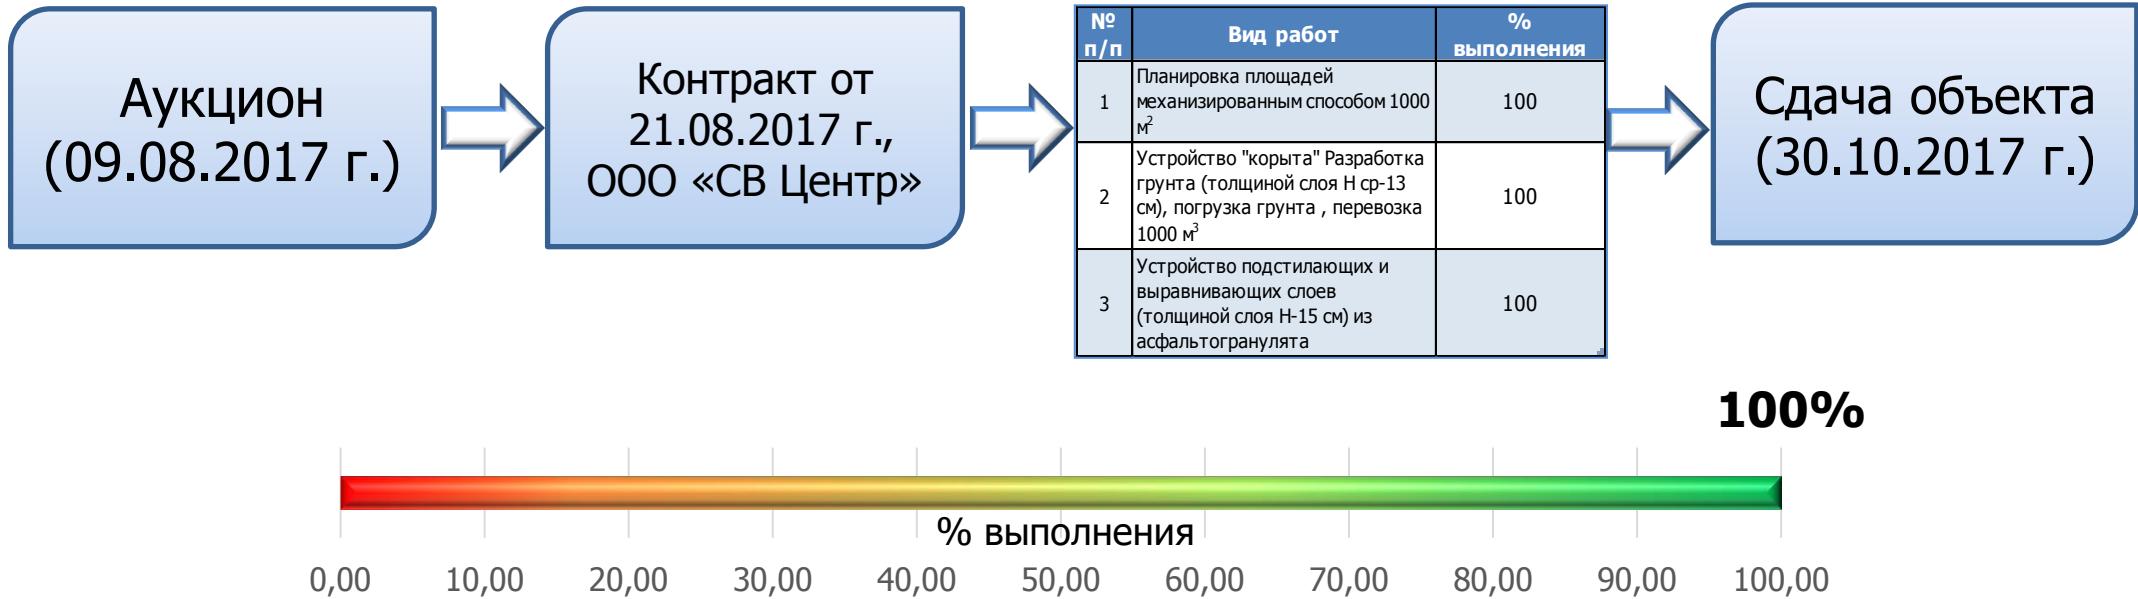


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. М. Ульяновой (от ул. Мичурина до 7-го Онежского пер.)


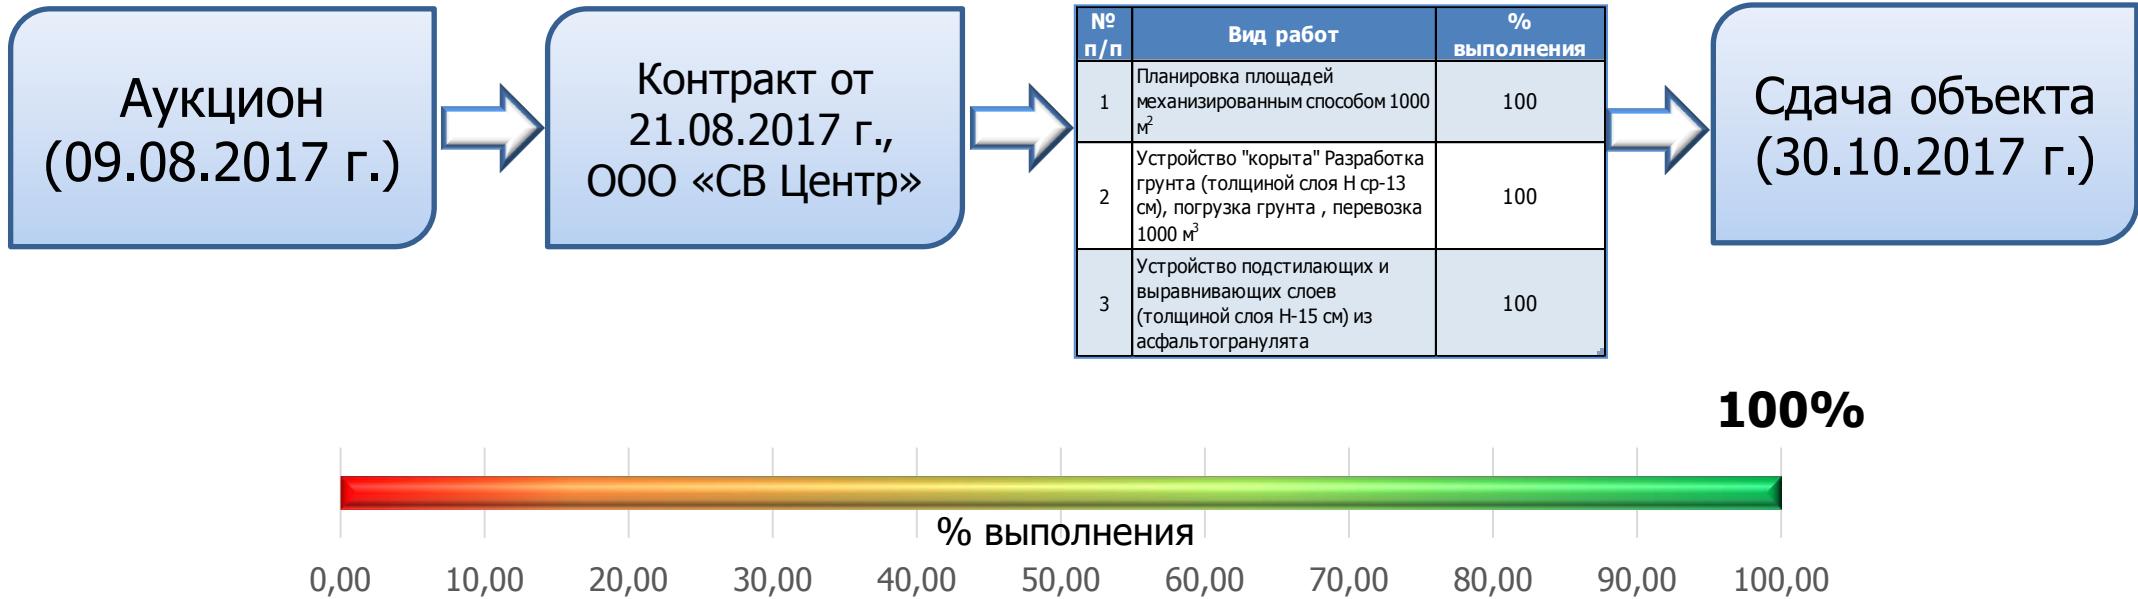


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

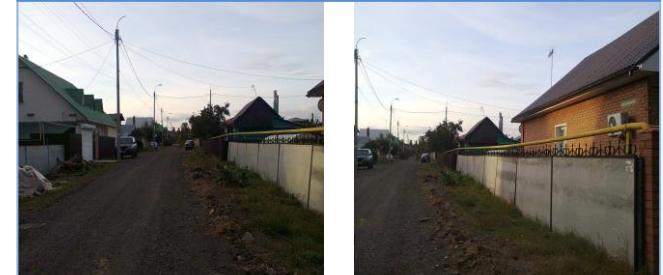

Отсыпка автодороги по проезду Ключевой


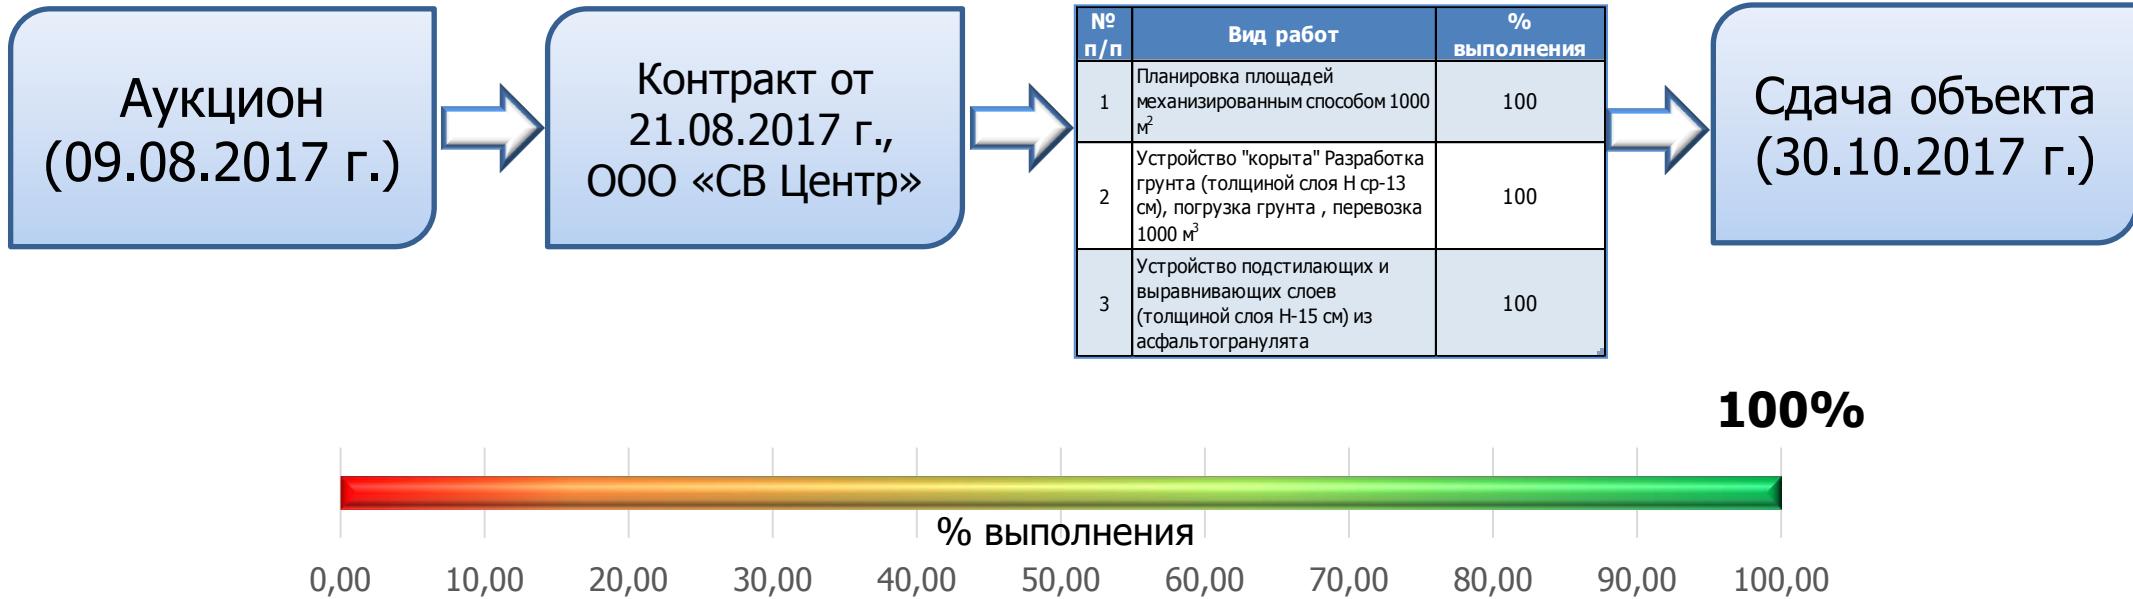


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

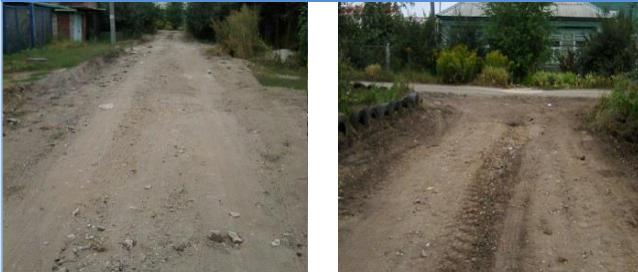

Отсыпка автодороги по ул. Пархоменко

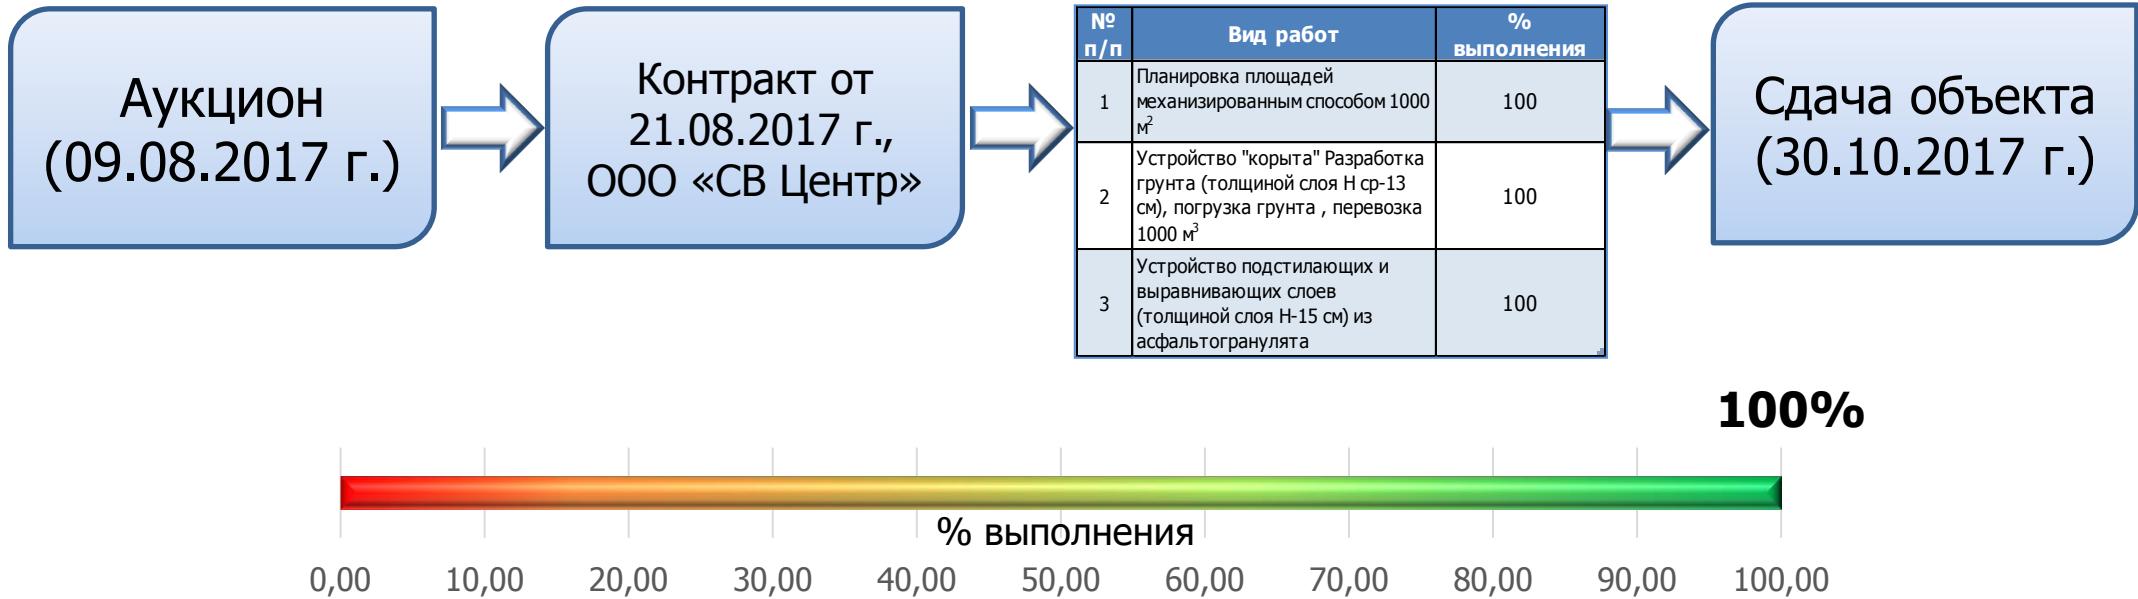


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Заречная

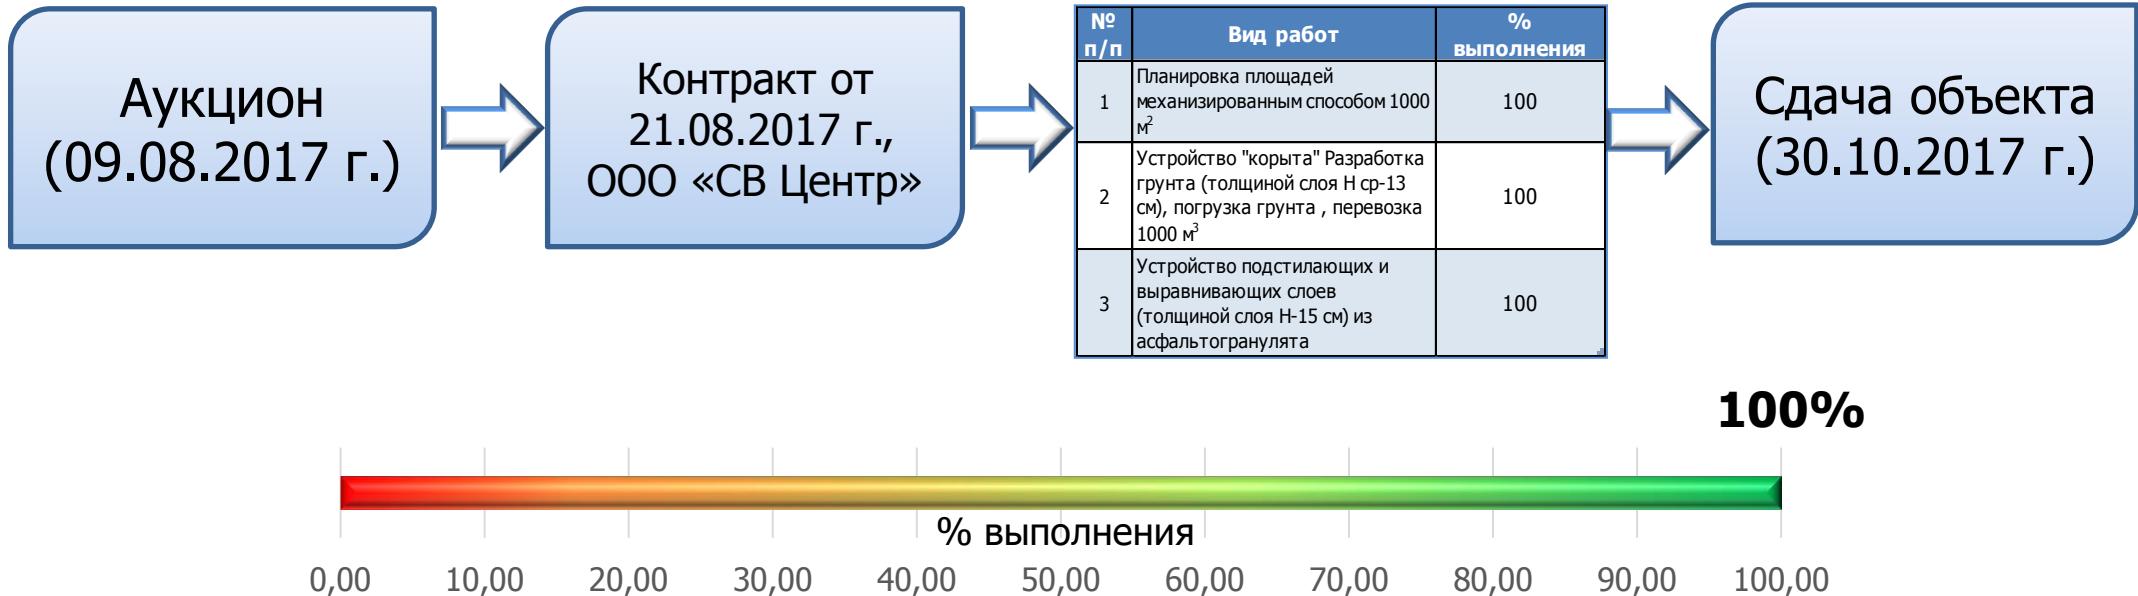


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Брестская

Аукцион
(09.08.2017 г.)

Контракт от
21.08.2017 г.,
ООО «СВ Центр»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Планировка площадей механизированным способом 1000 м ²	100
2	Устройство "корыта" Разработка грунта (толщиной слоя Н > 13 см), погрузка грунта, перевозка 1000 м ³	100
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (толщиной слоя Н-15 см) из асфальтогранулята	100

Сдача объекта
(30.10.2017 г.)

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Телеграфная (от ООТ "Туберкулезный диспансер" до ул. Фадеева)

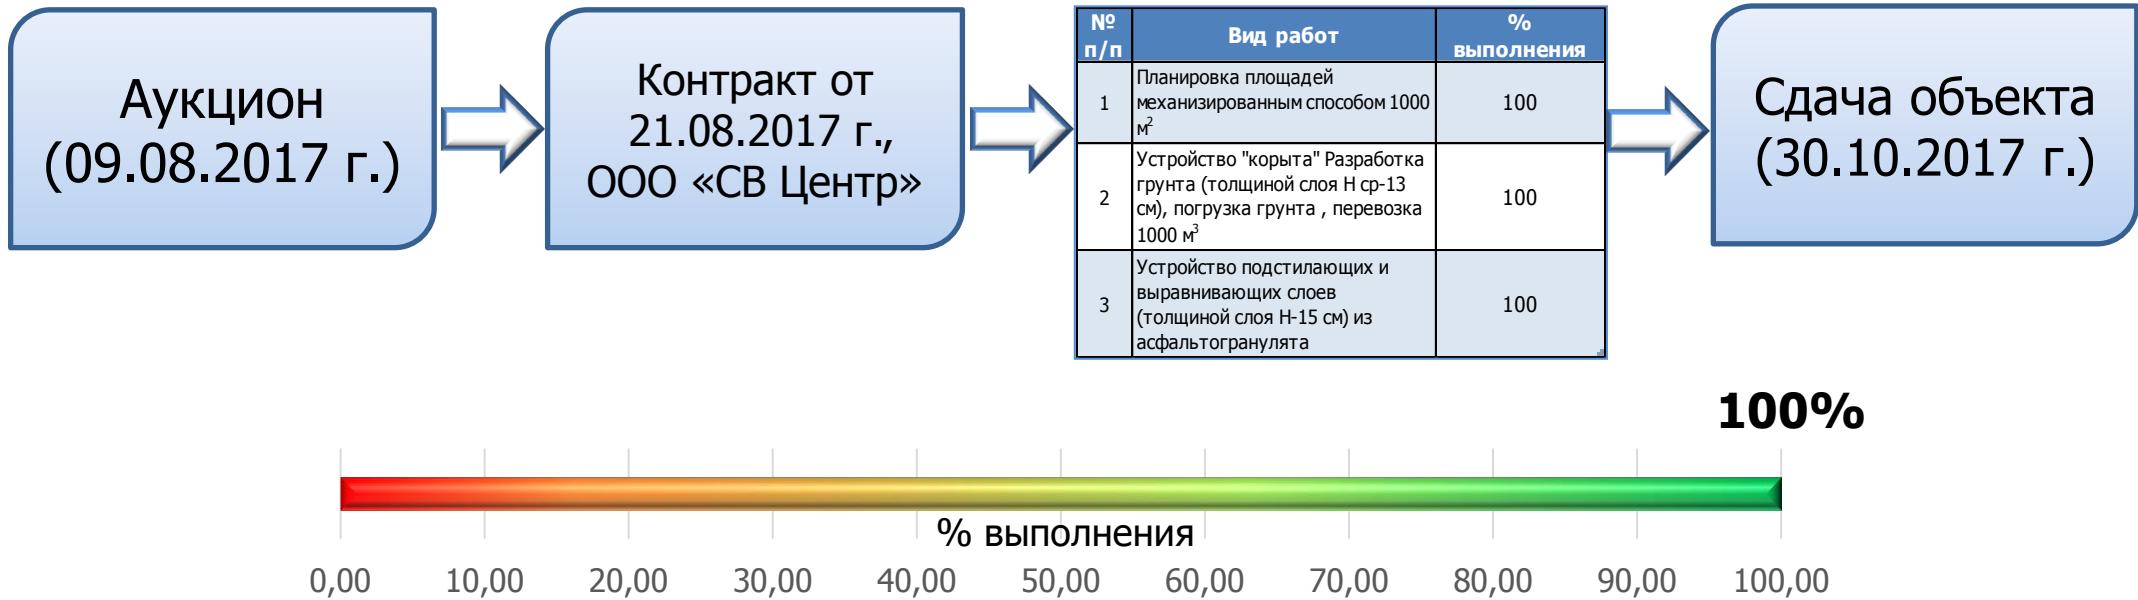


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХИТ:
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по проезду Иркутский (от ул. Менделеева до ул. Высоковольтная)

Аукцион
(09.08.2017 г.)

Контракт от
21.08.2017 г.,
ООО «СВ Центр»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Планировка площадей механизированным способом 1000 м ²	100
2	Устройство "корыта" Разработка грунта (толщиной слоя Н > 13 см), погрузка грунта, перевозка 1000 м ³	100
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (толщиной слоя Н-15 см) из асфальтогранулята	100

Сдача объекта
(30.10.2017 г.)

100%



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по проезду Осиновый

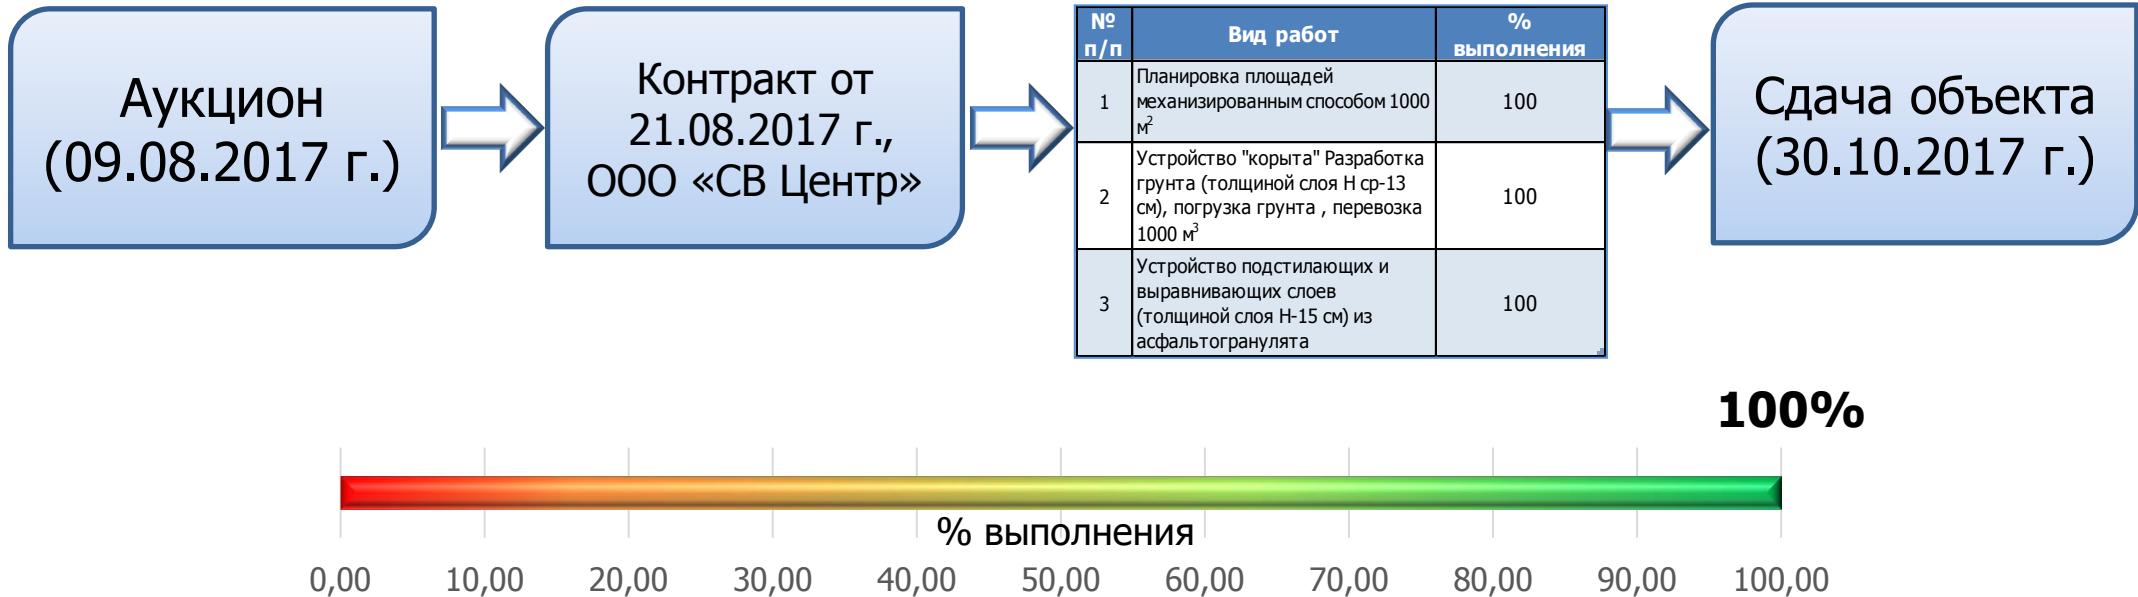


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. 2-я Линейная (от д. №16 до д. №27)

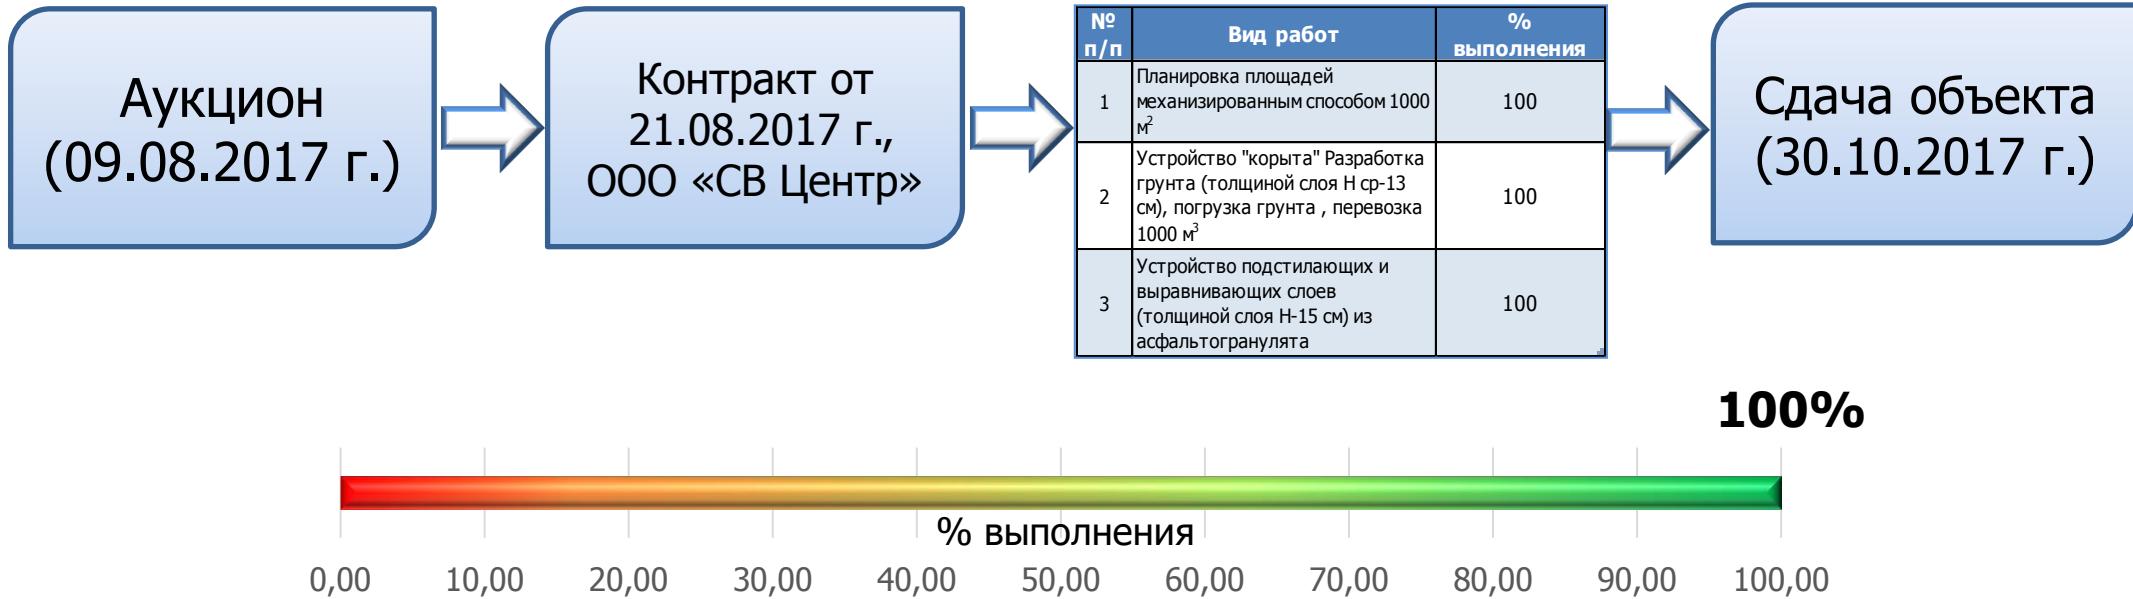


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Окольная от д. №2 до д. №5

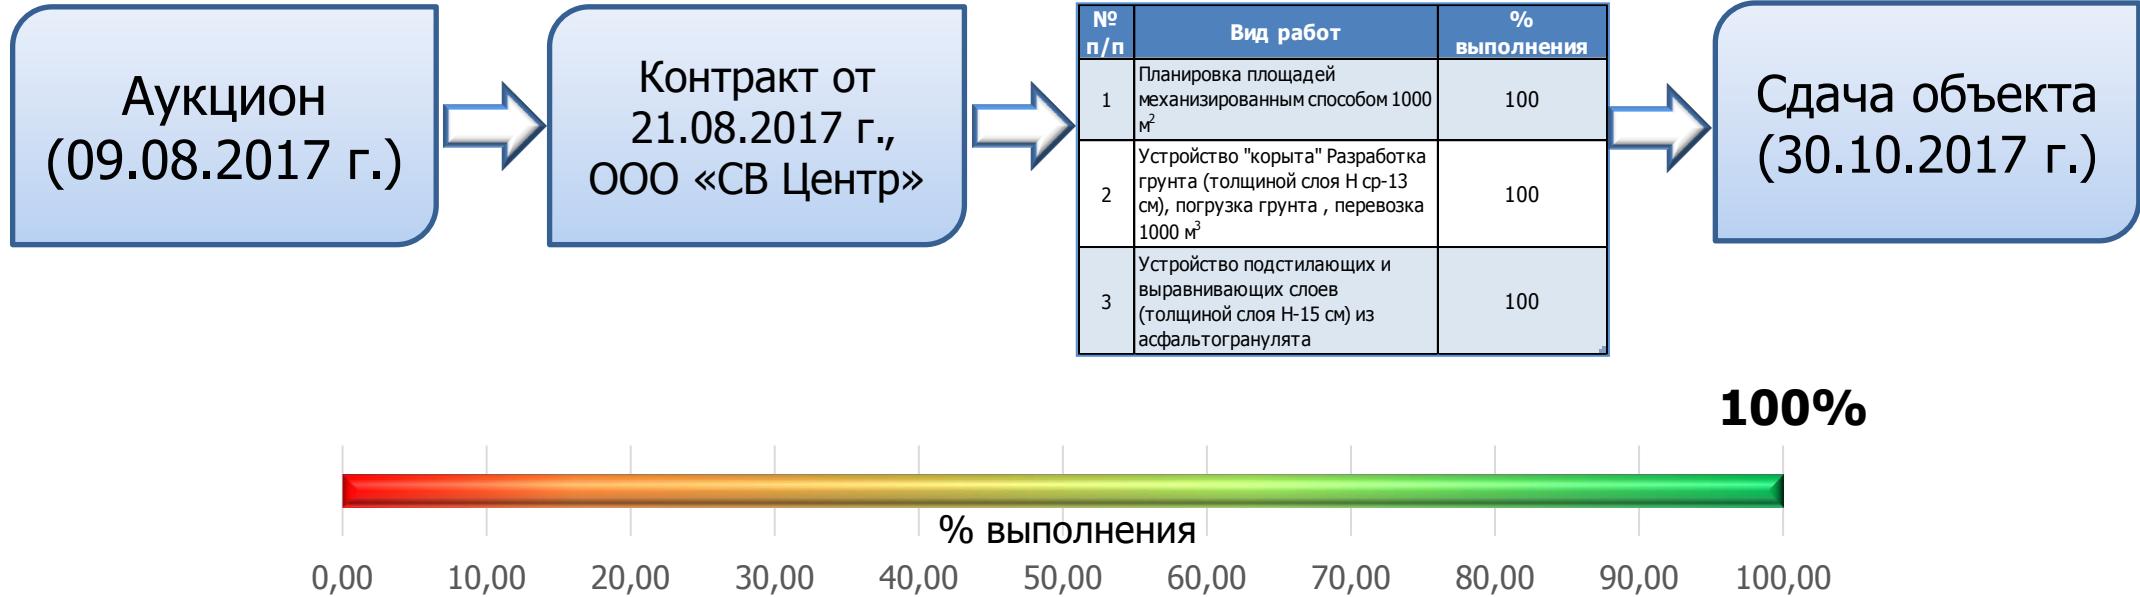


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Воронежская

Аукцион
(09.08.2017 г.)

Контракт от
21.08.2017 г.,
ООО «СВ Центр»


№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Планировка площадей механизированным способом 1000 м ²	100
2	Устройство "корыта" Разработка грунта (толщиной слоя Н > 13 см), погрузка грунта, перевозка 1000 м ³	100
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (толщиной слоя Н-15 см) из асфальтогранулята	100

Сдача объекта
(30.10.2017 г.)

100%



Фото объекта
«До»

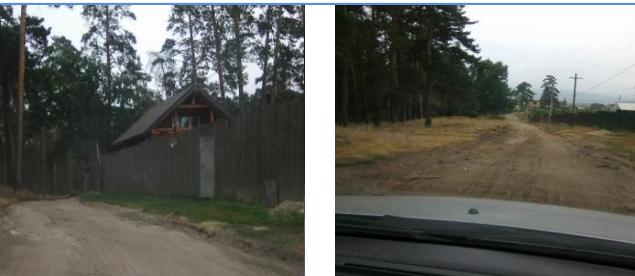

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по переулку Рижский


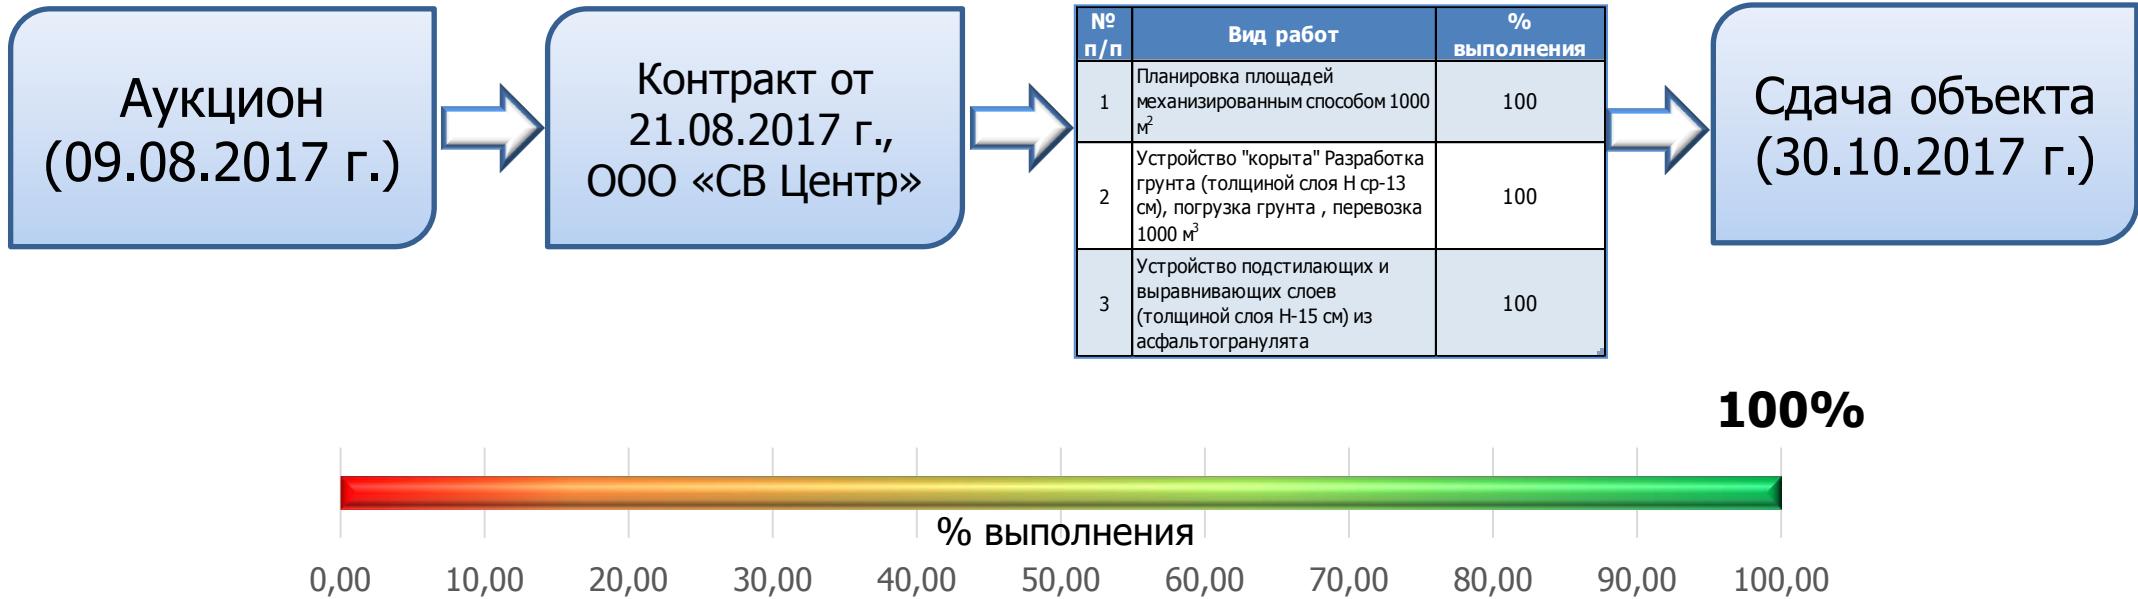


Фото объекта
«До»

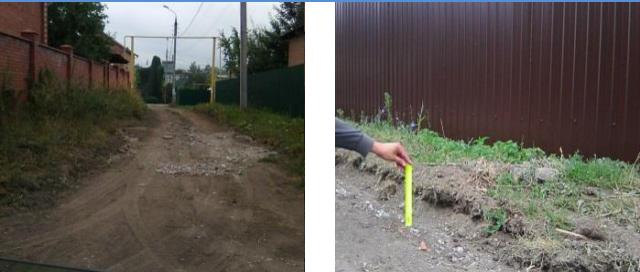

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Клары Цеткин (от д. №12 до д. №26)

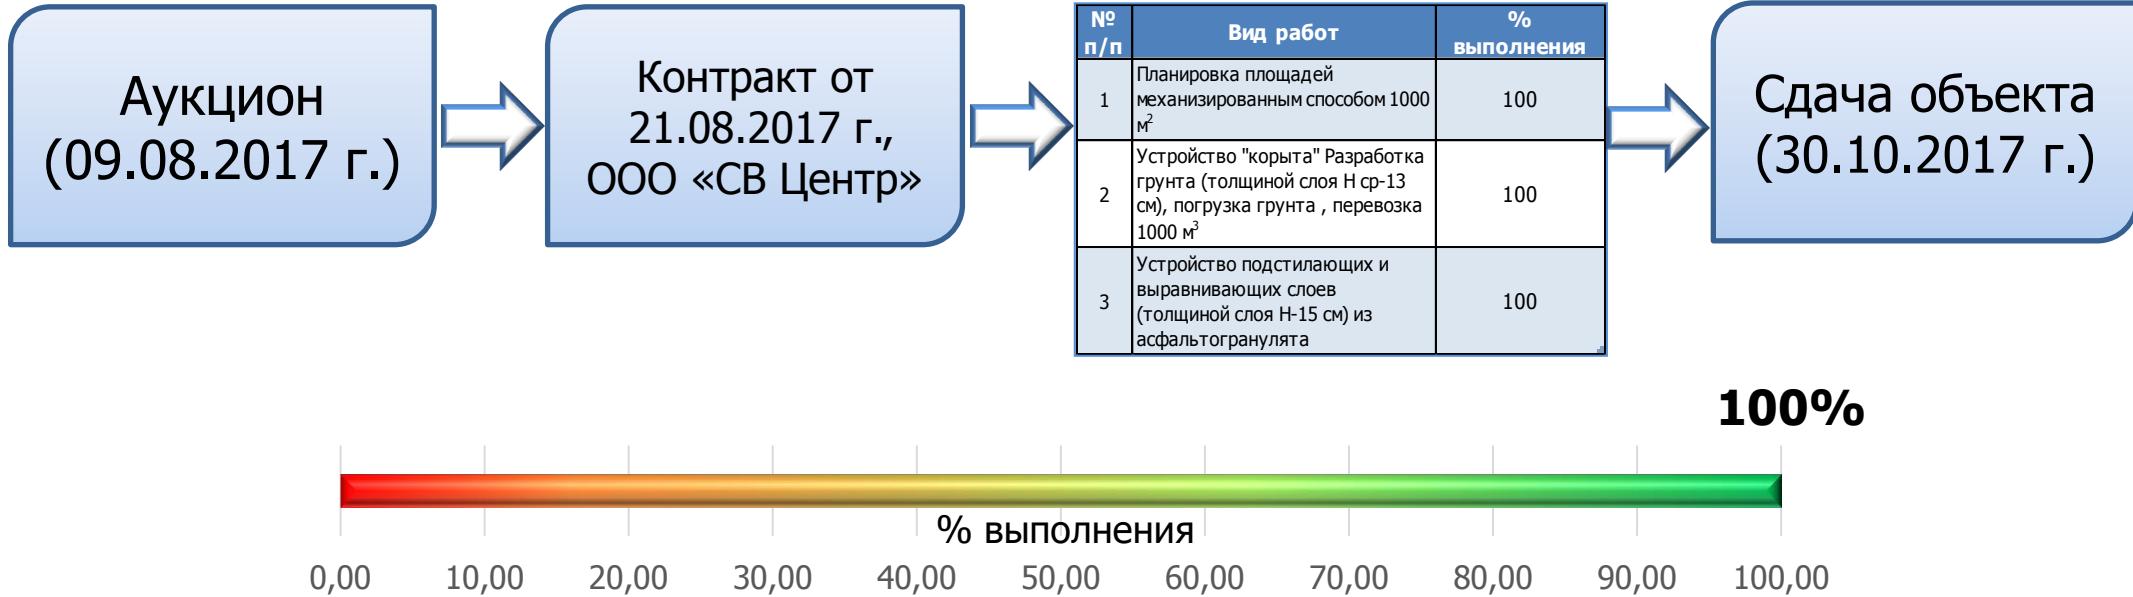


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по проезду от ул. Ингельберга между домами №№82, 84 до ул. Кооперативной

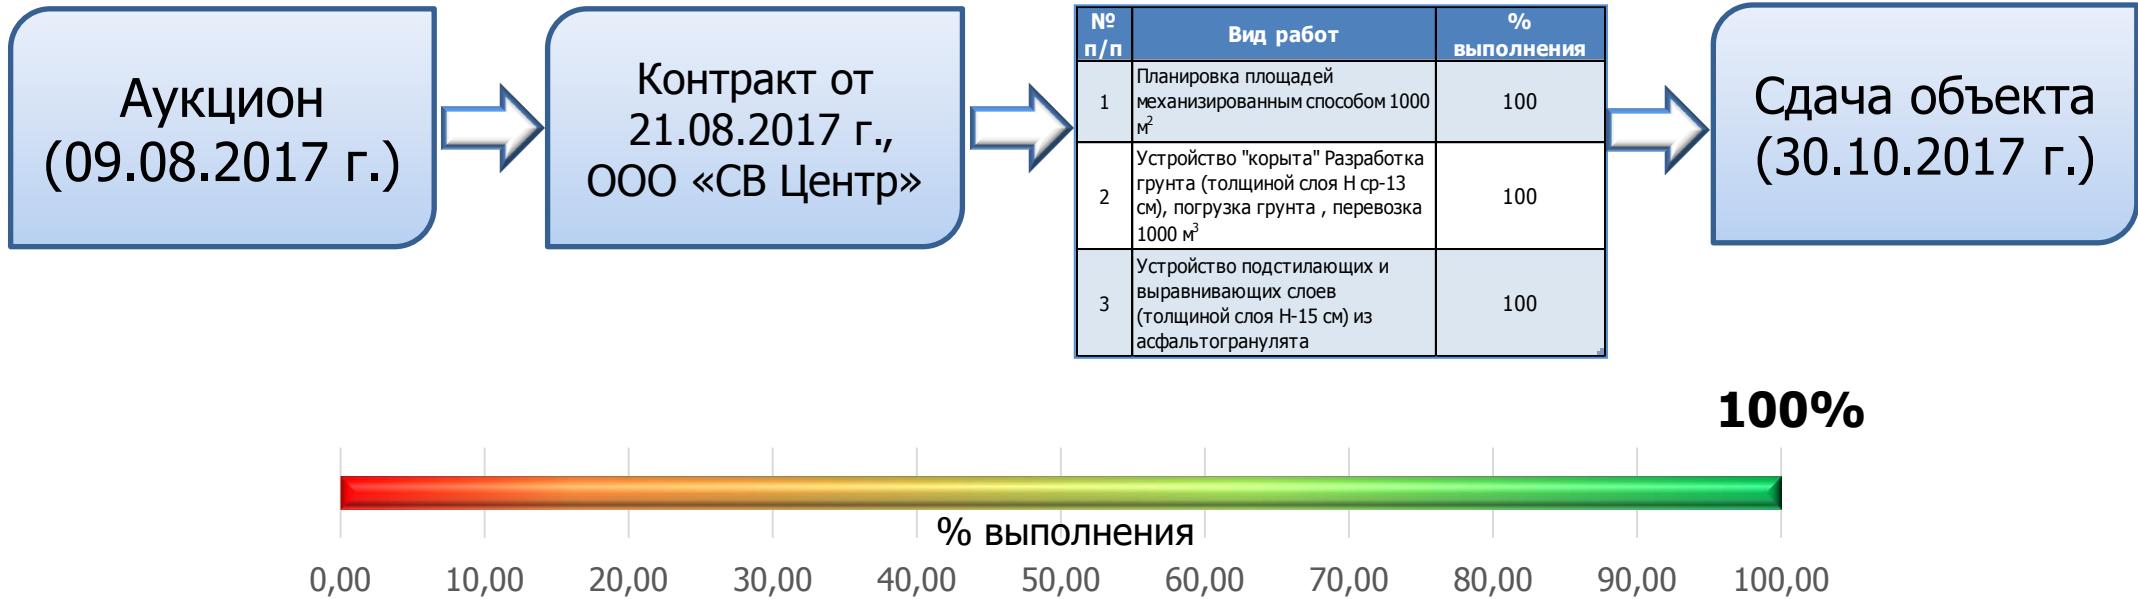


Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по проезду от ул. Ингельберга между домами №№45, 47 до ул. Краснознаменной



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХит:
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Отсыпка автодороги по ул. Пушкина

Аукцион
(09.08.2017 г.)

Контракт от
21.08.2017 г.,
ООО «СВ Центр»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Планировка площадей механизированным способом 1000 м ²	100
2	Устройство "корыта" Разработка грунта (толщиной слоя Н > 13 см), погрузка грунта, перевозка 1000 м ³	100
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (толщиной слоя Н-15 см) из асфальтогранулята	100

Сдача объекта
(30.10.2017 г.)

100%



Фото объекта
«До»




Ответственные:

- от подрядной организации:**
Пашков Д.Ф., т. 8-927-025-68-99;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»




Ремонт внутриквартальных дорог Автозаводский район

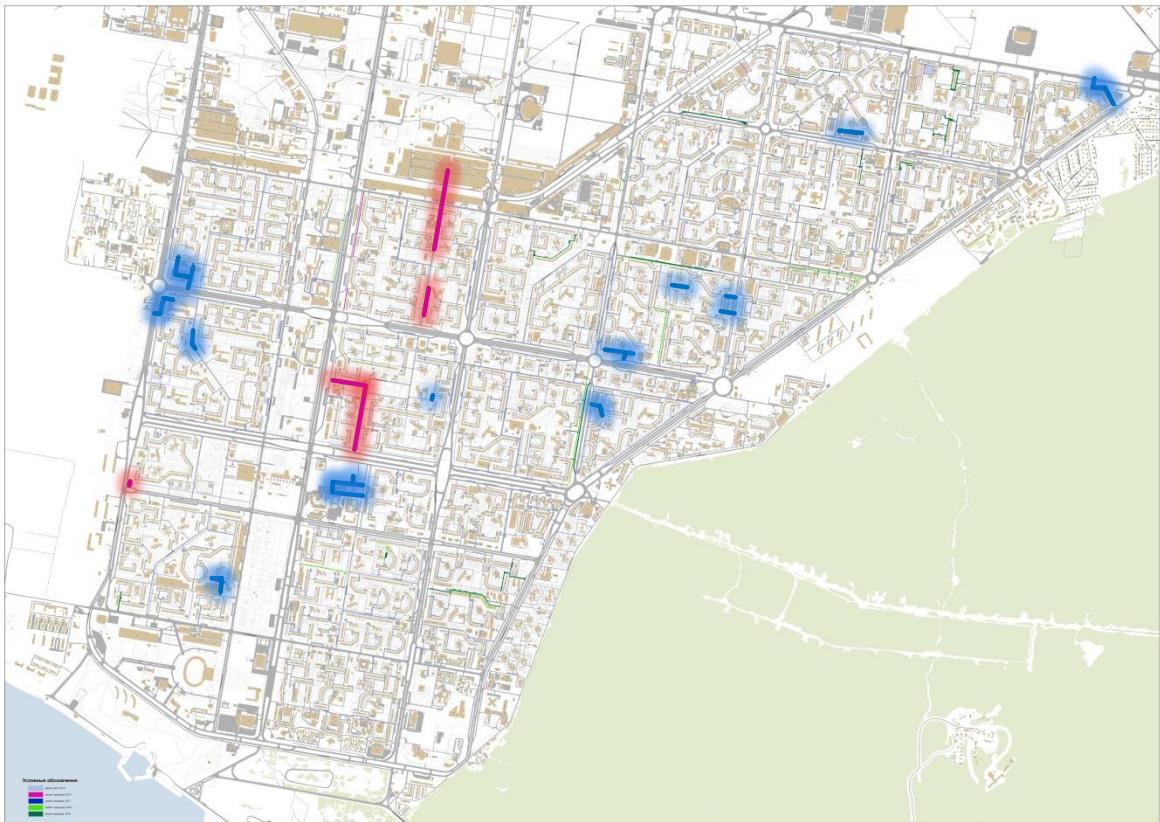

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	б-р Баумана, ремонт и восстановление проезжей части напротив домов б-р Баумана, 2, 4
2	пр-т Московский, 21 (включая спуск у ДЦ "Океан")
3	проезжая часть за поликлиникой ул. Свердлова, 82 и вдоль станции переливания крови
4	пешеходный тротуар от ул. Фрунзе в сторону дома пр-т Московский, 43
5	проезд к ул. Юбилейная, 31а от Нового пр-да, в т.ч. тротуар к Новому пр-ду, 2 со стороны Ленинского пр-та
6	тротуар периметровый по ул. Юбилейной (от ул. Свердлова до ул. Юбилейной, 13 и от ул. Юбилейной, 9 до ул. Дзержинского)
7	б-р Орджоникидзе
8	пр-т Ст. Разина, 24 (парковка у ТП)
9	ул. Революционная, 70, 72а дорога с восточной и северной стороны
10	въезды с ул. Автостроителей к дому ул. Автостроителей, 82 с южной и северной стороны здания ул. Автостроителей, 80 (маг. "Новинка")
11	въезд в квартал с ул. Свердлова через арку дома ул. Свердлова, 14 к ул. Ворошилова
12	проезжая часть и тротуар дома б-р Гая, 7 (проезд к поликлинике)
13	проезжая часть и тротуар ул. 70 лет Октября, 46
14	21 квартал
15	Фабричный проезд
16	ул. Ворошилова, 67

Ремонт и восстановление проезжей части напротив домов №№2, 4 по б-ру Баумана



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100



Фото объекта
«До»




Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт Московский пр-т, 21 (включая спуск у ДЦ "Океан")



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Замена бетонного бортового камня	100
4	Ремонт колодцев	100



Фото объекта
«До»




Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проезжей части за поликлиникой ул. Свердлова, 82 и вдоль станции переливаний крови



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Замена бетонного бортового камня	100
4	Ремонт колодцев	100



Фото объекта
«До»




Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт пешеходного тротуара от ул. Фрунзе в сторону дома №43 по Московскому пр-ту



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Замена покрытия тротуаров	100
2	Замена бетонного бортового камня	100
3	Ремонт колодцев	100



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда к ул. Юбилейная, 31а от Нового пр-да, в т.ч. тротуар к Новому пр-ду, 2 со стороны Ленинского пр-та

Аукцион
(07.08.2017 г.)


Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	90
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)




Фото объекта
«До»

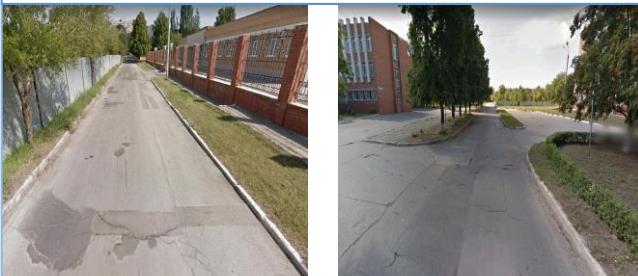

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

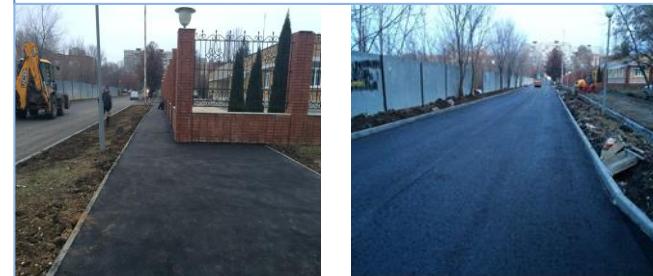

Ремонт тротуара периметрового по ул. Юбилейной (от ул. Свердлова до ул. Юбилейной, 13 и от ул. Юбилейной, 9 до ул. Дзержинского)





Фото объекта
«До»




Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

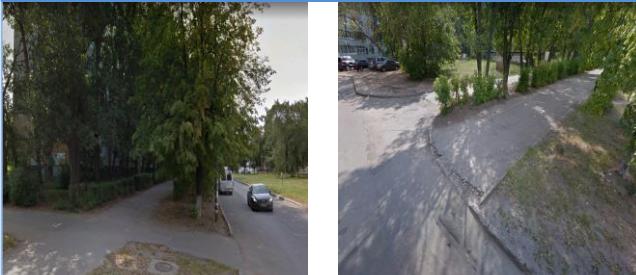

Ремонт широкого тротуара по б-ру Орджоникидзе



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия тротуаров	100
3	Замена бетонного бортового камня	100
4	Ремонт колодцев	100



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда по пр-ту Степана Разина, 24 (парковка у ТП)





Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

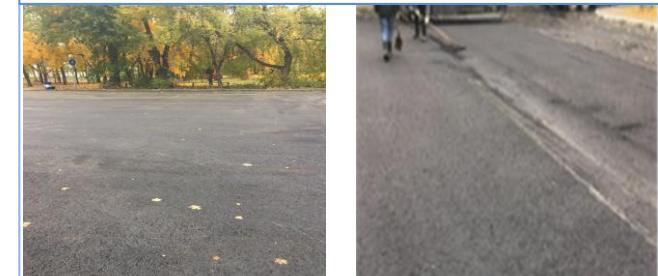

Ремонт дороги с восточной и северной сторон ул. Революционная, 70, 72а

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Автозаводский район

Ремонт въездов с ул. Автостроителей к жилому дому по ул. Автостроителей, 82 с южной и северной стороны здания Автостроителей, 80 (магазин "Новинка")





Фото объекта
«До»




Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

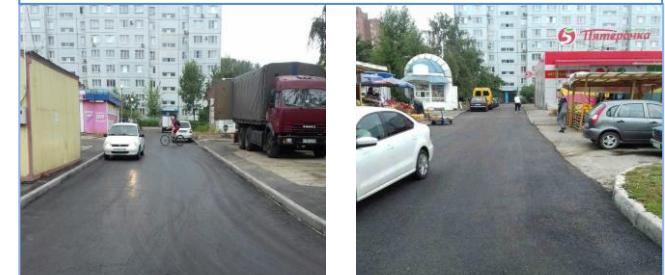

Ремонт въезда в квартал с ул. Свердлова через арку жилого дома ул. Свердлова, 14 к ул. Ворошилова



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия проездов	100
2	Замена бетонного бортового камня	100



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проезжей части и тротуара жилого дома по б-ру Гая, 7 (проезд к поликлинике)



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проезжей части и тротуара по ул. 70 лет Октября, 46




Фото объекта
«До»




Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»




Ремонт покрытия проездов в 21 квартале



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Ремонт колодцев	100




Фото объекта
«До»

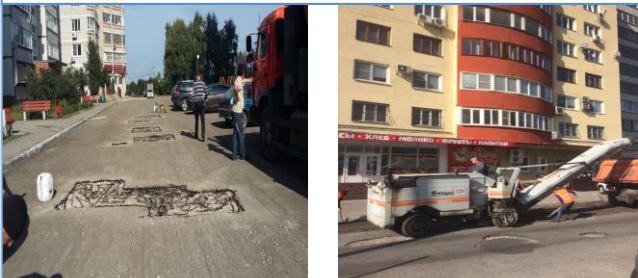

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

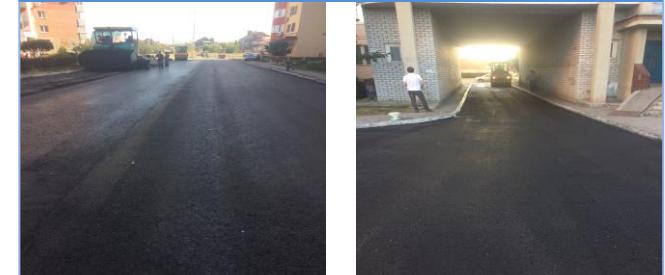

Ремонт проездов и тротуаров на Фабричном проезде




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Ремонт проездов и тротуаров по ул. Ворошилова, 67





Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

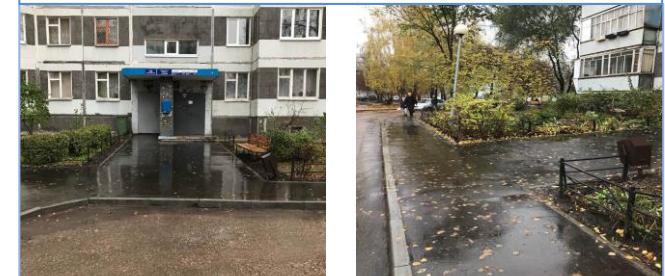

Ремонт внутриквартальных дорог Центральный район



Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	96 кв., от ул. Советская, 69 до ул. Ленинградская, 35
2	96 кв., внутренний проезд ул. Советской мимо д.73а, 83 вдоль д. 81 и д/с Синяя птица до с/ш 10
3	93а кв., проезд вдоль ул. Республикаской вдоль бассейна «Старт» до ул. Белорусской
4	75 кв., проезд перед дом быта «Россия» до ул. Ленинградской, 47
5	93а кв. проезд ул. Белорусская, 33
6	89-55 кв. тротуар по от ул. Мира, д. 33 до ул. Советской
7	Центральная площадь, 4
8	73 кв., проезд вдоль д. 70, 72 по ул. Баныкина до трансформаторной подстанции
9	14 кв., проезд к с/ш 13 м/д д. 96, 98 по ул. Ленина
10	143 кв., проезд от ул. Ларина до ул. Тимирязева вдоль многопрофильной больницы
11	12 кв., проезд к д. 42 по ул. К. Маркса
12	1 кв., проезд вдоль Чапаева, 129 до ул. Октябрьской, 66
13	25, 118 кв., тротуар по ул. Ленина, нечетн. сторона от ул. Ларина до внутриквартального проезда к д.53 по ул. Ленина

Ремонт внутридворового проезда от дома №69 по ул. Советской до дома №35 по ул. Ленинградской

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)

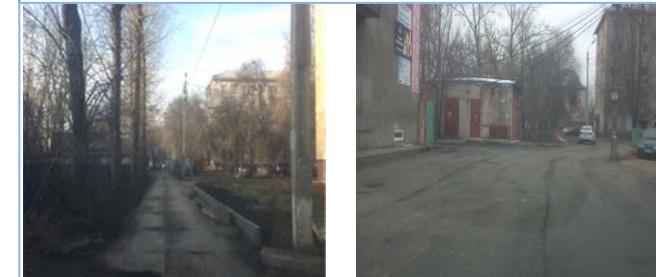


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Центральный район

Ремонт внутриквартального проезда с ул. Советской мимо домов №73А и №83 по ул. Советской вдоль дома №81, вдоль д/с №50 "Синяя птица" до школы №10

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»

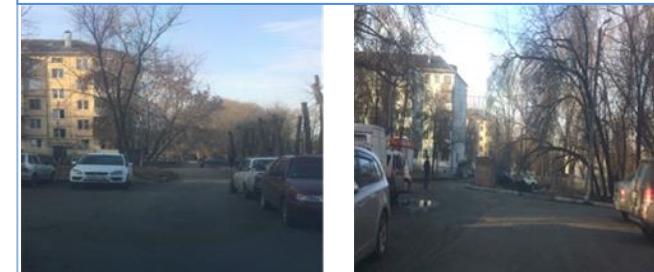

Ремонт проезда с ул. Республиканской вдоль бассейна "Старт" до ул. Белорусской



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда перед домом быта "Россия", тротуар до дома №47 по ул. Ленинградской

Аукцион
(07.08.2017 г.)


Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»

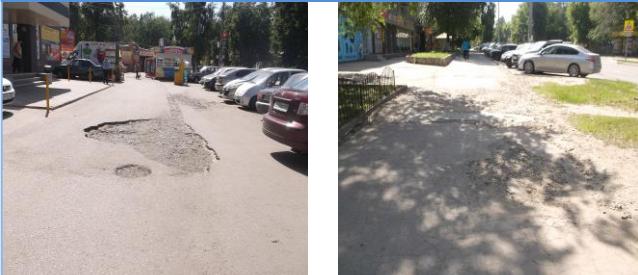

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда к дому №33 по ул. Белорусской



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт тротуара по ул. Мира от дома №33 до ул. Советской



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт дворовой территории Центральная площадь, 4

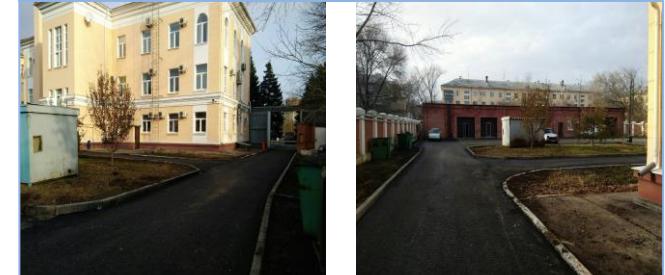


Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда с ул. Баныкина вдоль домов №70 и №72 до трансформаторной подстанции




Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда к школе №13 между домами №№96, 98 по ул. Ленина




Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда от ул. Ларина до ул. Тимирязева вдоль детской многопрофильной больницы



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда к д. №42 по ул. К. Маркса

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»




Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:**
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:**
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда вдоль дома №129 по ул. Чапаева до дома №66 по ул. Октябрьской



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100



Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт тротуар по ул. Ленина нечётная сторона от ул. Ларина до внутриквартального заезда к дому №53 по ул. Ленина



Фото объекта
«До»




Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Зимин А.С., т. 54-44-33 (3751);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта
«После»



Ремонт внутриквартальных дорог Комсомольский район

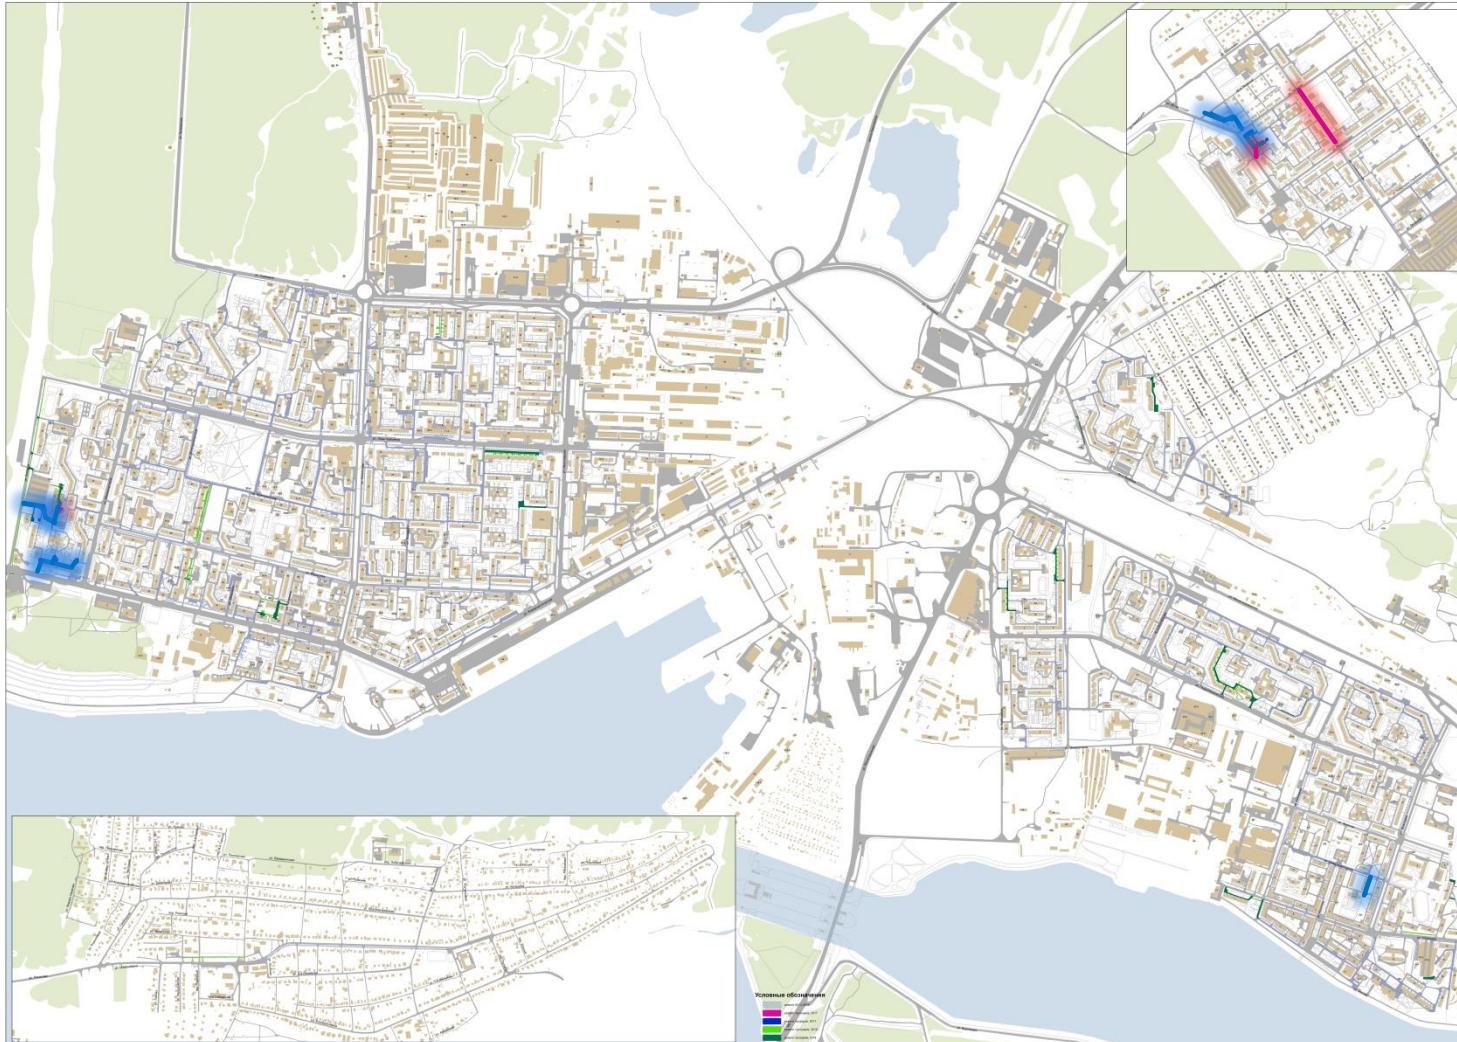

Перечень объектов по ремонту
внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	ул. Севастопольская, 10
2	ул. Олимпийская, нечетная сторона
3	ул. 60 лет СССР, 24, 26, 28, 30 (дворы)
4	ул. 60 лет СССР, 16, 18
5	ул. Коммунистическая, 13 (двор)
6	ул. Есенина, 8 (двор)
7	ул. Есенина, 6-8 (проезд)

Ремонт двора по ул. Севастопольская, 10

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Ремонт Олимпийского проезда, нечетная сторона




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Ремонт по ул. 60 лет СССР 24, 26, 28, 30 (дворы)

Аукцион
(07.08.2017 г.)

Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Ремонт проезда по ул. 60 лет СССР 16, 18




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Ремонт ул. Коммунистическая, 13 (двор)

Аукцион
(07.08.2017 г.)


Контракт от
18.08.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня	100
5	Ремонт колодцев	100

Сдача объекта
(30.11.2017 г.)



Фото объекта
«До»

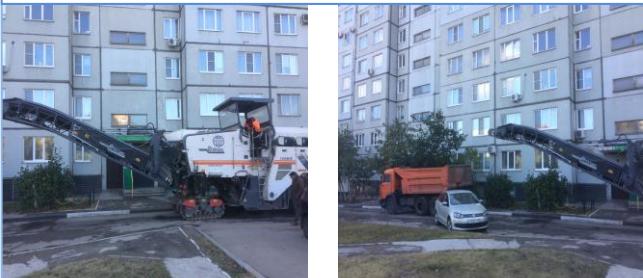

Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»



Ремонт ул. Есенина, 8 (двор)






Фото объекта
«До»

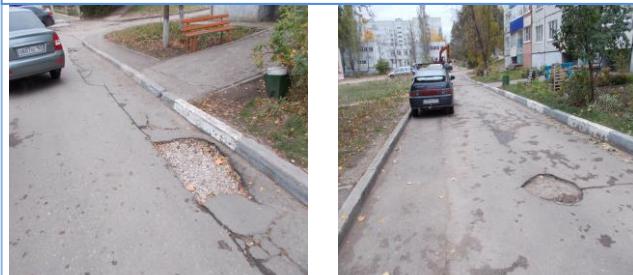


Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХит:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»

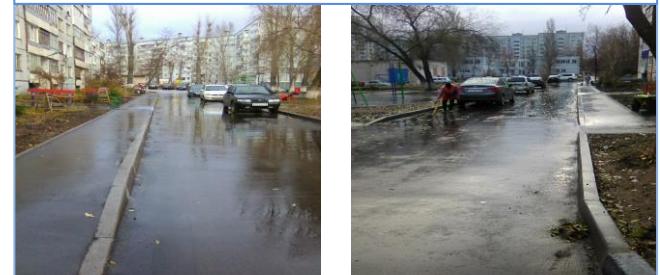

Ремонт проезда по ул. Есенина, 6-8 (проезд)



№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Замена бетонного бортового камня	100
4	Ремонт колодцев	100




Фото объекта
«До»



Ответственные:

- от подрядной организации:**
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:**
Курбатова Л.А., т. 54-44-33 (4991);
- от районной администрации:**
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:**
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта
«После»

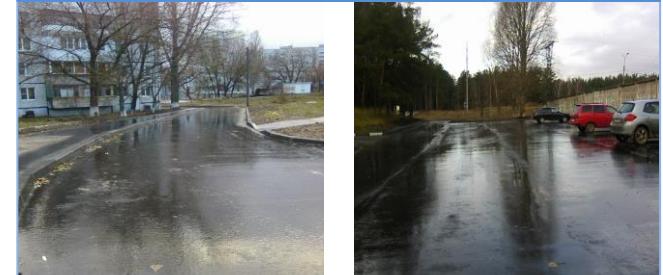

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»

№ п/п	Мероприятия	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	Устройство искусственных дорожных неровностей	42	2 570 190,55
2	Проектирование устройства парковочных площадок, карманов и стоянок	1	352 000
3	Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта	26	2 019 819
4	Проектирование устройства пешеходных дорожек	1	626 000
5	Проектирование устройства линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП	8	6 225 000
6	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	1	2 417 855
7	Устройство пешеходных дорожек	5	1 593 703
8	Устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП, в том числе осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	3	22 318 000
9	Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦОДД ГОТ"	-	25 026 000
10	Устройство светофорных объектов в рамках выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004	48	19 398 000
11	Приобретение дорожных знаков (с учетом выполнения работ по их установке)	17	5 709 000
12	Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений (с учетом выполнения работ по их установке)	35	8 462 000
13	Приобретение дорожных знаков	942	2 294 000
14	Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений	182	486 000
15	Содержание пешеходных ограничивающих ограждений	-	899 834
Всего:			100 397 401,55

Устройство искусственных дорожных неровностей

Аукцион
(07.04.2017 г.)

Контракт от
18.04.2017 г.,
ООО «Строй
Финанс Комфорт»

**СУММА КОНТРАКТА - 1 203 075,97 РУБ.
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ - 31.08.2017 Г.**

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения	Количество ИДН
1	ул. Ларина 24 (Соборная мечеть)	100	2
2	Молодежный бульвар д. №28 (С/Ш №13)	100	2
3	б-р Луначарского в районе д. №№11, 15, 19	100	4
4	б-р Луначарского в районе д. №21	100	2
5	ул. Фрунзе, д.2 (СОШ №58)	100	2
6	ул. Мурысева, 89а, С/Ш №18	100	1
7	ул. Шлюзовая, 8, Школа интернат №1	100	4
8	СОШ №21, д/с №90 «Золотое зернышко», д/с №27 «Лесовичок», ул. Первомайская в районе домов №21, 23 по б-ру 50 лет Октября	100	2
9	ул. Ставропольская, д. №19, СОШ №23	100	1
10	ул. Матросова, д. №№33, 37, техникум, колледж	100	4
Итого выполнено:			10 объектов
			24 шт.



ул. Ларина



ул. Матросова



Устройство искусственных дорожных неровностей

Аукцион
(14.04.2017 г.)

Контракт от
27.04.2017 г.,
ООО «Строй
Финанс Комфорт»

**СУММА КОНТРАКТА - 1 367 114,58 РУБ.
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ - 01.09.2017 Г.**

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения	Количество ИДН
1	проезд от Ст. Разина до ул. Ворошилова (9 кв.) д/с №22 "Лучик"	100	3
2	Ленинский пр-т, 42, 35, МБУ Школа №40, и МБОУ Элегия	100	2
3	ул. Юбилейная, 81, МБУ Школа №73	100	1
4	Цветной б-р, 13, МБУ Школа №82	100	2
5	ул. Дзержинского, 1, ул. 40 лет Победы, 74, МБУ Д/С №200 "Волшебный башмачок", Д/С №193 "Земляничка", СОШ №70, Д/С №187 "Солнышко"	100	3
6	ул. Чуковского, 3, МБУ д/с №20 "Снежок"	100	1
7	ул. Баныкина, 38, МБУ ДМО "Шанс"	100	4
8	ул. Чапаева, 35а, МБУ д/с №27 "Лесовичок"	100	1
9	Ул. Телеграфная, 4, МБОУ ДО "Гранит"	100	1
Итого выполнено:			9 объектов
			18 шт.



Б-р Луначарский



ул. Шлюзовая



Разработка проекта устройства парковочной площадки по ул. Автостроителей в районе дома №5



СУММА КОНТРАКТА - 352 000 РУБ.

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ



Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта

Аукцион
(10.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «СК-Развитие»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Западный пляж» на ул. Спортивная	100	2
2	ООТ «ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе	100	1
3	ООТ «Хладокомбинат» на ул. Коммунальная	100	2
Итого выполнено:		3 объекта	5 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 378 469 РУБ.

Аукцион
(10.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «СК-Развитие»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Молокозавод» на ул. Коммунальная	100	2
2	ООТ «Площадь Никонова» на ул. Никонова	100	2
Итого выполнено:		2 объекта	4 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 302 775 РУБ.

Аукцион
(11.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «АРГ»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «3б квартал» на ул. Степана Разина	100	1
2	ООТ «Парк Отель» на ул. Комзина	100	2
Итого выполнено:		2 объекта	3 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 213 900 РУБ.



Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта

Аукцион
(11.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «АРГ»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Опытный завод» на ул. Никонова	100	2
2	ООТ «Школа-интернат № 5» на ул. Лесная	100	1
Итого выполнено:		2 объекта	3 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 284 900 РУБ.

Аукцион
(11.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «АРГ»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Детский сад Елочки» на ул. Маршала Жукова	100	2
2	ООТ «Автовокзал» на ул. Родины	100	2
Итого выполнено:		2 объекта	4 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 284 900 РУБ.

Аукцион
(10.05.2016 г.)

Контракт от
26.05.2016 г.,
ООО «СК-Развитие»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Бульвар Луначарского» на ул. Ворошилова	100	2
2	ООТ «Чайкиной» на ул. Лизы Чайкиной	100	2
Итого выполнено:		2 объекта	4 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 302 775 РУБ.



Проектные работы по устройству и переносу остановок общественного транспорта

Аукцион
(31.05.2016 г.)

Контракт от
07.06.2016 г.,
ООО «СК-Развитие»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Бульвар Здоровья» на ул. 40 лет Победы	100	1
Итого выполнено:		1 объекта	1 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 84 000 РУБ.

Аукцион
(12.07.2016 г.)


Контракт от
21.07.2016 г.,
ООО «СК-Развитие»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения	Количество ООТ
1	ООТ «Фабрика Заготовок» на ул. Цеховая	100	1
2	ООТ «ул.40 лет Победы» на ул. Автостроителей	100	1
Итого выполнено:		2 объекта	2 шт.

СУММА КОНТРАКТА - 168 100 РУБ.



Проектирование устройства пешеходных дорожек



**СУММА КОНТРАКТА - 626 000 РУБ.
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**



Проектирование устройства линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП

Аукцион
(27.06.2016 г.)

Контракт от
11.07.2016 г.,
ООО «М-Строй»

№ п/п	Адрес объекта
1	ул. Новозаводская (от Обводного шоссе до дома №5 по ул. Новозаводская)
2	ул. Васильевская (от ул. Базовая до ул. Ларина)
3	ул. Борковская от ул. Вокзальная до строения №13 по ул. Северная
4	ул. Бурлацкая от трассы М5 «Урал» до разворотной площадки общественного транспорта в районе нижних шлюзов
5	ул. Ларина от ул. Васильевской до ул. Ломоносова
6	ул. Северная от ул. Борковская до дома №105 по ул. Северная

СУММА КОНТРАКТА: 5 749 000 РУБ.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
06.02.2017 .Г

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ, В ОТНОШЕНИИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕДЕТСЯ ПРЕТЕНЗИОННО – ИСКОВАЯ РАБОТА



Проектирование устройства линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП



СУММА КОНТРАКТА: 6 225 000 РУБ.

ОПЛАТА В 2018-2019 ГГ.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

10.05.2018 Г.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
СОГЛАСНО ГРАФИКУ



Устройство и перенос остановок общественного транспорта

Аукцион
(13.04.2017 г.)

Контракт от
25.04.2017 г.,
ООО «М-Строй»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения
1	ООТ «Школа-интернат №5» на улице Лесной	100
Итого выполнено:		1 объект

**СУММА КОНТРАКТА - 2 417 855 РУБ.
ОПЛАТА В 2018 Г.
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**



Устройство пешеходных дорожек

Аукцион
(10.04.2017 г.)

Контракт от
25.04.2017 г.,
ООО «М-Строй»


№ п/п	Наименование объекта	% выполнения
1	ул. 40 лет Победы, в районе ООТ «14 квартал»	100
2	ул. Шлюзовая, в районе дома №11	100
3	ул. Ярославская, в районе ООТ «ВНИИНЕРУД»	100
4	ул. Кирова, в районе пересечения с ул. Герцена	100
5	ул. Свердлова, в районе ООТ «Магазин мебель»	100
Итого выполнено:		5 объектов

СУММА КОНТРАКТА - **1 593 703 РУБ.**

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – **ДО 31.10.2017 Г.**

ОПЛАТА В 2019 Г.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ

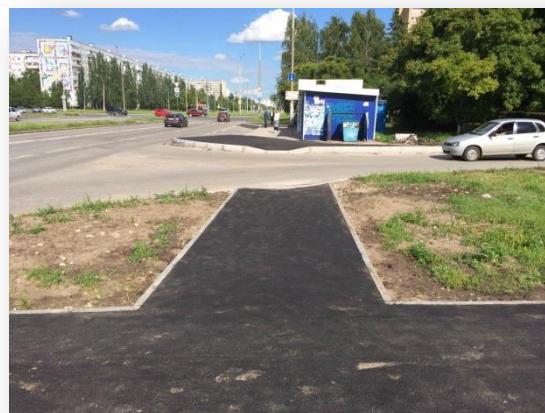

ул. Свердлова, в районе ООТ
«Магазин мебель»



ул. 40 лет Победы, в районе ООТ
«14 квартал»



Устройство линий наружного электроосвещения в местах концентрации ДТП

Аукцион
(08.02.2016 г.)

Контракт от
26.02.2016 г.,
ООО ПСК «Волга»

№ п/п	Наименование объекта	% выполнения
1	внутриквартальный проезд от дома №47 до дублера по ул. 40 лет Победы	100
2	ул. Бориса Коваленко от ул. Параллельная до ул. Высоковольтная	100
3	ул. Параллельная от съезда с трассы М-5 «Урал» до ул. Бориса Коваленко	100
Итого выполнено:		3 объекта

СУММА КОНТРАКТА - **22 318 000 РУБ.**

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

100%



Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения»

Основная цель - обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти.

МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляет содержание:



- светофорных объектов

204 шт.

- пешеходных ограждений

38 475,5 пог. м



- дорожных знаков

14584 шт.



- павильонов ООТ

54 шт.

в том числе 2 надземных и 2 подземных пешеходных перехода

**Для осуществления уставной деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ»
Утверждено финансирование – 25 026 тыс. руб.**



Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004

Аукцион
(20.11.2015 г.)

Контракт от
16.12.2015 г.,
ООО «СК-Развитие»


№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	ул. Автостроителей – ул. Дзержинского	100
2	ул. Ворошилова – ул. Дзержинского	100
3	Московский пр-т – ул. Дзержинского	100
4	ул. Революционная – ул. Свердлова	100
5	ул. Свердлова – ООТ «Сорренто»	100
6	пр-т Степана Разина – ООТ «3Б квартал»	100
7	ул. Баныкина – ул. Советская	100
Итого выполнено:		7 объектов

СУММА КОНТРАКТА - 9 950 000 РУБ.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ



Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004



СУММА КОНТРАКТА - 4 119 000 РУБ.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – 30.11.2017 Г.




Южное шоссе

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	Автозаводское шоссе - ул. Кирова	92
2	6-р Баумана напротив д/с №81 "Медвежонок"	92
3	6-р Баумана, 3 (СОШ №28)	94
4	6-р Гая, 25 в непосредственной близости к СОШ №62 и СОШ №72	72
5	6-р Космонавтов, 17 (СОШ №79)	92
6	6-р Космонавтов, 8 (д/с №201 "Волшебница")	92
7	6-р Туполева, 12 (СОШ №47)	92
8	Ленинский пр-т - ул. Жукова - ул. Ворошилова - ул. 40 лет Победы	100
9	Ленинский пр-т, ООТ "Пединститут"	46
10	Московский пр-т, ООТ "Приморский"	45
11	Приморский б-р - б-р Буденного	100
12	проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/с №199 "Муравышика"	92
13	пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа"	100
14	ул. 40 лет Победы, ООТ "б-р Здоровья"	100
15	ул. Громовой, ООТ "ул. Громовой"	100
16	ул. Громовой, ООТ "УТЭП"	100
17	ул. Дзержинского, 49	100
18	ул. Дзержинского, ООТ "Строительная"	92
19	ул. Жукова, 29 (д/с №161 "Лесовичок")	100
20	ул. Кирова - ул. Герцена	92
21	ул. Ларина - ул. Ломоносова	92
22	ул. Ленина - б-р 50 лет Октября	100
23	ул. Матросова, 33 (ТКСТИП)	92
24	ул. Матросова, 37 (КТИХО)	92
25	ул. Мичурина - ул. Герцена	96
26	ул. Победы - ул. Радищева	100
27	ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая"	100
28	ул. Спортивная, ООТ "Западный пляж"	68
29	ул. Спортивная, ООТ "Набережная" (пр-т Степана Разина, 99)	92
30	ул. Юбилейная - Ленинский пр-т	100
31	ул. Юбилейная - ул. Свердлова	100
32	ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие"	100
33	ул. Фрунзе, 1	92
34	Южное шоссе - ул. 40 лет Победы	100
35	Южное шоссе - ул. Л. Яшина	100
36	б-р Буденного, 9 (СОШ №33)	92
Итого выполнено:		36 объектов



Устройство светофорных объектов для приведения объектов г.о. Тольятти в соответствие с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004

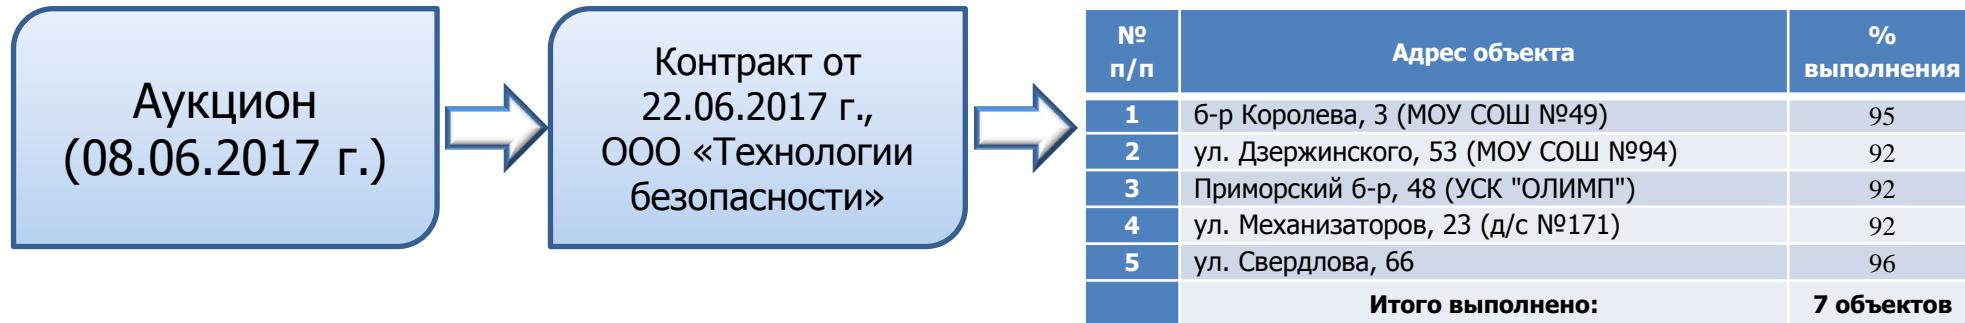

СУММА КОНТРАКТА – **4 876 297,36 РУБ.**

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – **30.11.2017 Г.**



Закупка дорожных знаков и выполнение работ по их установке

Аукцион
(18.07.2016 г.)

Контракт от
08.08.2016 г.,
ООО «М-Строй»

СУММА КОНТРАКТА - 5 709 000 РУБ.
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТ - 30.11.2017 Г.



№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	Московский пр-т, ООТ "3 квартал"	100
2	ул. 70 лет Октября - ул. Тополиная	100
3	Автозаводское шоссе, ООТ "ул. Мичурина"	100
4	ул. Мира - ул. Советская	100
5	ул. Мира - ул. Голосова	100
6	ул. К. Маркса - ул. Горького	100
7	ул. Л. Толстого, 26 (СОШ №91)	100
8	ул. Жукова - ул. Фрунзе	100
9	ул. Жукова, 1	0
10	ул. Юбилейная - ул. Фрунзе	100
11	ул. Революционная - ул. Фрунзе	100
12	ул. Ворошилова, 49	100
13	Автозаводское шоссе, 6 (ООТ "КВД")	100
14	Южное шоссе, 36 (МСЧ ВАЗа)	100
15	ул. Комсомольская - ул. Новозаводская	100
16	ул. Юбилейная в районе ООТ "Парк Победы" и ООТ "Кафе Салют"	100
17	Южное шоссе - ул. 40 лет Победы	100
Итого выполнено:		17 объектов



Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений (с учетом выполнения работ по их установке)

Аукцион
(18.07.2016 г.)

Контракт от
07.07.2016 г.,
ООО «ИК-Траст»

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА
35 ОБЪЕКТАХ, В Т.Ч. С ОПЛАТОЙ В 2017
ГОДУ – 8 462 ТЫС. РУБ.


МЕРОПРИЯТИЕ РЕАЛИЗОВАНО **НА 100%** НА
СУММУ 10 675,0 ТЫС. РУБ.




№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	ул. К. Маркса - ул. Гагарина	100
2	ул. К. Маркса - ул. Ленинградская	100
3	ул. Ленинградская - ул. Ушакова	100
4	б-р Баумана напротив д/с №981 "Медвежонок"	100
5	ул. Чайкиной - ул. Ярославская	100
6	Южное шоссе, ООТ "20 квартал"	100
7	б-р Космонавтов, 17 (СОШ №79)	100
8	ул. Юбилейная - Ленинский пр-т	100
9	б-р Космонавтов, 8 (д/с №201 "Волшебница")	100
10	ул. Спортивная, ООТ "Набережная" (пр-т Степана Разина, 99)	100
11	б-р Туполева, 12 (СОШ №47)	100
12	ул. Жукова, 29 (д/с №161 "Лесовичок")	100
13	ул. Шлюзовая, 8 (школа-интернат №1)	100
14	ул. Мира - ул. Советская	100
15	ул. Мира - ул. Голосова	100
16	ул. Комсомольская - ул. Советская	100
17	ул. Новозаводская - Туниковый пр-д	100
18	б-р Гая, 25 в непосредственной близости к СОШ №62 и СОШ №72	100
19	ул. Свердлова, ООТ "б-р Гая"	100
20	ул. Ленина - б-р 50 лет Октября	100
21	ул. Фрунзе в районе ООТ "Парк Победы"	100
22	ул. Новозаводская - ул. Комсомольская	100
23	ул. Лесная - ул. Ушакова - ул. Комсомольская - ул. Родины	100
24	Автозаводское шоссе, ООТ "ул. Мичурина"	100
25	пр-т Степана Разина, ООТ "Музыкальная школа"	100
26	ул. Юбилейная, ООТ "2-е комплексное общежитие"	100
27	ул. Победы - ул. Радищева	100
28	проезд от ул. Гидротехническая до ул. Энергетиков в районе д/с №199 "Муравьишка"	100
29	ул. Победы - ул. Комсомольская	100
30	ул. Баныкина в районе дома №12 (СОШ №26)	100
31	ул. Фрунзе, 1	100
32	Дзержинского, 49	100
33	ул. Юбилейная - Приморский б-р	100
34	ул. Баныкина, 4 (СОШ №16, ООТ "ул. Баныкина")	100
35	ул. 40 лет Победы, ООТ "б-р Здоровья"	100
Итого выполнено:		36 объектов



Закупка заготовок дорожных знаков



**СУММА КОНТРАКТА - 2 071 000 РУБ.
ЗАКУПЛЕНО – 824 ЗНАКА**



**СУММА КОНТРАКТА - 223 000 РУБ.
ЗАКУПЛЕНО – 118 ЗНАКОВ**



Приобретение пешеходных ограничивающих ограждений

Аукцион
(16.05.2017 г.)

Контракт от
08.06.2017 г.,
ООО «Монолит»

СУММА КОНТРАКТА - **486 000 РУБ.**
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПЛЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ -
182 ШТ



Содержание пешеходных ограничивающих ограждений

Аукцион
(02.05.2017 г.)

Контракт от
17.05.2017 г.,
ООО «РОМБ»

**СУММА КОНТРАКТА - 899 834 РУБ.
РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ**




№ п/п	Наименование объекта	Объем (пог.м)
1	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Южному шоссе в районе ООТ «18 квартал»	100,00
2	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Революционной и ул. Фрунзе (вдоль автодороги по ул. Революционной и на разделительной полосе ул. Фрунзе)	315,00
3	Пешеходные ограждения в районе пересечения Приморского бульвара и ул. Жукова (вдоль автодороги по Приморскому бульвару и ул. Жукова)	240,00
4	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Южному шоссе в районе ООТ «Треугольник»	80,00
5	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Жукова в районе ООТ «Детский сад Дубравушка»	240,00
6	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Дзержинского в районе ТЦ «Карусель»	150,00
7	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Южному шоссе в районе ООТ «Поликлиника ВАЗ»	125,00
8	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Южному шоссе в районе ООТ «УВД»	190,00
9	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Жукова и ул. Фрунзе (вдоль автодороги по ул. Жукова и ул. Фрунзе, а также в районе ООТ «Соловушка» по ул. Жукова)	280,00
10	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Тополиной в районе ООТ «Школа №988»	90,00
11	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Автозаводскому шоссе в районе ООТ «КВД»	120,00
12	Пешеходные ограждения на Площади Свободы	80,00
13	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Родины и ул. Республиканской (вдоль автодороги по Родины и ул. Республиканской)	200,00
14	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Громовой в районе ООТ «Колхозный рынок»	150,00
15	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Ленина и ул. Ларина (вдоль автодороги по ул. Ленина и ул. Ларина)	385,00
16	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 50 лет Октября напротив школы №3	100,00
17	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 70 лет Октября ООТ «Студенческая»	130,00
18	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Автостроителей в районе ООТ «Школа №984»	100,00
19	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Дзержинского в районе ООТ «Школа искусств»	40,00
20	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Ленина в районе ООТ «Детский мир»	110,00
21	Пешеходные ограждения вдоль автодороги в районе пересечения ул. Гидротехническая - ул. Макарова и ул. Гидротехническая - ул. Дорофеева	350,00
22	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Полякова в районе ООТ «ул. Полякова»	125,00
23	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по бульвару Приморский в районе ООТ «б-р Буденного»	50,00
24	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Фрунзе и ул. Степана Разина (вдоль автодороги по ул. Фрунзе и ул. Степана Разина)	625,00
25	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по бульвару Приморский в районе ООТ «Стадион Торпедо»	100,00
26	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Юбилейная и ул. Фрунзе (вдоль автодороги по ул. Юбилейная и ул. Фрунзе)	520,00
27	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 70 лет Октября в районе ООТ «ул. 70 лет Октября»	145,00
28	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Дзержинского в районе ООТ «Лесопитомник»	150,00
29	Пешеходные ограждения на ул. Ворошилова в районе ООТ «10 квартал»	50,00
30	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Заставная, а районе ООТ «НТЦ ВАЗ»	200,00
31	Пешеходные ограждения на пересечении ул. К. Маркса - ул. Горького расположенные по ул. К. Маркса (вдоль автодороги по ул. К. Маркса в районе ООТ «Кинотеатр Буревестник»)	290,00
32	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Ворошилова в районе ООТ «Кафе Каскад»	100,00
33	Пешеходные ограждения не пересечении ул. Юбилейная и ул. Свердлова (вдоль автодороги по ул. Юбилейная и ул. Свердлова)	322,50
34	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 70 лет Октября в районе ООТ «Яриный бульвар»	155,00
35	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Революционная в районе ООТ «Универсам»	80,00
36	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Воскресенская в районе ООТ «Проектное управление ВАЗ»	100,00
37	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Фрунзе в районе ООТ «11 квартал»	62,50
38	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 40 лет Победы в районе ООТ «Медгородок»	100,00
39	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Л. Яшина в районе ООТ «Северо-Восточная»	100,00
40	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Московскому пр-ту в районе ООТ «ул. Дзержинского»	135,00
41	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. 70 лет Октября в районе ООТ «Кафе Встреча»	100,00
42	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Коммунистическая и ул. Механизаторов (вдоль автодороги по ул. Коммунистическая и ул. Механизаторов)	230,00
43	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по Московскому пр-ту в районе ООТ «Ленинский пр-т»	140,00
44	Пешеходные ограждения в районе пересечения ул. Мира и ул. Карбышева (вдоль автодороги по ул. Мира и ул. Карбышева)	315,00
45	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по пр-т Степана Разина в районе ООТ «4 квартал»	7,50
46	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Новозаводская в районе ООТ «Волгоцеммаш»	175,00
47	Пешеходные ограждения вдоль автодороги по ул. Дзержинского в районе ООТ «пр-т Степана Разина»	210,00

Итого: 8162,50



Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта»

Субсидии по отрасли транспорт на 2017 г.

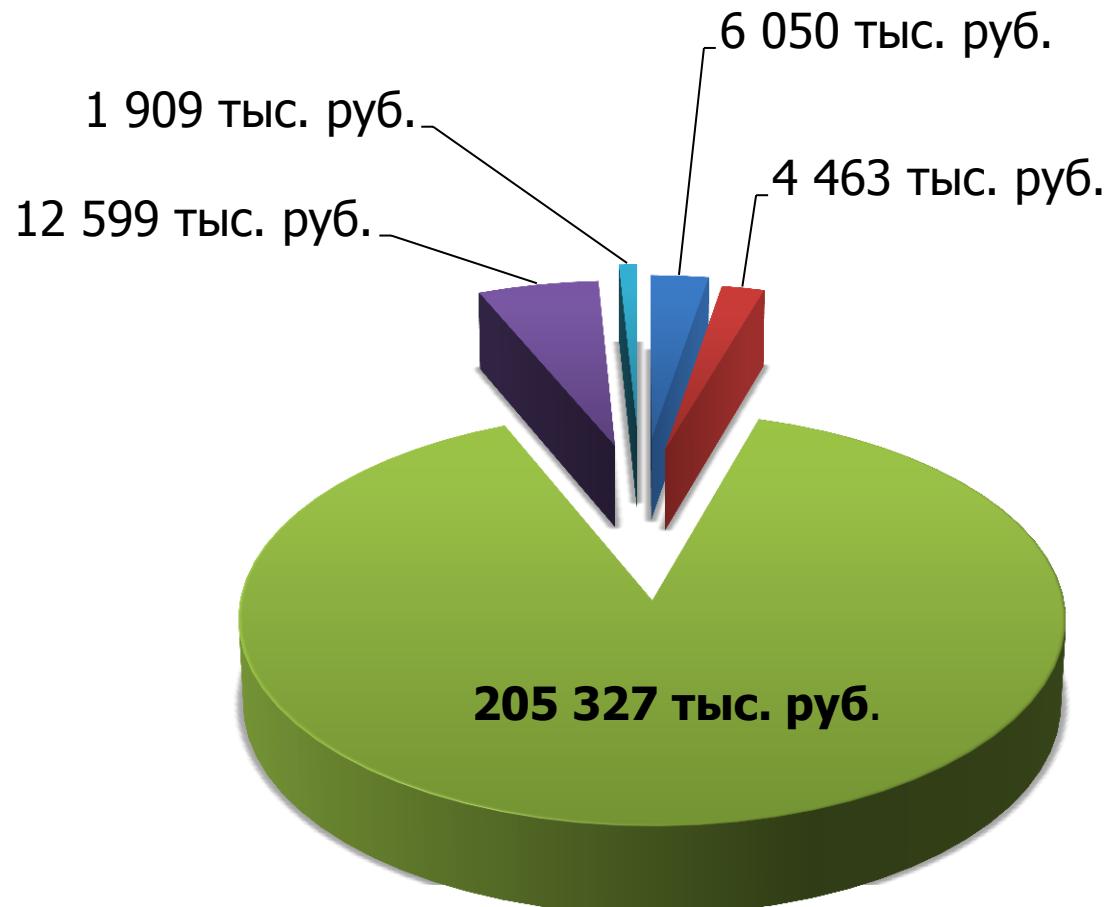

- Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы автомобильным транспортом
- Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан речным транспортом на городской паромной переправе "Микрорайон Шлюзовой – по
- Субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету
- Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по льготному регулируемому тарифу при оплате транспортными картами жителя городского округа Тольятти
- Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан речным транспортом на городской паромной переправе "Микрорайон Шлюзовой – по

План перевозки пассажиров по муниципальным предприятиям на 2017 год

МП «ТПАТП №3» – 5 772 863
МП «ТТУ» – 42 380

Заказные перевозки
МП «ТПАТП №3» – 188 900

Перевозки на
ПАО «АвтоВАЗ» и
ООО «Трансформатор»

Город
22 706 446


Дачи

МП «ТПАТП №3» – 178 868


МП «ТПАТП №3» – 17 347 826
МП «ТТУ» – 5 358 620

Всего в плане на 2017 г. перевести **28 889 457 пассажиров**

МП «ТПАТП №3»

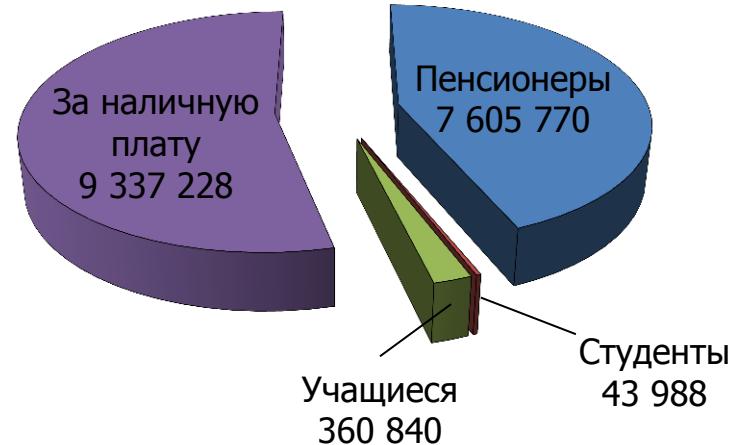

МП «ТТУ»

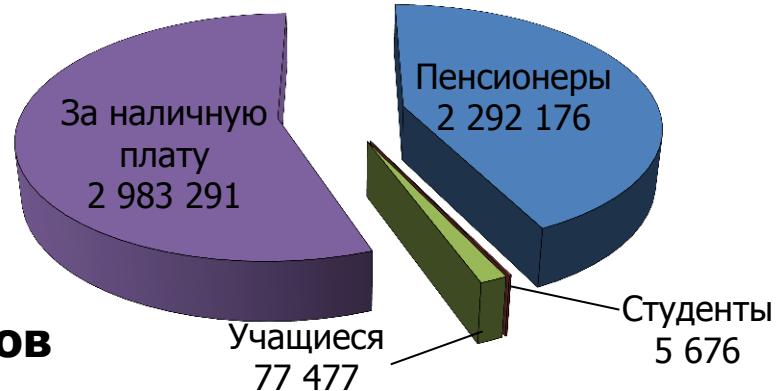

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3»

Основные показатели		
Предприятие осуществляет перевозки	Город	Дачи
	37 маршрутов	12 маршрутов
Протяженность маршрутов	1402,8 км	1011,34 км
Ежедневный выпуск на линию	316 единиц	29 единиц
Количество подвижных единиц	317	
Средний возраст подвижных единиц	6,9 лет	
Самортизировано	132 подвижные единицы	
Приобретение подвижного состава (с 2009 по 2017 г.)	240 единиц	
Потребность в обновлении подвижного состава	165 подвижных единиц	

Приобретение в 2015 году 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе в лизинг до 2020 г.

С ООО «НООТ» (г. Владимир) заключен МК на приобретение 60 низкопольных автобусов на сумму – **714 079,0** тыс. руб.

Стоимость одного автобуса с учётом лизинговых платежей – **11 901** тыс. руб.

Лизинговые платежи на 2017 год – **97 032,0** тыс. руб.



Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление»

Основные показатели	
Предприятие осуществляет перевозки	8 маршрутов
Протяженность маршрутов	144,8 км
Ежедневный выпуск на линию (максимальный)	43 подвижных единиц
Количество подвижного состава	80 единиц
Средний возраст троллейбусов	14,2 года
Самортизировано	55 подвижных единиц
Приобретение подвижного состава (за период с 2009 по 2017г)	31 единица
Потребность в обновлении подвижного состава	32 единицы


Приобретение в 2017 году на условиях софинансирования троллейбусов (лизинг до 2019 г. включительно)

С ПАО «ТрансФин-М» (г. Москва) заключен МК на приобретение **40** низкопольных троллейбусов на сумму – **377 495,614** тыс. руб.

Троллейбусы производителя ОАО «Управляющая компания холдинга Белкоммунмаш» (г. Минск), модель 321 имеют 26 посадочных мест (общая вместимость – 101 чел.) и оснащены оборудованием для маломобильных граждан (аппарат, многофункциональный электронно-цифровой информатор), оборудованием безопасности – камеры внутри салона и снаружи, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Стоимость одного троллейбуса с учётом лизинговых платежей – **9 437,4** тыс. руб.

Лизинговые платежи на 2017 год – **74 622,0** тыс. руб.



Маршрутная сеть городского округа Тольятти




Количество маршрутов, всего – **78**
По регулируемым тарифам – **45** (58%)
По нерегулируемым тарифам – **33** (42%)

№ п/п	Вид перевозок	Наименование перевозчика	№ маршрута	
1	По регулируемым тарифам	МП «ТПАТП №3»	Город: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 71, 72, 73, 76, 77, 84 Пасха, Радоница, Троица: 55, 62к, 66, 84к, 87 Сезонные: 25, 42д, 56, 252	
2		МП «ТТУ»	2, 4, 7, 13, 14, 18, 21, 57	
Итого по регулируемым тарифам:			45 маршрутов	
3	По нерегулируемым тарифам	ООО «Спринтер»	20, 94, 96, 108	
4		ООО «Экспресс-Сити»	93, 93к, 95, 115	
5		ООО «Тантал»	52, 114, 118, 131	
6		ООО «Тандем»	124, 142, 143, 149	
7		ООО «РТ-Запчасть»	116	
8		ООО «Империал-Авто»	134, 153 Сезонный: 129	
9		ООО «Альянс»	9, 136, 211 Сезонный: 201	
10		ООО «ТО-Автомобильная Компания»	117	
11		ООО «РОСВЭН»	91, 102, 126	
12		ООО «ГРАНД-АВТО»	99	
13		ООО «Зеленоглазое такси»	119, 127, 130, 132	
Итого по нерегулируемым тарифам:			33 маршрута	
Всего:			78 маршрутов	

Корректировки маршрутной сети городского округа Тольятти

Для обеспечения транспортной доступности для жителей 17а квартала и жилых массивов «Лесная слобода», «Царское село», расположенных по ул. 40 лет Победы (от Южного шоссе до ул. Дзержинского) с 01.09.2017 г. введен автобусный маршрут №22 «* ОП ул. Баныкина – ОП 14-й квартал».

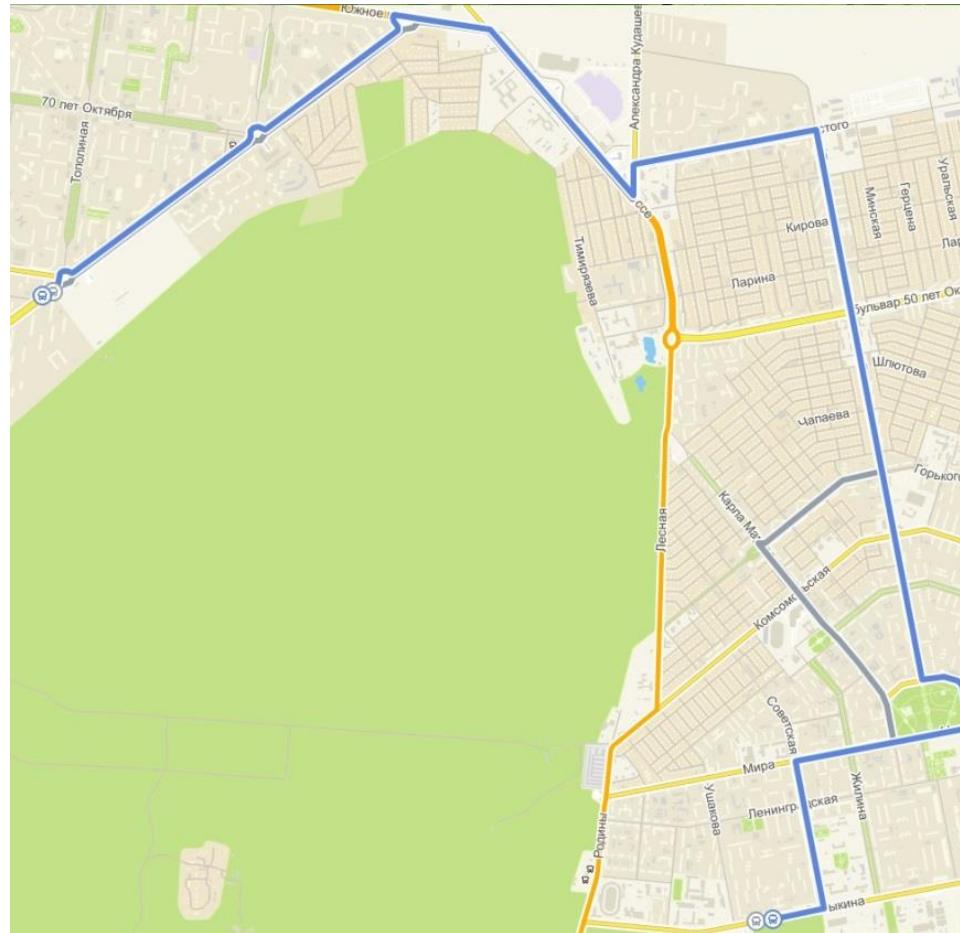

Корректировки маршрутной сети городского округа Тольятти

В расписание движения автобусного маршрута № 42д* «ОП ул. Есенина – ОП Микрорайон Нагорный – ОП Есенина» с 01.12.2017г. вносится изменение.


Время отправления от ОП «ул. Есенина»	Ориентировочное время прохождения ОП «Тубдиспансер»
6:15	6:40
7:15	7:40
8:15	8:40
10:00	10:25
12:00	12:25
14:00	14:25
16:00	16:25
17:30	17:55

С расписанием движения муниципальных маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Тольятти: Администрация г.о. Тольятти – Власть – Структура администрации – Департамент дорожного хозяйства и транспорта и далее выбрав вкладку [«Расписания работы пассажирского транспорта»](#).

Доступность проезда для льготной категории граждан

Не действуют социальные карты жителя Самарской области
33 маршрута (42,3%)


Со всеми льготами
45 маршрутов (57,7%)

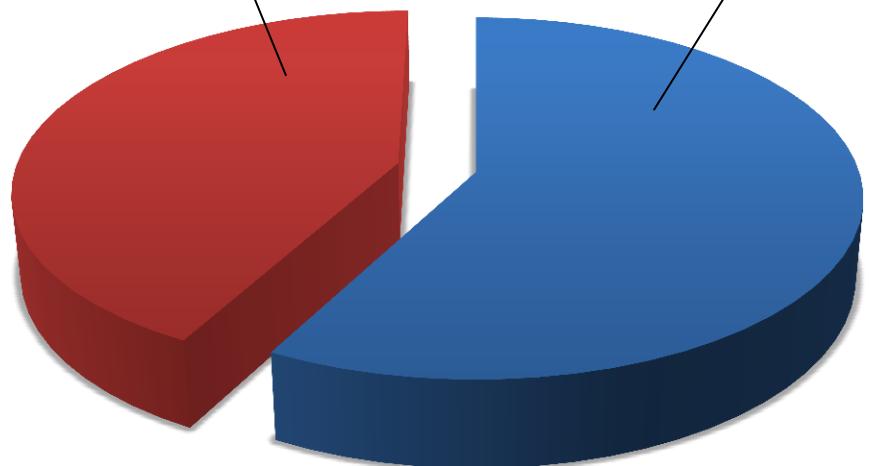

Количество маршрутов, всего **78** шт.


Не действуют социальные карты жителя Самарской области
415 (53,3%)

Со всеми льготами
363 (46,7%)

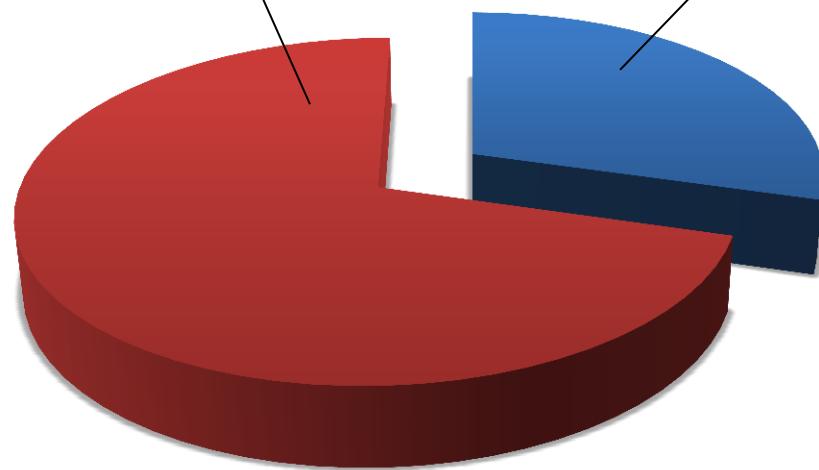

Количество единиц подвижного состава, всего **778** ед.

Схемы движения маршрутов регулярных перевозок на садово-дачные массивы

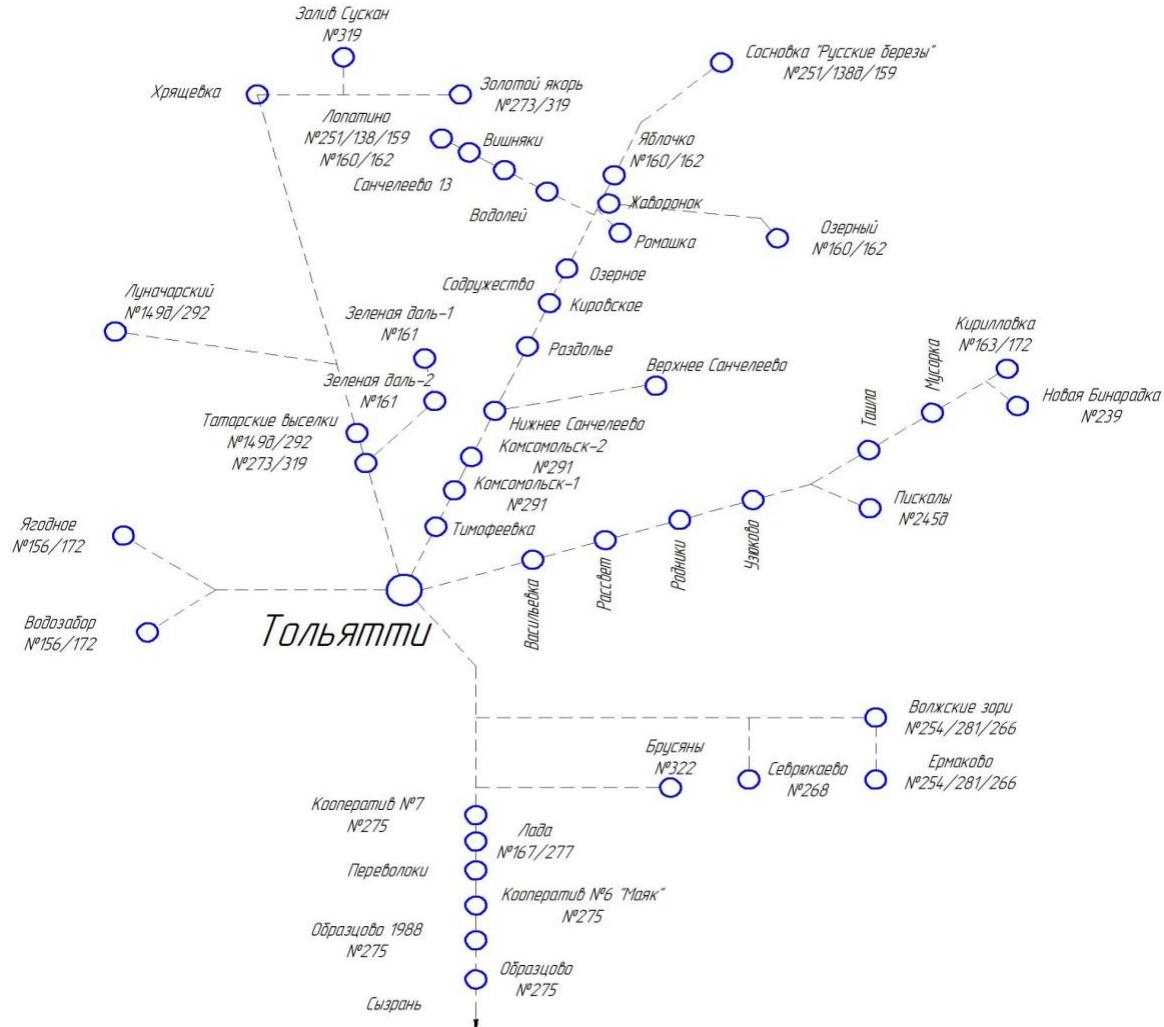

Перевозки пассажиров на садово-дачные массивы

Количество маршрутов	Сезонные	Межмуниц ипальные
	6	18
ИЗ НИХ: МП «ТПАТП №3»	4	12
Организации иной формы собственности	2	6
Количество автобусов	34	57
ИЗ НИХ: МП «ТПАТП №3»	14	30
Организации иной формы собственности	20	27

Действие транспортных карт

Сезонные	МП «ТПАТП №3»	Организации иной формы собственности	
	25, 42д, 56, 252	129, 201	
	Действуют все виды транспортных карт	Действуют транспортные карты учащегося и студента	
Межмуниципальные	149д/292, 160/162, 161, 163/172, 167/277, 245д, 251/138д/159, 254/281/266, 273/319, 275, 291, 319	156/172к, 239, 268, 322	202, 206
	Действуют социальные карты жителя Самарской области, с 2017 г. при наличии транспортной карты учащегося и справки с места учебы предоставляется льготная стоимость проезда в размере 50% от полной стоимости проезда		Действие транспортных карт не распространяется

Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети»

Виды работ

Аварийный ремонт дорог



Летнее содержание



Зимнее содержание



Общие сведения по содержанию автодорог

Район	Магистральные дороги и дороги частного сектора тыс. м ²	Площадки ООТ тыс. м ² (шт.)	Тротуары и подходы к ООТ тыс. м ²	Разделительные полосы и прилегающая территория тыс. м ²
Автозаводский	2 804,39	88,7 (354)	88,71	1 765,41
Центральный	1 942,35	34,4 (171)	88,58	699,48
Комсомольский	1 430,30	22,0 (117)	20,46	801,05
Всего:	6 177,04	145,1 (642)	197,8	3 265,94

СУММА КОНТРАКТА - **832 539 395 РУБ.**

СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ В Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ»

Устранение деформаций и повреждений

Район	Ремонт картами, м ²	Аварийный ремонт, м ²	Всего устранение деформаций, м ²
Автозаводский	14 105	6 633	20 738
Центральный	6 388	7 004	13 392
Комсомольский	7 360	3 033	10 393
Итого по городу:	27 853	16 670	44 523



Вывоз снега

за зимний период с 01.11.2016 г. по 31.03.2017 г.



Район	Объем, м ³
Автозаводский	16 000
Центральный	52 787
Комсомольский	18 681
Итого по городу:	87 468

Адреса санкционированных площадок для складирования снега:

Автозаводский район:

- ул. Борковская, севернее здания №50а;
- ул. Борковская, севернее здания №8.

Центральный район:

В районе пересечения Обводного шоссе и ул. Васильевской.

Комсомольский район:

- ул. Громовой, в районе озера АТП-3;
- Поволжское шоссе, 2 (второй) километр магистрали.

Выкашивание газонов на разделительных полосах



8 покосов за сезон на общей площади **3265,94** тыс. м²

Содержание остановочных павильонов

По состоянию на 01.11.2017 г. на балансе МКУ «ЦОДД ГОТ» состоит **579** павильонов остановок общественного транспорта.

В период с 01.01.2017 г. по 01.11.2017 г. силами сотрудников МКУ «ЦОДД ГОТ» были выполнены следующие виды работ по содержанию остановочных павильонов:

- восстановление – **1**;
- ремонт – **39**;
- помывка – **32**;
- демонтаж – **2**.



Нанесение дорожной разметки



**СУММА КОНТРАКТА – 19 711 435 РУБ.
РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

100%



Срезка грунта с разделительных полос

№ п/п	Наименование объекта	Протяженность участка выполненных работ, пог. м	Объем срезанного грунта, м ³	% выполнения
1	ул. Юбилейная	35200	1948	100
2	ул. Мира	2260	357	100
3	ул. Громовой			0
	Итого:	37460	2305	67%



Срезка грунта с разделительных полос по ул. Юбилейная




Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Чахеев А.М., т. 25-95-18;
- от ДДХИТ:
Скиба А.В., т. 54-44-33 (4990);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



Срезка грунта с разделительных полос по ул. Мира


Аукцион
(04.09.2017 г.)

Контракт от
19.09.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

Протяженность участка выполненных работ, пог.м	Объем срезанного грунта, м ³	Сроки исполнения
2260	357	13.10.2017 – 31.10.2017 г.




Фото объекта
«До»

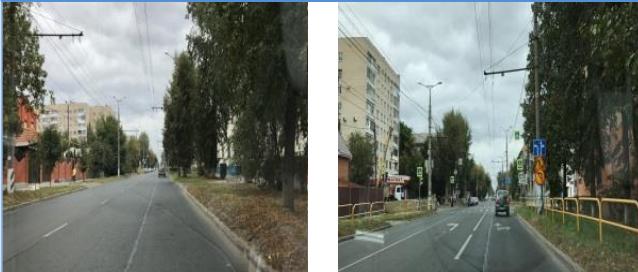

Ответственные:
- от подрядной организации:
Чахеев А.М., т. 25-95-18;
- от ДДХИТ:
Скиба А.В., т. 54-44-33 (4990);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»

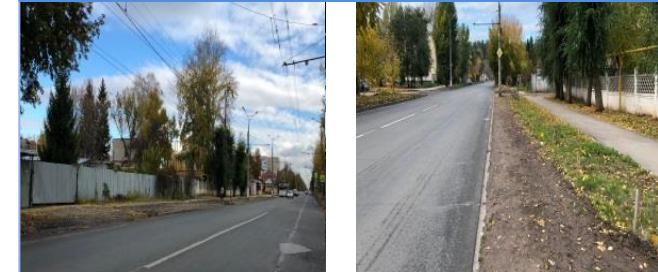

Срезка грунта с разделительных полос по ул. Громовой


Аукцион
(04.09.2017 г.)

Контракт от
19.09.2017 г.,
ООО
«Автодоринжиниринг»

Протяженность участка выполненных работ, пог.м	Объем срезанного грунта, м ³	Сроки исполнения
		25.10.2017 – 15.11.2017 г.




Фото объекта
«До»



Ответственные:
- от подрядной организации:
Чахеев А.М., т. 25-95-18;
- от ДДХИТ:
Скиба А.В., т. 54-44-33 (4990);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта
«После»



**БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕ!**
