Администрация
городского округа Тольятти

Отчет о выполнении Муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.»

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти

Развитие автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами

Повышение безопасности дорожного движения

Развитие городского пассажирского транспорта

Содержание улично-дорожной сети

Подпрограмма
«Модернизация и развитие дорог местного значения городского округа Тольятти

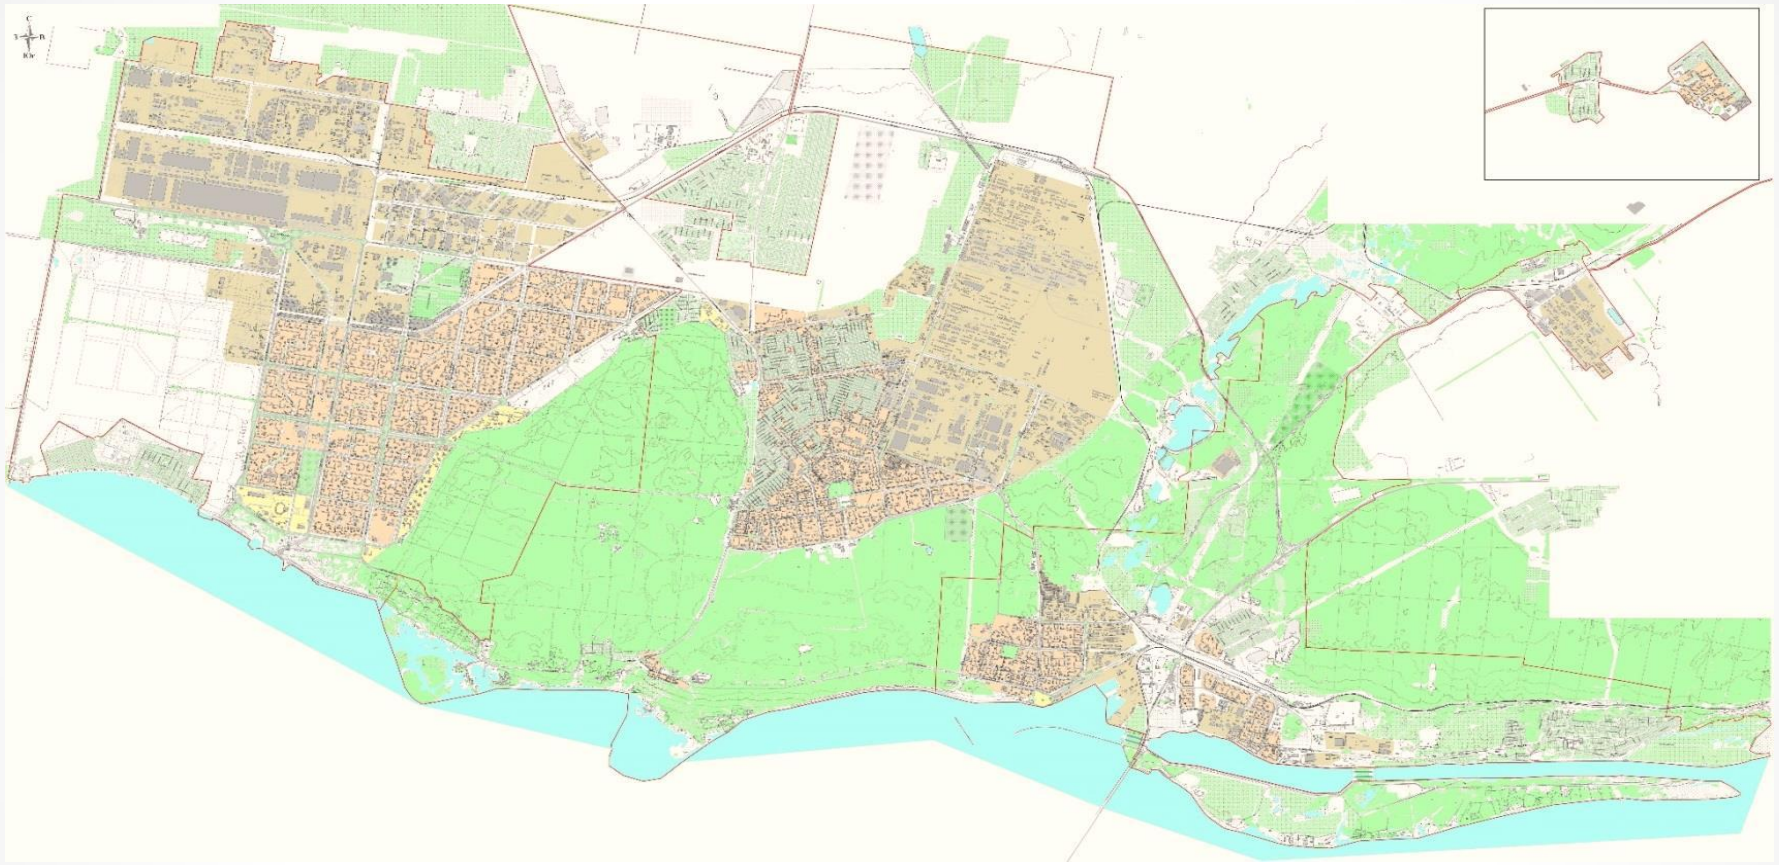

Сведения об улично-дорожной сети:

- протяженность, км - **749,4**;
- кол-во улиц, шт. - **514**;
- дорог на гарантии, шт. – **107**;
- в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии на текущий момент, % - **79,7**;
- по результатам ремонта дорог планируемое состояние к концу 2018 г., % - **81,4**.

План мероприятий, связанных с празднованием 50 летия производства первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти

Мероприятия	Срок исполнения	Источники финансирования, тыс. руб.			
		средства федерального бюджета	средства бюджета Самарской области	средства бюджета г.о. Тольятти	всего
Администрация городского округа Тольятти					
Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова	2019	77 520,0	3 264,0	816,0	81 600,0
	2020	247 665,0	10 428,0	2 607,0	260 700,0
Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной	2019	41 927,30	1 765,36	441,34	44 134,0
Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в г.о. Тольятти	2019	313 050,65	13 181,08	3 295,27	329 527,0
	2020	432 428,60	18 207,52	4 551,88	455 188,0
*Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения	2020	48 782,50	2 054,00	513,50	51 350,0
Итого по ДДХиТ:					**1 222 499,0**

Строительство и реконструкция дорог

Дорожная карта строительства и реконструкции дорог

№ п/п	Объект	Проект	Положительное заключение экспертизы	Проект планировки территории	Проект межевания территории	Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Разрешение на строительство
1	Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной						
2	Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта						
3	Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковской						
4	Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. Офицерской от Южного шоссе до ул. Ворошилова						

Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов

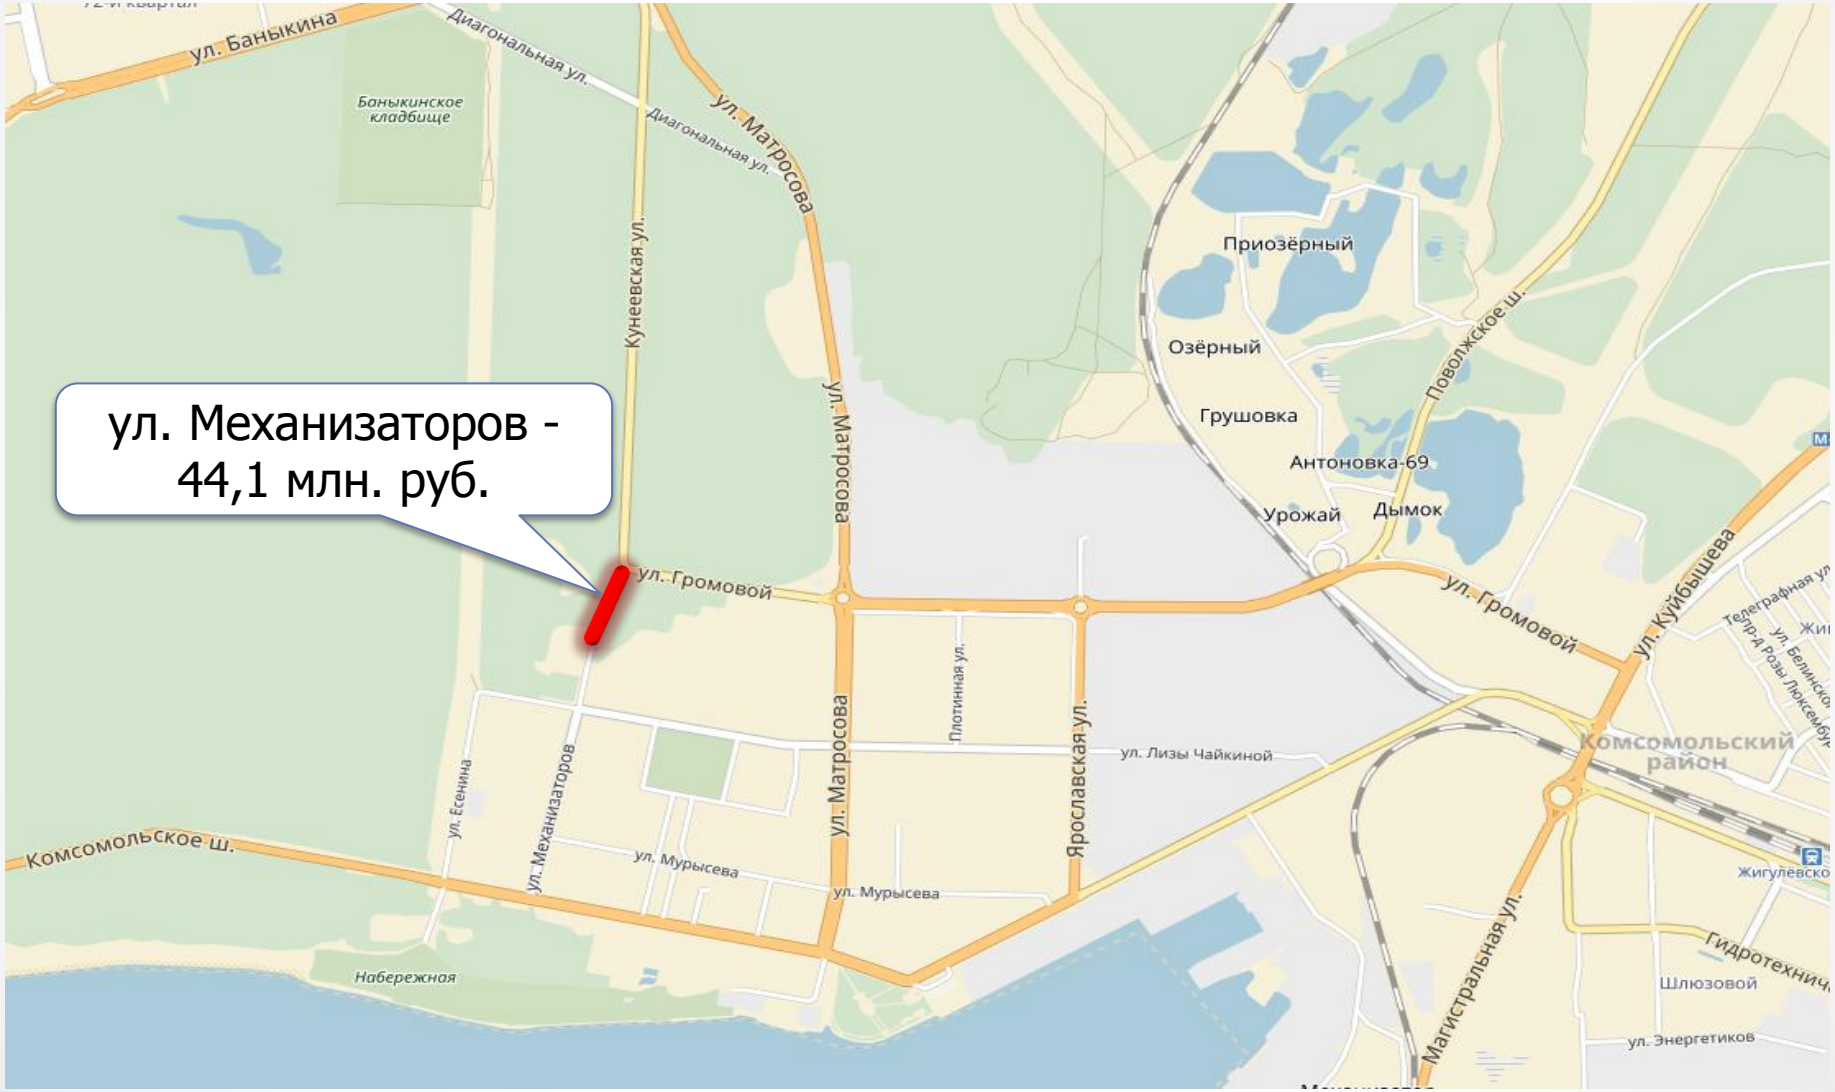

Строительство автомобильных дорог западнее Московского проспекта

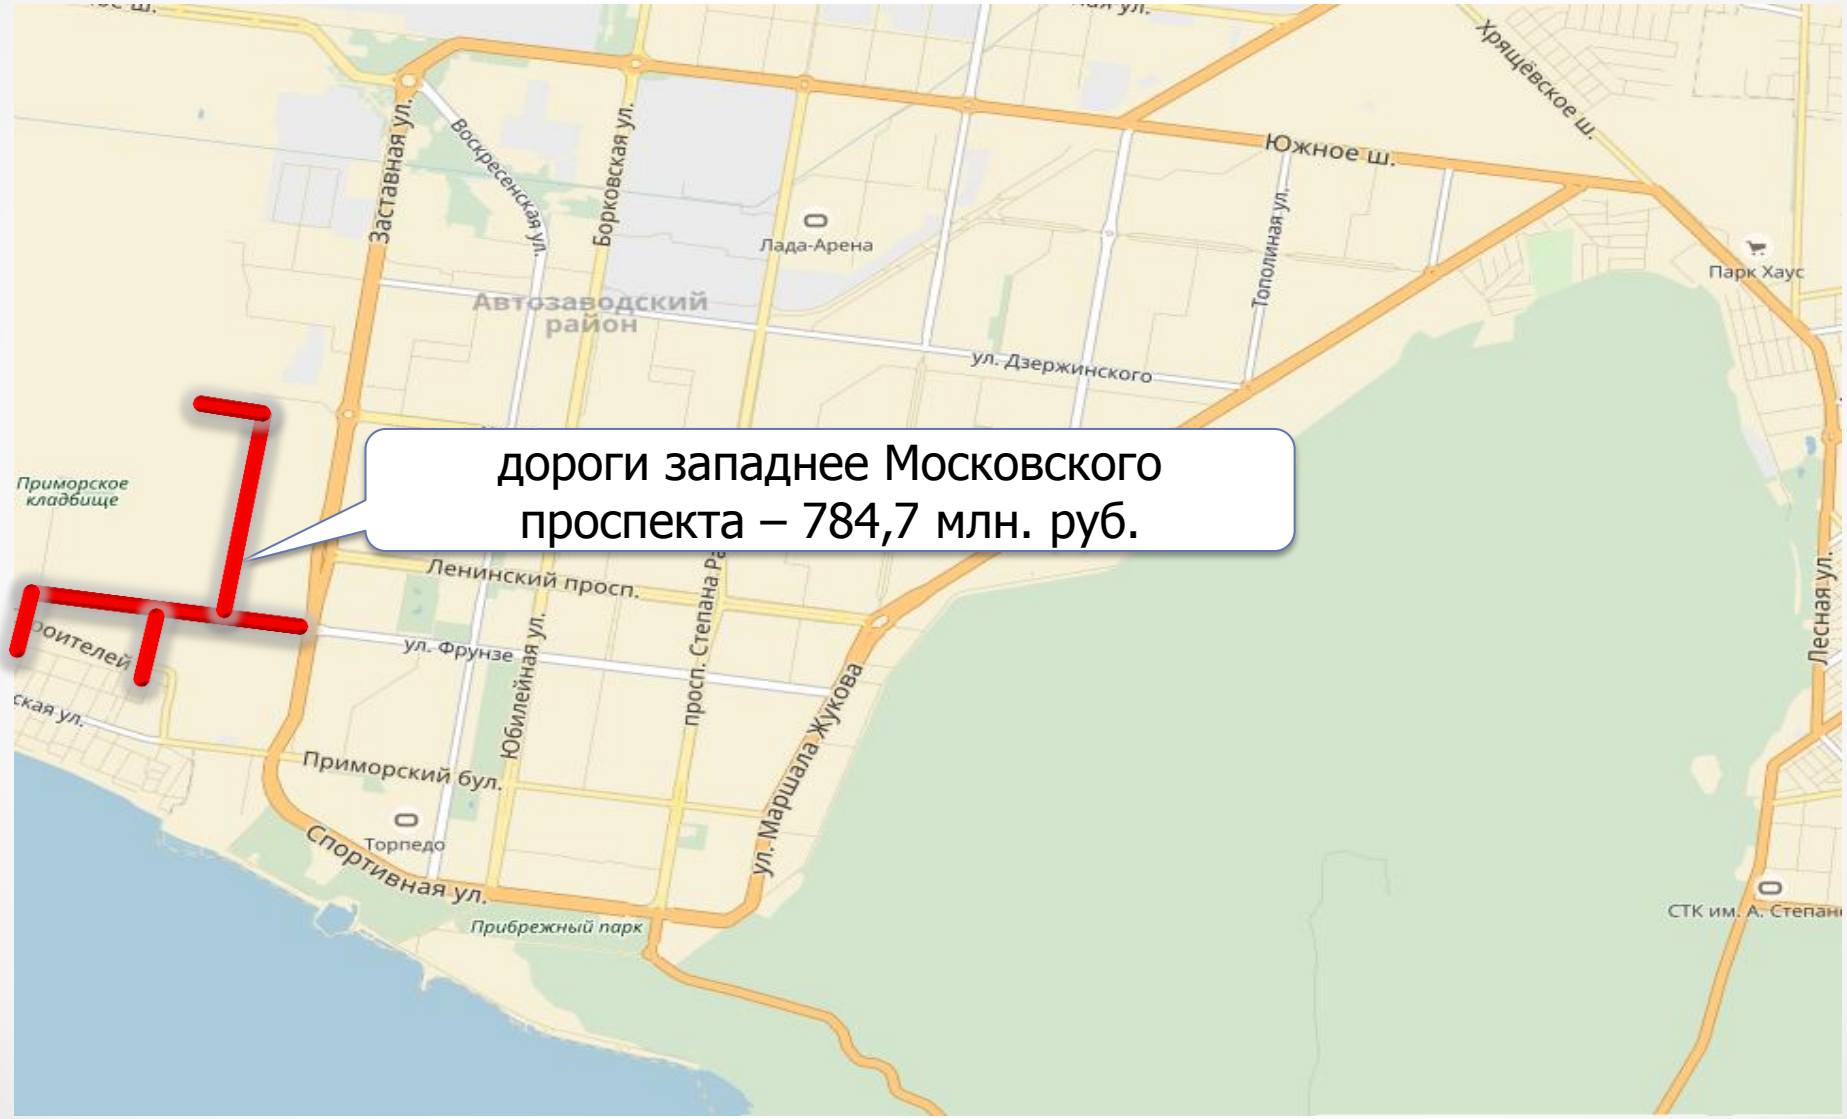

Строительство автомобильной дороги по ул. Офицерская

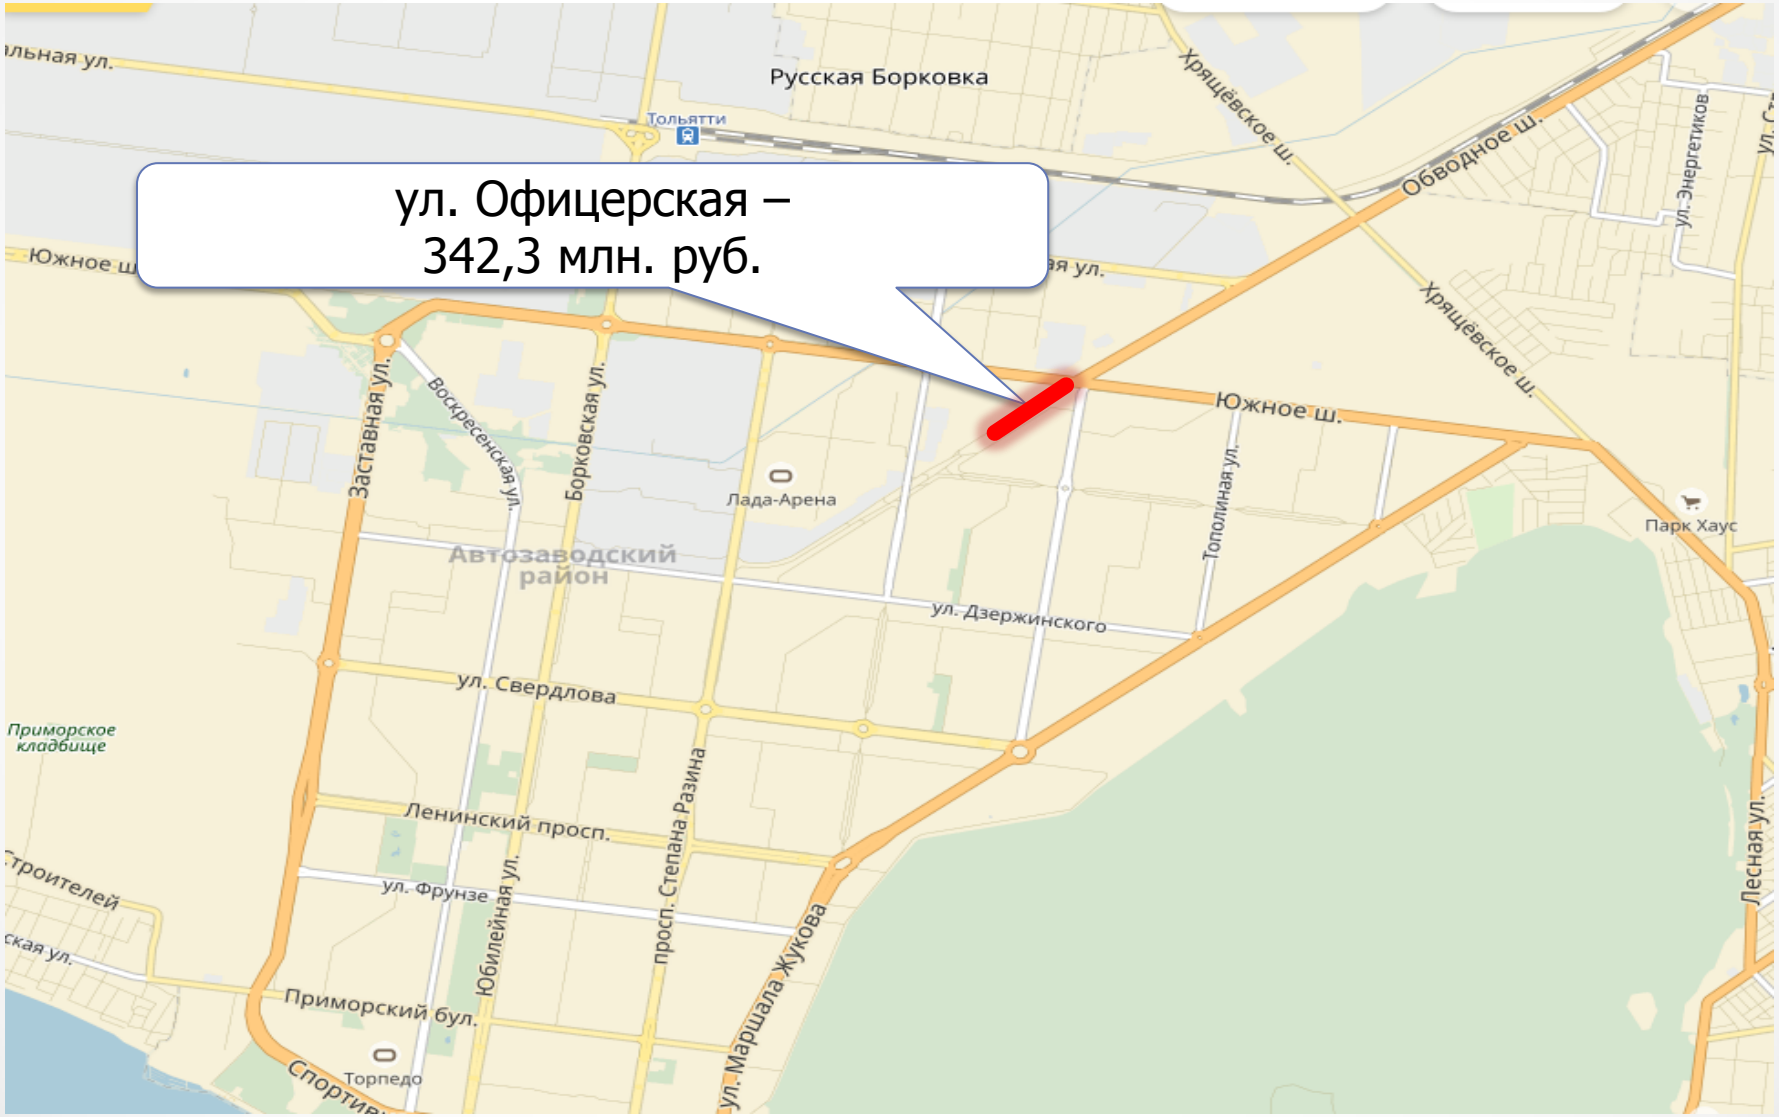

Устройство дополнительных правоповоротных полос движения

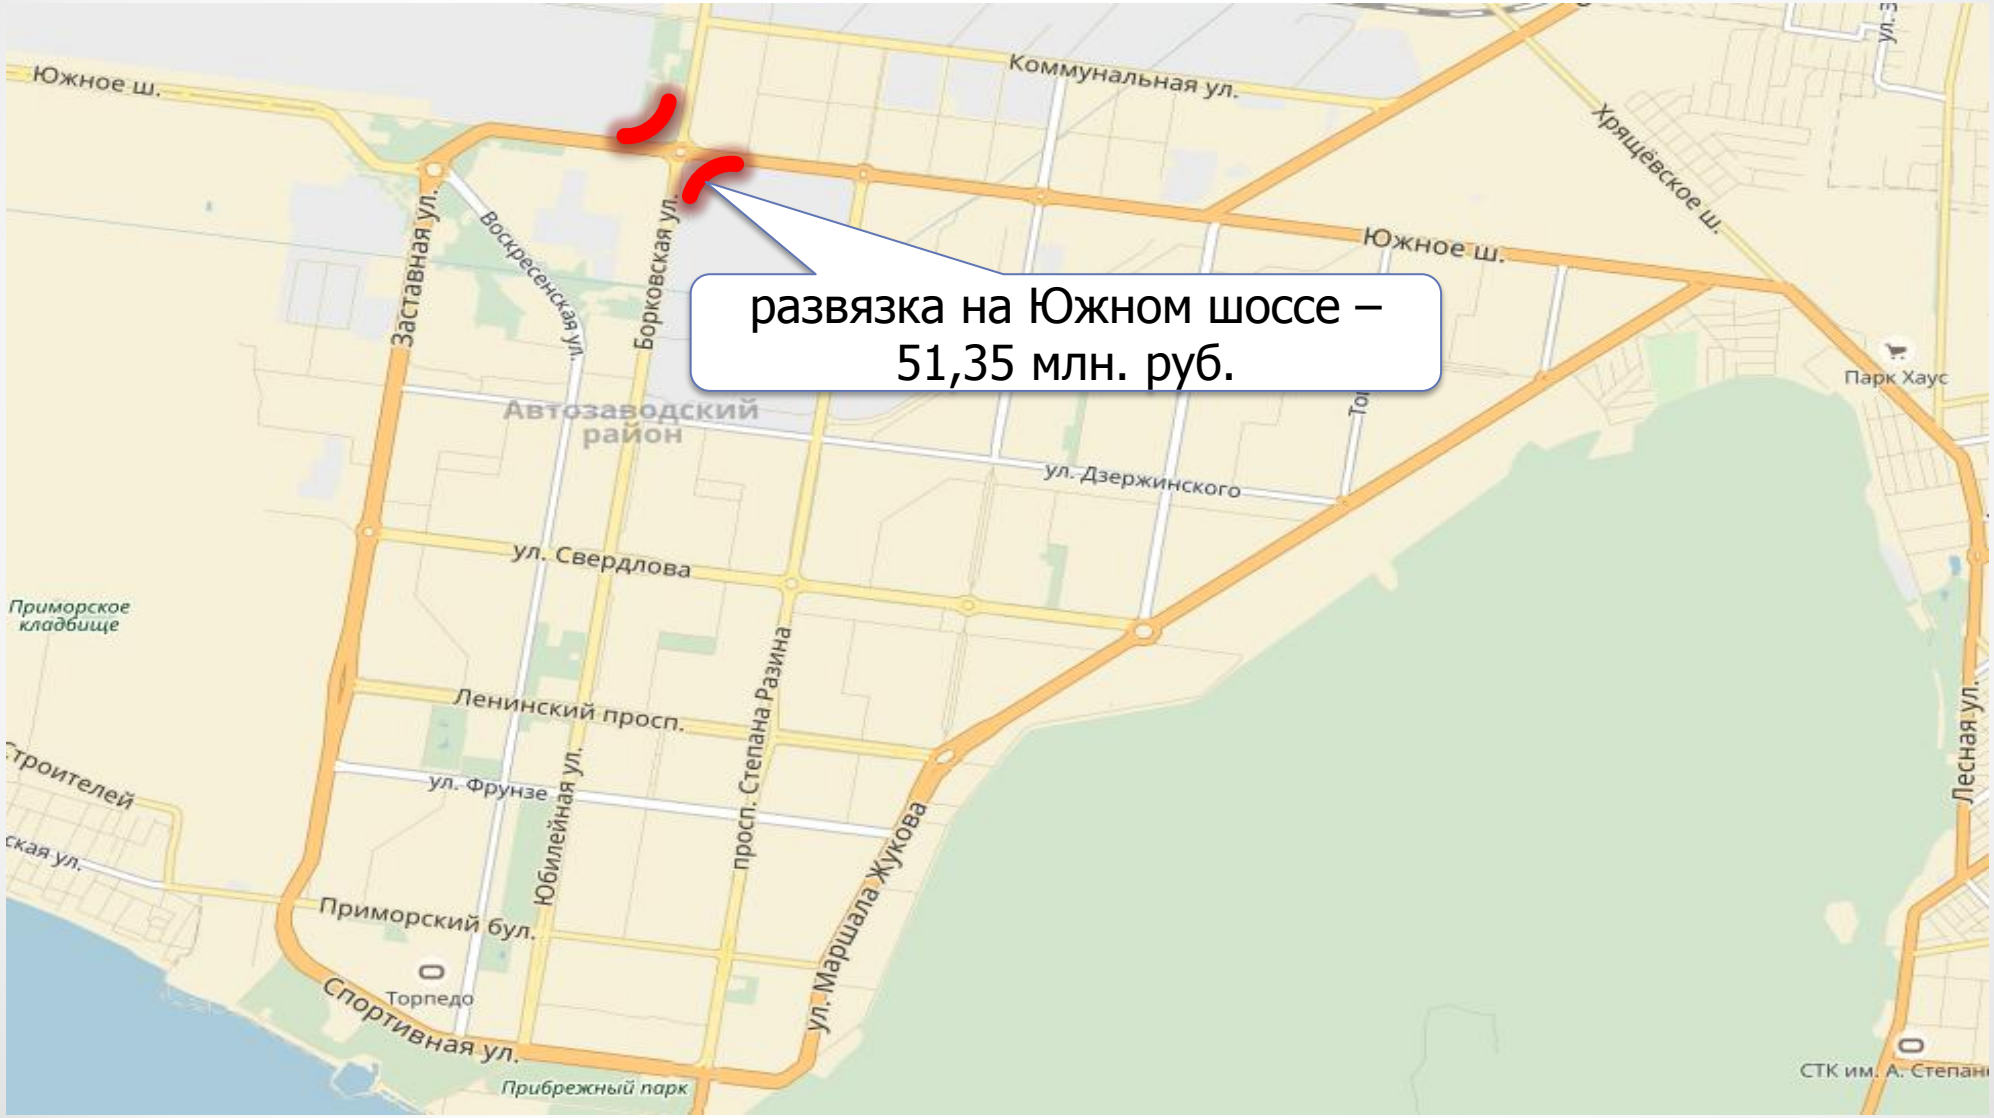

Проектирование капитального ремонта, ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания.

Контракт от 14.11.2017 г., ООО «М - Строй »

СУММА КОНТРАКТА - **14 999 000 РУБ.**

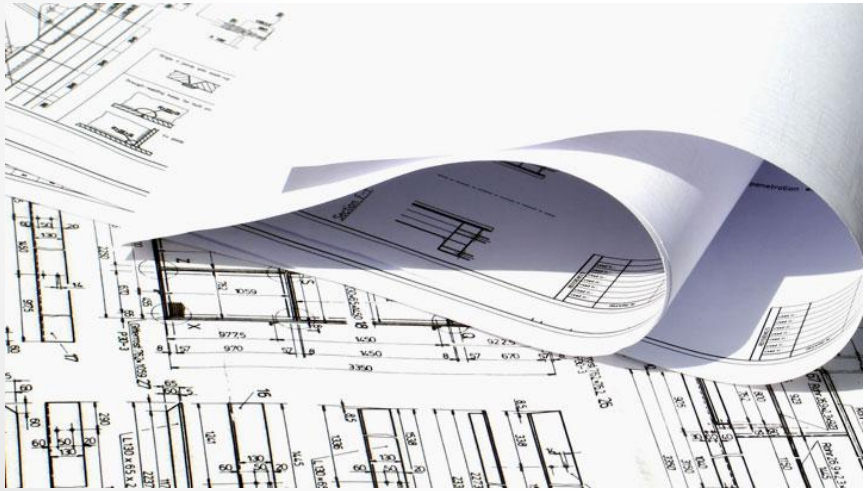

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	*автодорога по ул. Ворошилова от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта.*	
2	*проезд Борковский*	
3	*автодорога по ул. Автостроителей.*	
4	*автодорога по ул. Революционная от ул. Дзержинского до проспекта Ленинский.*	
5	*автодорога по ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до ул. Ворошилова.*	
6	*автодорога ул. Юбилейная от ул. Свердлова до ул. Дзержинского.*	
7	*автодорога по ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Полякова включая пересечение автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерская.*	
8	*автодорога по ул. Северная.*	
9	*автодорога по ул. Полякова.*	
10	*автодорога по ул. Тополиная.*	
11	*автодорога по ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до ул. 40 лет Победы.*	
12	*автодорога по ул. Индустриальная.*	
13	*автодорога по б-р. Ленина (вдоль Краеведческого музея)*	
14	*автодорога по Автозаводскому шоссе.*	
15	*автодорога по ул. Мира от ул. Родины до ул. Победы.*	
16	*автодорога по ул. Баныкина от ул. Голосова до ул. Родины.*	
17	*автодорога по ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда.*	
18	*автодорога по ул. Нижегородская от Майского проезда до ГСК "Полина"*	
19	*автодорога по ул. Гидротехническая.*	
20	*автодорога по ул. Механизаторов*	

Проектирование капитального ремонта, ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания.

Контракт от 14.11.2017 г., ООО «М - Строй »

СУММА КОНТРАКТА - **14 999 000 РУБ.**

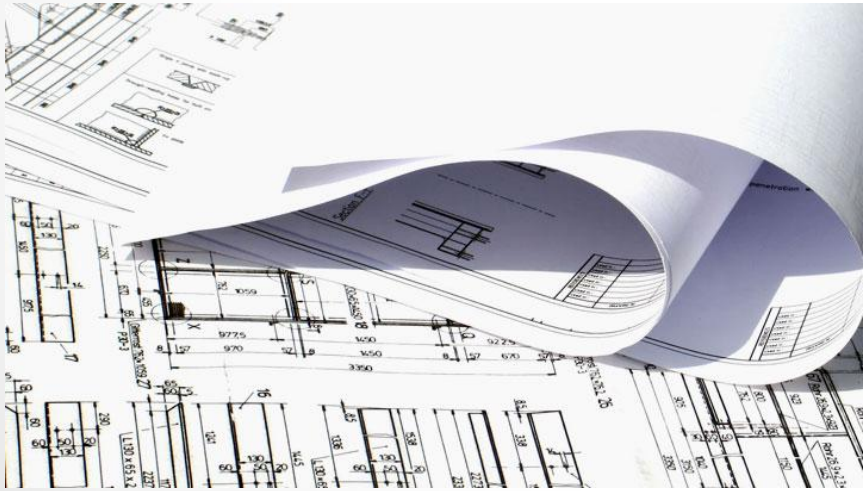

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
21	*автодорога по ул.Нижнегородская от ул. Громовой до ул. Куйбышева*	
22	*автодорога по ул. Ровная (дорога, проходящая к УР 65/16 от ул. Железнодорожной).*	
23	*Подъездная дорога к детскому саду "Олимпия".*	
24	*автодорога по б-ру Островского.*	
25	*автодорога по ул.Тюленина*	
26	*автодорога по ул. Зеленая*	
27	*автодорога по ул. Энергетиков.*	
28	*автодорога по ул. Менделеева.*	
29	*автодорога по ул. Учительская.*	
30	*автодорога по переулку Лобачевского.*	
31	*автодорога по ул. Грибоедова.*	
32	*автодорога по переулку 1-й Горный.*	
33	*автодорога по проезду Тенистый.*	
34	*автодорога по ул. Коммунистическая от ул. Нижегородская до ул. Куйбышева.*	
35	*автодорога от ул. Никонова до границы шлюза № 23-24*	
36	*автодорога от ул. Академика Вавилова (от дома ул. Скрябина, 13) к ул. Пескалинская*	
37	*Обводная дорога в МКР «Прибрежный» (от Коммунистической до нового участка)*	
38	*Автодорога к троллейбусному депо №3*	
39	*автодорога от ул. Громовой к проходной ООО "ТЗПО"*	
40	*автодорога от ул. Громовой до здания "Фабрика качества"*	
	Итого выполнено:	

Проектирование капитального ремонта, ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания.

Контракт от 08.05.2018 г., ООО «М - Строй »

СУММА КОНТРАКТА - **5 499 000 РУБ.**

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	*автодорога по ул. Победы*	
2	*автодорога по ул. Гидротехническая*	
3	*автодорога по ул. Фрунзе*	
4	*автодорога по ул. Ново-Садовая*	
5	*автодорога по ул. Пескалинская*	
	Итого выполнено:	

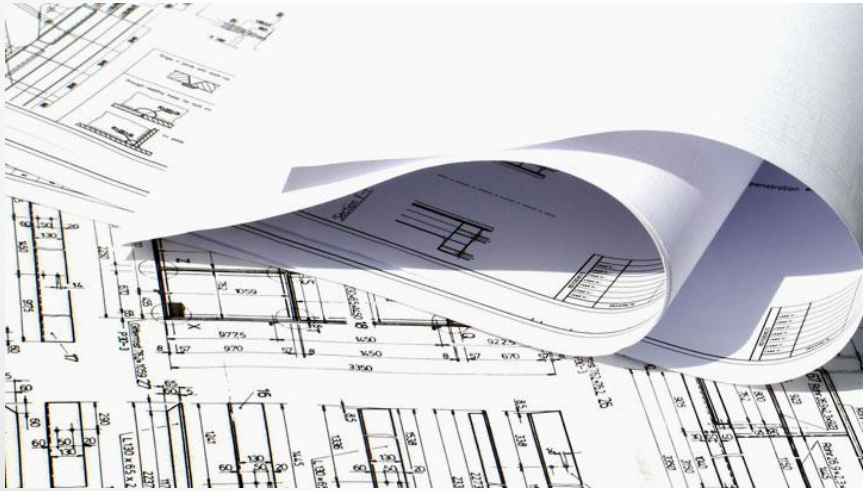

Схема ремонта автодорог в Автозаводском районе

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ, тыс. руб.	Протяженность, км	Площадь, тыс.м^2
МК 0842200002118000028_259977 от 16 апреля 2018 г.				
1	ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы.	158 416,31	1,9	70,28
2	Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы.	146 924,63	1,9	67,65
3	ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта.	55 851,23	0,5	25,95
4	бульвар Здоровья от ул. Свердлова до Ленинского проспекта.	33 530,96	1,7	13,76
	Итого:	**394 723,14**	**6**	**177,64**

Ремонт автомобильной дороги по ул. Свердлова (от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	90
2	Ямочный ремонт	51
3	Замена бортового камня, п.м	0
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Ремонт автомобильной дороги по Ленинскому проспекту (от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	7
2	Ямочный ремонт	0
3	Замена бортового камня, п.м	0
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- **от подрядной организации:**
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- **от ДДХиТ:**
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- **от районной администрации:**
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- **от общественного совета:**
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Ремонт автомобильной дороги по бульвару Здоровья (от ул. Свердлова до проспекта Ленинский)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	98
2	Ямочный ремонт	87
3	Замена бортового камня, п.м	0
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Ремонт автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова (от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	99
2	Ямочный ремонт	74
3	Замена бортового камня, п.м	24
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Котов А.В., т. 54-44-33 (4986);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Схема ремонта автодорог в Центральном районе

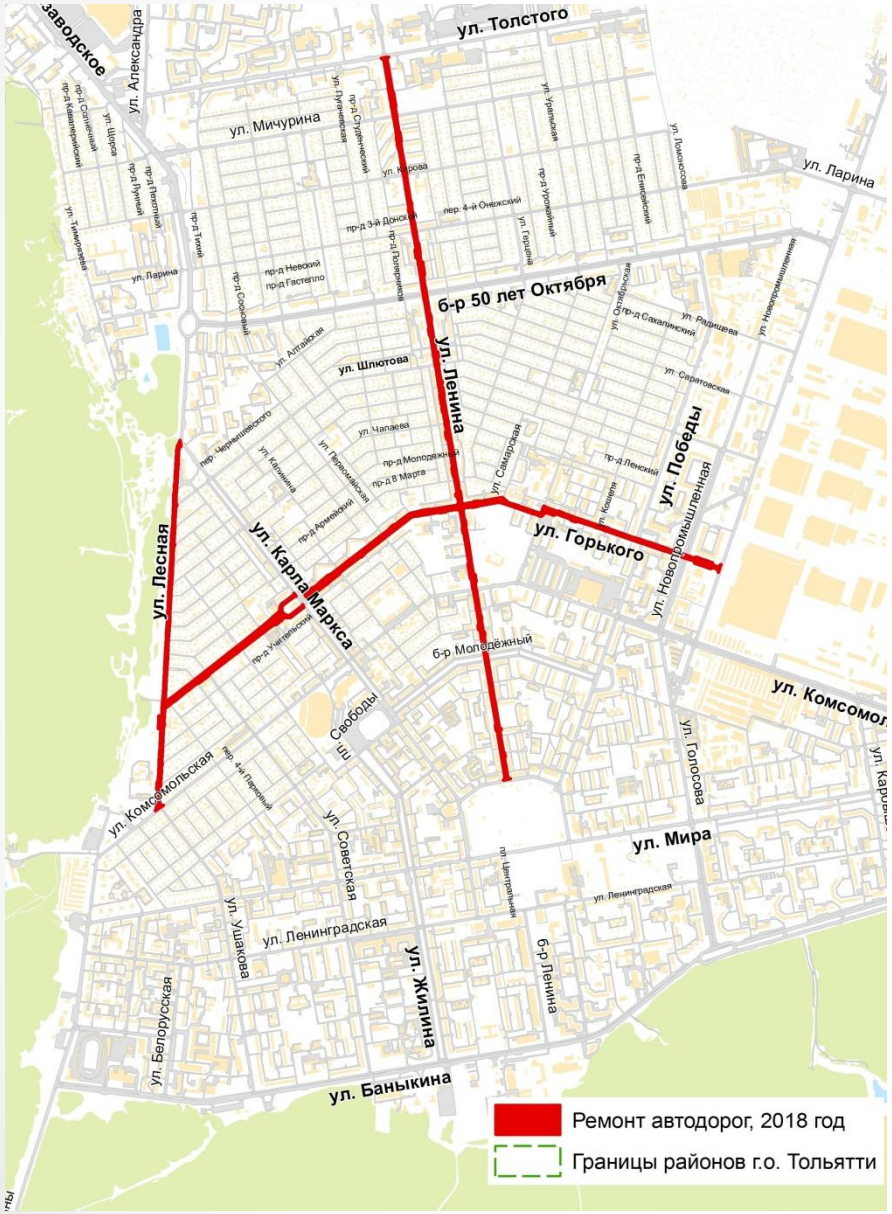

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог и отсыпке асфальтогранулятом

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость работ, тыс. руб.	Протяженность, км	Площадь, тыс.м^2
МК 0842200002118000028_259977 от 16 апреля 2018 г.				
1	ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Тольстого	136 928,56	3,36	46,00
2	ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская	31 885,06	1,5	14,55
3	ул. М. Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная	127 243,47	2,8	51,50
	Итого:	**296 057,10**	**7,66**	**69,64**

Ремонт автомобильной дороги по ул. Максима Горького (от ул. Новозаводская до ул. Лесная)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Ямочный ремонт	0
3	Замена бортового камня, п.м	0
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.10.2018 г.)

Фото объекта «До»

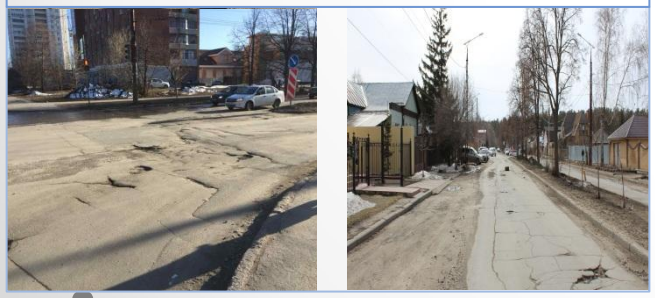

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Толстого)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	87
2	Ямочный ремонт	81
3	Замена бортового камня	43
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	0
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.10.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

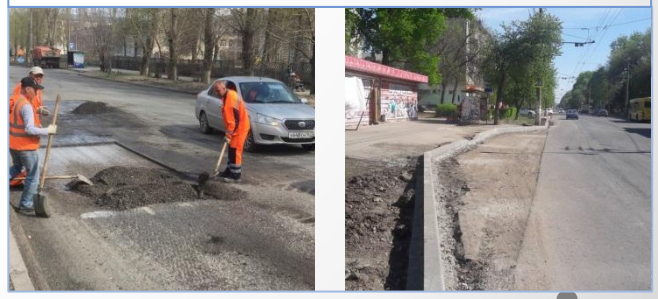

Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная (от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская)

Аукцион (02.04.2018 г.)

Контракт от 16.04.2018 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Ямочный ремонт	100
3	Замена бортового камня, п.м	68
4	Устройство покрытия проезжей части (ЩМА-20)	100
5	Разметка	0

Сдача объекта (30.10.2018 г.)



Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Титов Д.Г., т. 8-937-236-93-80;
- от ДДХиТ:
Савельева О.Е., т. 54-47-94 (3747);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Ремонт внутриквартальных дорог Автозаводский район

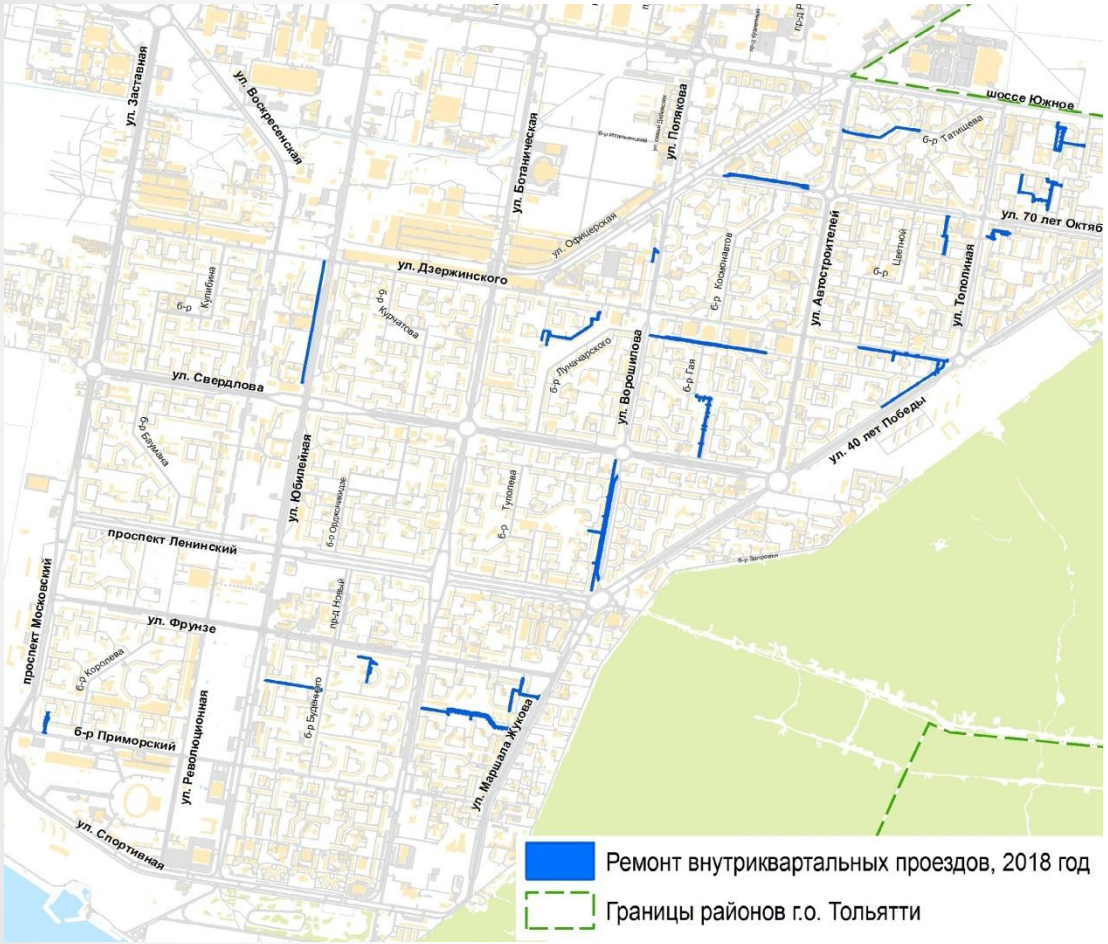

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	Пр-т Московский, 63.Ремонт дороги с заменой бортового камня, ремонт тротуара и подходов к подъездам.
2	Тротуар от бульвара Буденного до ул. Юбилейная вдоль Буденного, 6, Юбилейная, 39, 41.
3	ул. Фрунзе, 17 дорога и тротуар между домом и д/с №97 (ул. Фрунзе, 19).
4	Проезжая часть и тротуар м/заезд ул. Ворошилова.
5	Проезд вдоль ж/д № 2, 4, 6 по бульвару Луначарского .
6	Проезд пр-т Степана Разина, 67, 71(тротуары и подходы к подъездам Степана Разина, 71).
7	Тротуар к соц.приюту для детей "Дельфин" от ул. Жукова к Жукова, 20.
8	Тротуар бульвар Гая сквер от ул. Свердлова до Гая, 14 (демонтаж плит ПБ устройство тротуара из асфальтобетона с БР 100*20*8)
9	Сквозной проезд от м/з с ул. Ворошилова до Дзержинского, 17А.
10	Периметровый тротуар ул. Дзержинского с переходом на тротуар по ул. 40 лет Победы вдоль дома № 60 до дома № 76 по ул. 40 лет Победы, въезды с ул. Дзержинского.
11	Тротуар вдоль ул. Ворошилова в районе дома №2 по ул. Ворошилова.
12	Въезд с ул.70 лет Октября вдоль дома №33а ул.70 лет Октября к дому №30 ул. Тополиная.
13	ул. Тополиная, 25, ул.70 лет Октября, 29 .
14	М/з по ул.70 лет Октября.
15	бульвар Татищева (въезд с ул. Автостроителей до дома №16 по бульвару Татищева).
16	От торца дома №17 по Тополиной вдоль 70 лет Октября, 22 до выезда на бульвар Рябиновый.
17	Южное шоссе, 37, 39.
18	Тротуар по периметру со стороны ул. Юбилейной.

Пр-т Московский, 63. Ремонт дороги с заменой борт.камня, ремонт тротуара и подходов к подъездам.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт колодцев	0
7	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

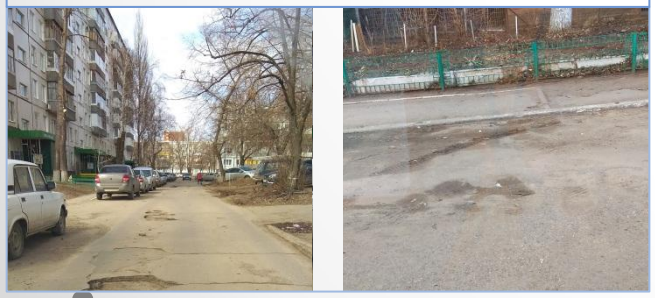

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Тротуар от б-ра Буденного до ул. Юбилейная вдоль Буденного,6, Юбилейная, 39, 41

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия тротуаров	0
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
4	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

ул. Фрунзе, 17 дорога и тротуар между домом и д/с №97 (ул. Фрунзе, 19)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройствопокрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

0%

0,00

% выполнения

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Проезжая часть и тротуар м/заезд ул. Ворошилова

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт колодцев	0
7	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);**-**
от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Проезд вдоль ж/д № 2, 4, 6 по бульвару Луначарского

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
	Ремонт колодцев	0
	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

0%



Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Проезд пр-т Ст.Разина, 67, 71(тротуары и подходы к подъездам Ст.Разина, 71)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Тротуар к соц.приюту для детей\"Дельфин" от ул. Жукова к Жукова, 20

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Тротуар бульвар Гая сквер от ул. Свердлова до Гая, 14.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж плит ПБ	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Сквозной проезд от м/з с ул. Ворошилова до Дзержинского, 17А.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	100
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

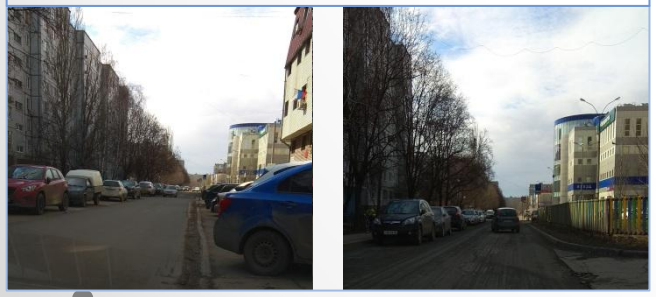

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Периметровый тротуар ул. Дзержинского с переходом на тротуар по ул. 40 лет Победы вдоль дома № 60 до дома № 76 по ул. 40 лет Победы, въезды с ул. Дзержинского

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Тротуар вдоль ул. Ворошилова в районе дома №2 по ул. Ворошилова.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Въезд с ул.70 лет Октября вдоль дома №33а ул.70 лет Октября к дому №30 ул. Тополиная.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

ул. Тополиная, 25, ул.70 лет Октября, 29

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт колодцев	0
7	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

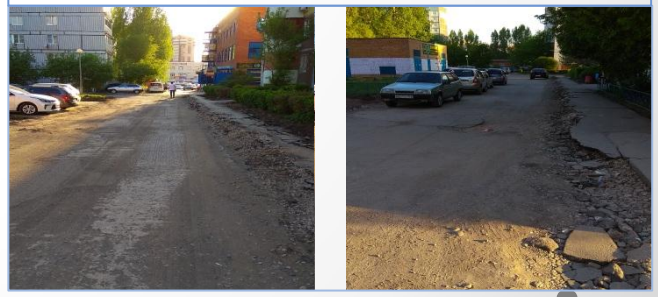

Автозаводский район

М/з по ул.70 лет Октября

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	100
5	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Б-р Татищева (въезд с ул. Автостроителей до дома №16по б-ру Татищева)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Ремонт колодцев	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

От торца дома №17 по Тополиной вдоль 70 лет Октября,22 до выезда на б-р Рябиновый.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия тротуаров	0
2	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
3	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Южное шоссе, 37, 39.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия проездов	0
3	Устройство покрытия тротуаров	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	0
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0
6	Ремонт колодцев	0
7	Ремонт ливневок	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Автозаводский район

Тротуар по периметру со стороны ул. Юбилейной

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	0
2	Устройство покрытия тротуаров	0
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Ильченко К.В., т. 54-44-33 (3734);
- от районной администрации:
Хвостов Ю.М., т. 54-31-26;
- от общественного совета:
Карагин Н.М., т. 8-927-891-91-61

Фото объекта «После»

Ремонт внутриквартальных дорог
Центральный район

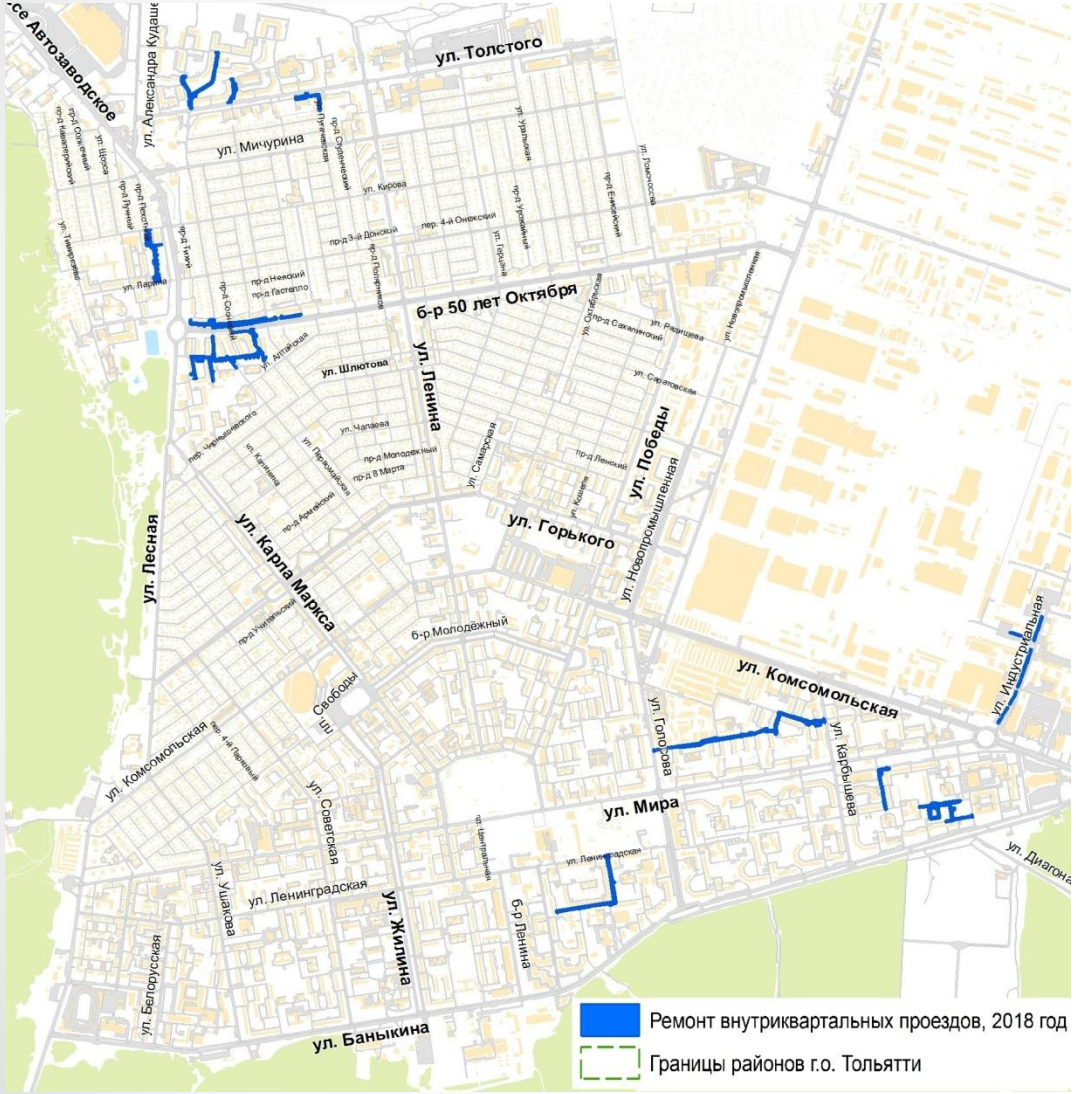

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	71кв проезд вдоль гимназии №9,д,№28 по ул. Баныкина до ул. Ленинградской.
2	27кв внутриквартальный проезд от ул. Голосова вдоль дома № 20 до ул. Карбышева между домами №3 и №9.
3	кв.73, проезд вдоль дс №153 Олеся до дома №125 по ул. Мира, мимо домов №№64,66,68 по ул. Баныкина.
4	кв.73, тротуар вдоль домов №115,117 по ул. Мира.
5	кв.100, проезд от д. 36 по ул.Лесной вдоль д.1,3,5,7 по б-ру 50 лет Октября до д. №№25,27 по б-ру 50 лет Октября.
6	кв. 143, проезд от ул. Ларина вдоль д. №43 по Автозаводскому шоссе, д. №3Б по ул. Кирова до ул. Кирова
7	кв.120,121,122, проезд, тротуар вдоль 50 лет Октября от д.№2 до д.№10а.
8	тротуар вдоль ул. Индустриальной.
9	3 мкр, внутриквартальный проезд от ул. Толстого вдоль дома №20 по ул. Толстого до магазина "Северный"
10	3 мкр., заезд с ул. Толстого между домами №10 и №12, вдоль домов №№116,118,120 по ул. Кудашева
11	кв.150, дублёр по ул. Толстого от д. №19 до Сбербанка

Центральный район

71кв проезд вдоль гимназии №9, д, №28 по ул. Баныкина до ул. Ленинградской

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	
6	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О. т.54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

27кв внутриквартальный проезд от ул. Голосова вдоль дома № 20 до ул. Карбышева между домами № 3 и № 9.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	
4	Ремонт колодцев.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв.73, проезд вдоль дс №153 Олеся до дома №125 по ул. Мира, мимо домов №№64,66,68 по ул. Баныкина.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия тротуаров	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
5	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв.73, тротуар вдоль домов №115,117 по ул. Мира.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж плит ПБ	
2	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	
5	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297)
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв.100, проезд от д. 36 по ул. Лесной вдоль д.1,3,5,7 по б-ру 50 лет Октября до д. №№25,27 по б-ру 50 лет Октября.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	
6	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв. 143, проезд от ул. Ларина вдоль д. №43 по Автозаводскому шоссе, д. №3Б по ул. Кирова до ул. Кирова.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	80
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	100
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	100
6	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О.,. т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв.120,121,122, проезд, тротуар вдоль 50 лет Октября от д.№2 до д.№10а.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	87
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	42

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

32 %

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

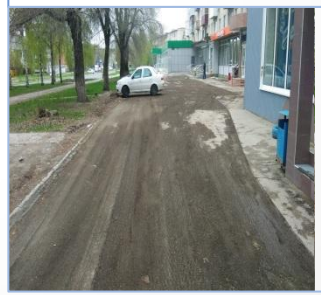

Центральный район

тротуар вдоль ул. Индустриальной.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8, м.п.	
4	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)



Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

3 мкр, внутриквартальный проезд от ул. Толстого вдоль дома №20 по ул. Толстого до магазина "Северный.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	100
5	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

25 %

Фото объекта «До»

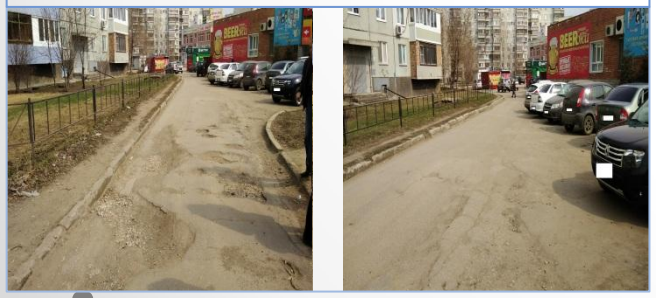

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О. т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»



Центральный район

3 мкр., заезд с ул. Толстого между домами №10 и №12, вдоль домов №№116,118,120 по ул. Кудашева.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	0
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	0
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15, м.п.	100
5	Ремонт колодцев, шт.	0

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Центральный район

кв.150, дублёр по ул. Толстого от д. №19 до Сбербанка.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов, кв.м.	
3	Устройство покрытия тротуаров, кв.м.	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	100
5	Ремонт колодцев, шт.	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

25 %

Фото объекта «До»

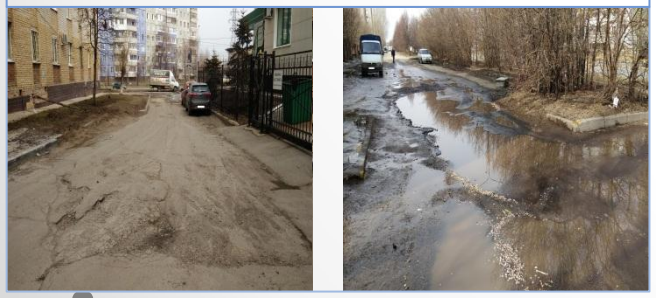

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Гончаров А.В., т. 54-33-42;
- от общественного совета:
Михайлов С.В., т. 22-27-12

Фото объекта «После»

Ремонт внутриквартальных дорог Комсомольский район

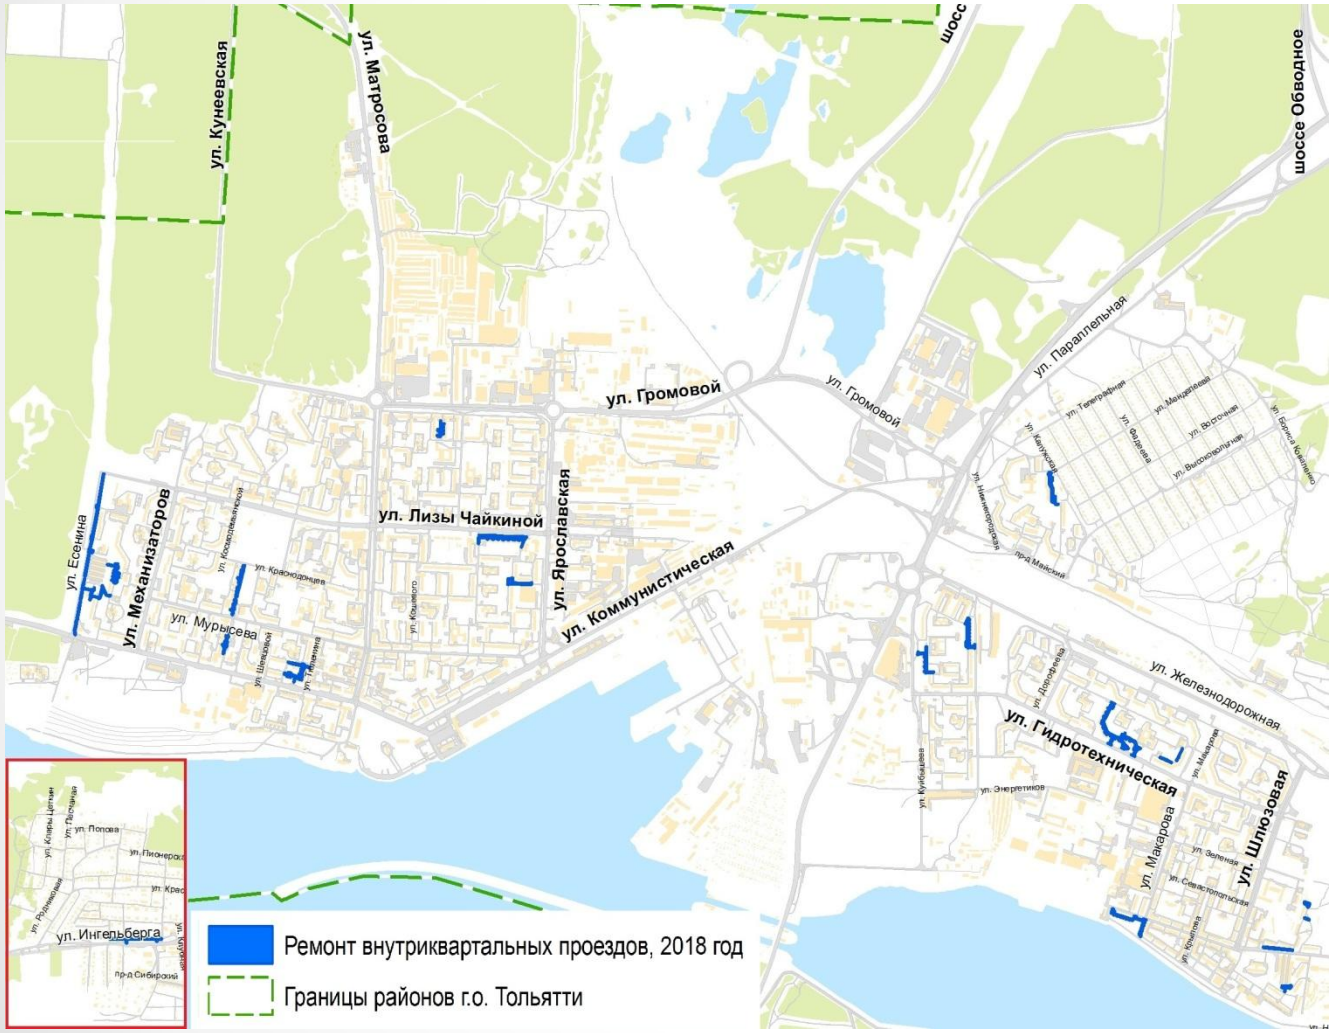

Перечень объектов по ремонту внутриквартальных дорог

№ п/п	Адрес
1	Никонова,19,21, проезд
2	Никонова, 36, проезд
3	Никонова 23а, двор
4	Макарова 1, двор
5	Майский 5-9, двор
6	Куйбышева, 22, двор
7	Ингельберга 1 б, проезд
8	Железнодорожная 11, двор
9	Гидротехническая 33, двор
10	Гидротехническая 27, двор
11	Гидротехническая 23, двор
12	Чайкиной, 68, двор
13	Тюленина,3 Коммунистическая 59, двор
14	Коммунистическая 57, двор
15	Есенина, четная, проезд
16	Есенина,10, двор
17	Есенина, 6, двор
18	Б-р Островского
19	Ярославская 25,21, проезд
20	Громовой 34, двор

Комсомольский район

Ремонт тротуара ул.Никонова,19,21.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия тротуаров	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)



Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О.., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

проезд ул. Никонова, 36.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия проездов	
2	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

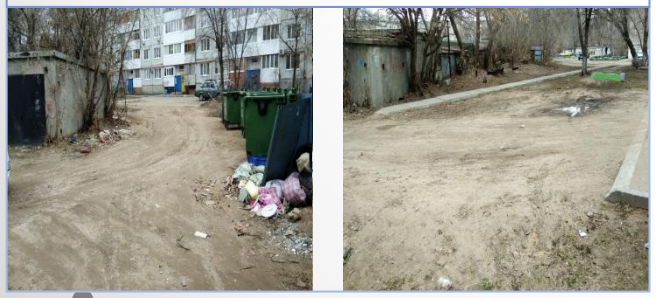

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Никонова 23а, (двор)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия проездов	
2	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Тротуар на ул. Макарова 1.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия тротуаров	
2	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Ремонт Майский проезд 5-9, (двор)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня	
5	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)



Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт ул. Куйбышева, 22, (двор)

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт проезда по ул. Ингельберга 1 б.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия тротуаров	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Ремонт по ул. Железнодорожная 11, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Гидротехническая 33, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Устройство покрытия проездов	
2	Устройство покрытия тротуаров	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

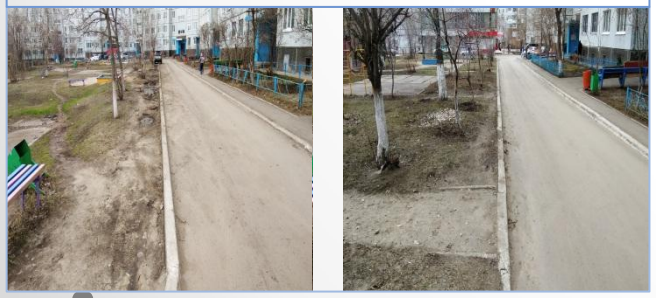

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Гидротехническая 27, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Ремонт по ул. Гидротехническая 23, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

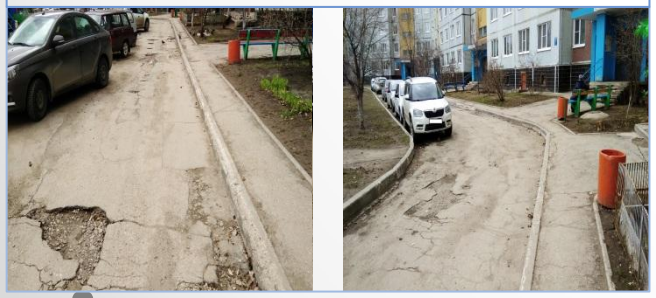

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Чайкиной, 68, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Тюленина,3 Коммунистическая 59, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

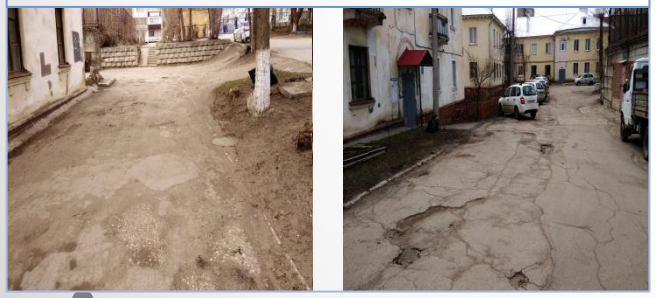

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Коммунистическая 57, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	
6	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Есенина, четная, проезд.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж плит ПБ	100
2	Устройство покрытия проездов	100
3	Устройство покрытия тротуаров	100
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	100
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	100

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

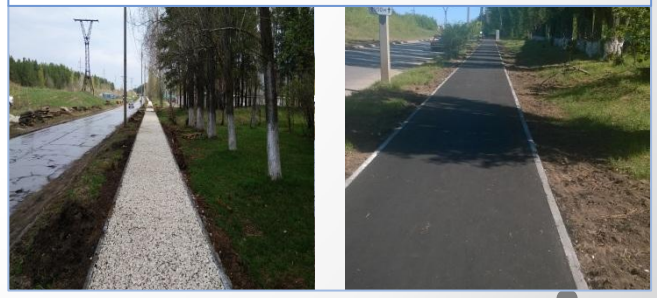

Комсомольский район

Ремонт по ул. Есенина, 10, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

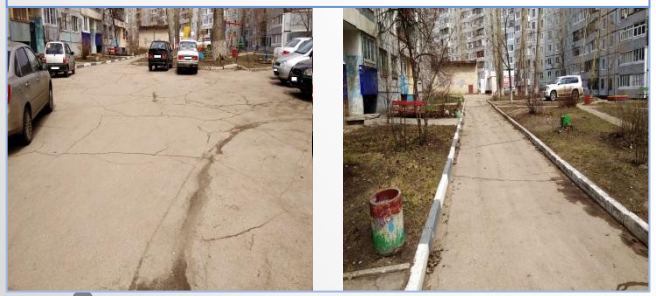

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Есенина, 6, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	100
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт тротуара по бульвару Островского.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Демонтаж плит ПБ	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Устройство покрытия тротуаров	
4	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
5	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт проезда по ул. Ярославская 25,21.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия проездов	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*30*15	
4	Ремонт колодцев	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Комсомольский район

Ремонт по ул. Громовой 34, двор.

Аукцион (07.08.2017 г.)

Контракт от 18.08.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Вид работ	% выполнения
1	Фрезерование	
2	Устройство покрытия тротуаров	
3	Замена бетонного бортового камня БР 100*20*8	

Сдача объекта (30.11.2018 г.)

Фото объекта «До»

Ответственные:
- от подрядной организации:
Бричиков С.В., т. 8-927-775-62-73;
- от ДДХиТ:
Крестьянсков Я.О., т. 54-44-33 (3297);
- от районной администрации:
Анисимов А.Н., т. 54-44-00;
- от общественного совета:
Капралов В.А., т. 8-927-214-95-29

Фото объекта «После»

Отсыпка автомобильных дорог расположенных в зоне застройке индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом.

Перечень объектов по отсыпке асфальтогранулятом.

№ п/п	Адрес	Протяженность км.	Объем работ тыс. м2
1	Автодорога по проезду Водников	0,300	1,200
2	Автодорога по проезду 1-й Сосновый	0,070	0,280
3	Автодорога по переулку Чернышевского (от ул. Первомайская до 2-го Озерного проезда)	0,060	0,240
4	Автодорога по проезду Докторский	0,340	1,360
5	Автодорога по проезду Степной	0,170	0,680
6	Автодорога по ул. Алтайская	0,325	1,300
7	Автодорога по проезду Огородный (продолжение ул. Алтайской до проезда Степной)	0,076	0,380
8	Автодорога по проезду Почтовый (вдоль детского сада "Огонек" ул. Ленина ,95)	0,04	0,240
	Всего:	1,375	5,680

Подпрограмма.
«Повышение безопасности дорожного движения»

Мероприятия подпрограмм на период 2018г.

№ п/п	Мероприятия	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	Проектирование устройств пешеходных дорожек	2	639 237
2	Устройство и перенос остановок общественного транспорта	3	7 812 895
3	Проектно-изыскательные работы по устройству линий наружного освещения в т.ч. Инженерные изыскания	8	6 225 000
4	Устройство линий наружного освещения	1	4 154 018
5	Устройство искусственных дорожных неровностей	4	447 142
6	Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд г.о. Тольятти.	221	397 000
7	Устройство пешеходных дорожек.	1	31 983
	Итого		19 707 275

1. Проектирование устройства пешеходных дорожек

Аукционы

(16.12.2018 г.)

Контракты от 19.04.2018 г 04.04.2018 г, ООО «М-Строй»

№ п/п	Адрес объекта	% выполнения
1	ул. Крупской	5
2	ул. Революционная	13
	Итого объектов:	**2**

СУММА КОНТРАКТОВ - **639 237,65 РУБ.**

2. Устройство и перенос остановок общественного транспорта.

Контракт от 29.09.2017 г., ООО «М-Строй»

№ п/п	Адрес объекта
1	ООТ «Бульвар Здоровья» по ул. 40 лет Победы.
2	ООТ «Ул. 40 лет Победы» по ул. Автостроителей.
3	ООТ «Ул. Мичурина» на Автозаводском шоссе.

СУММА КОНТРАКТА: **7 812 895 РУБ.**
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ ДО **31.12.2018 .Г**

3. Проектно-изыскательные работы по устройству линий наружного освещения в т.ч. инженерные изыскания

Контракт от 05.05.2017 г., ООО «М-Строй»

№ п/п	Адрес объекта
1	*ул. Революционная (на участке от ул. Спортивная до Приморского бульвара)*
2	*ул. Ленина (на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого)*
3	*ул. Офицерская (на участке от ул. Полякова до ул. Ботаническая.*
4	*Южное шоссе (на участке от опоры № 501 до ул. Цеховая и от ул. Цеховая до опоры №490)*
5	*ул. Мичурина (на участке от Автозаводского шоссе до ул. Интернациональная)*
6	*ул. Диагональная (на участке от ул. Баныкина до ул. Кунеевская).*
7	*ул. Новопромышленная (на участке от ул. Комсомольская до ул. Шлютова)*
8	*ул. Радищева (на участке от ул. Победы до ул. Новозаводская)*

СУММА КОНТРАКТА: **6 225 000 РУБ.**
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ ДО **10.05.2018 .Г**

4. Устройство линий наружного освещения.

Контракт от 05.12.2017 г., ООО «Автодоринжиниринг»

№ п/п	Адрес объекта
1	*Фабричный проезд.*

СУММА КОНТРАКТА: **4 154 018 РУБ.**
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ ДО **30.12.2017 Г.**

Устройство линий наружного электроосвещения ООТ «Жигулевская долина» на сумму 116,24 тыс. руб.
Дата размещения открытого аукциона – 03.05.2018 года.

Устройство линии наружного электроосвещения вдоль ул. Новозаводский на сумму 3 298,00 тыс. руб. Идет подготовка аукционной документации.

5. Устройство искусственных дорожных неровностей.

Закупка внесена в план-график ИС "АЦК-Госзаказ", формируется заявка на закупку

№ п/п	Адрес объекта
1	Устройство искусственных дорожных неровностей по ул. Спортивной, в районе дома №99 по проспекту Ст. Разина (Дворец детского творчества)
2	Устройство искусственных дорожных неровностей по бульвару Королева, в районе дома №3 и дома №6 (С/Ш №49)

СУММА КОНТРАКТА: **447 142 РУБ.**

6. Приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд г.о. Тольятти.

Приобретение и установка парковочных столбиков для ограничения и парковки РТЦ "ОКЕАН"

планируется публикация извещения о проведении котировки II квартал 2018 г.

СУММА КОНТРАКТА: **397 000 РУБ.**

6. Устройство пешеходных дорожек.

ООО "СтройФинансКомфорт"
Контракт заключен 03.05.2018 г.

п/п	*Объект*
1	*РТЦ "ОКЕАН"*

СУММА КОНТРАКТА: **31 893 РУБ.**
ДАТА ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 30 ДНЕЙ СО ДНЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА .

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
